**Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Relazione Trimestrale
## ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999
## della procedura di amministrazione straordinaria
## relativa alle società

Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria
Ilvaform S.p.A. in amministrazione straordinaria
Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in amministrazione straordinaria
Taranto Energia S.r.l. in amministrazione straordinaria
Socova S.a.s. in amministrazione straordinaria
Tillet S.a.s. in amministrazione straordinaria
Partecipazioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria

riferita al periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022

# Sommario

PREMESSA ..... 8

ILVA S.P.A IN A.S. ..... 10

Parte I - Attività durante l'amministrazione straordinaria ..... **11**

1. Attività della Procedura ..... **11**
   1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ..... 11
   1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico ..... 11
   1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva ..... 11
   1.4 Costi della procedura ..... 12

2. Aggiornamenti sul Programma ..... **12**
   2.1 Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola - Art. 1 comma 8.5, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, e s.m.i ..... 12
   2.2 Aggiornamento sull'andamento finanziario ..... 12
   2.3 Dismissioni degli *asset non core* ..... 14

Parte II - Attività corrente ..... **14**

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa ..... **14**

2.Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA ..... **15**

3.Dati sulla qualità dell'aria in prossimità dello stabilimento di Taranto ..... **23**

4.Sicurezza sul luogo di lavoro – Infortunistica ..... **25**

5. Aree Escluse di competenza Ilva ..... **29**
   5.1 AREE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CON INTERVENTI IN CORSO ..... 29
   5.2 AREE CON INTERVENTI IN CORSO ..... 38
   5.3 AREE IN MANUTENZIONE E CON PROCEDIMENTO DA DEFINIRE ..... 43
   5.4 AREE CEDIBILI E PRIVE DI PENDENZE ..... 44

6. Gestione del personale ..... **45**
   6.1 Occupazione ..... 45
   6.2 Ammortizzatori Sociali ..... 45
   6.3 Progetti Risorse Umane ..... 45
   6.4 Formazione ..... 45
   6.5 Dettaglio forza lavoro Gruppo Ilva ..... 46

7.Accadimenti legali/giudiziari ..... **47**

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo ..... **56**

1. Premessa ..... **56**

2. Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022 ..... **58**

ILVAFORM S.P.A. IN A.S. ..... 63

1. Attività della Procedura ..... **64**
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ..... 64
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico ..... 64
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva ..... 64
1.4 Costi della procedura ..... 64

2 Aggiornamenti sul Programma ..... **64**

Parte II - Attività corrente ..... **65**

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa ..... **65**

2.Gestione del personale ..... **65**

3.Accadimenti legali/giudiziari ..... **65**

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo ..... **65**

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022 ..... **65**

ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A. IN A.S. ..... 70

1. Attività della Procedura ..... **71**
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ..... 71
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico ..... 71
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva ..... 71
1.4 Costi della procedura ..... 72

2. Aggiornamenti sul Programma ..... **72**

Parte II - Attività corrente ..... **72**

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa ..... **72**

2.Gestione del personale ..... **72**

3.Accadimenti legali/giudiziari ..... **72**

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo ..... **73**

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022 ..... **73**

TARANTO ENERGIA S.R.L. IN A.S. ..... 78

1. Attività della Procedura ..... **79**
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ..... 79
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico ..... 79
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva ..... 79
1.4 Costi della procedura ..... 79

2. Aggiornamenti sul Programma ..... **79**

Parte II - Attività corrente ..... **80**

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa ..... **80**

2.Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA ..... **80**

3.Gestione del personale ..... **80**
3.1 Occupazione ..... 80
3.2 Ammortizzatori Sociali ..... 80
3.3 Progetti Risorse Umane ..... 80

4.Accadimenti legali/giudiziari ..... **81**

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo ..... **81**

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022 ..... **81**

SOCOVA S.A.S. IN A.S. .....86

1. Attività della Procedura ..... **87**
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ..... 87
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico ..... 87
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva ..... 87
1.4 Costi della procedura ..... 87

2.Aggiornamenti sul Programma ..... **87**

Parte II - Attività corrente ..... **88**

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa ..... **88**

2.Gestione del personale ..... **88**

3.Accadimenti legali/giudiziari ..... **88**

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo ..... **88**

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022 ..... **88**

TILLET S.A.S. IN A.S. .....93

1. Attività della Procedura ..... **94**
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ..... 94
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico ..... 94
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva ..... 94
1.4 Costi della procedura ..... 94

2.Aggiornamenti sul Programma ..... **95**

Parte II – Attività corrente ..... **95**

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa ..... **95**

2.Gestione del personale ..... **95**

3.Accadimenti legali/giudiziari ..... **95**

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo ..... **96**

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022 ..... **96**

PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN A.S. .....100

1. Attività della Procedura ..... **101**
1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ..... 101
1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico ..... 101
1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva ..... 101
1.4 Costi della procedura ..... 101

2.Aggiornamenti sul Programma ..... **101**

Parte II - Attività corrente ..... **102**

1.Prosecuzione dell'attività d'impresa ..... **102**

2. Gestione del personale ..... **102**

3. Accadimenti legali/giudiziari ..... **102**

Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo ..... **102**

Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022 ..... **102**

# PREMESSA

In data 21 gennaio 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito, anche "**MISE**"), a seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex D.L. n. 61/2013 (conv. in L. n. 89/2013) dott. Piero Gnudi, ha disposto l'ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (di seguito, la "**Procedura**").

Con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della Procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba.

Con sentenza del 28 gennaio 2015, pubblicata in data 30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, "**Ilva**"), nominando quale giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi, poi sostituita, con decreto del Presidente del Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2019, dalla Dott.ssa Vincenza Agnese.
In data 19 febbraio 2015, il MISE ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza[1], attualmente composto dal Dott. Marco Lipari (Presidente), dal Dott. Ermanno Sgaravato (esperto), dal Prof. Avv. Emiliano Amato (esperto), da Mercitalia Rail S.r.l. (creditore) e da S.A.V. S.r.l. F.lli Santagata (creditore), come da decreto MISE del 6 agosto 2021(Protocollo nr: 238655 - del 10/08/2021).
In data 29 dicembre 2015, i Commissari Straordinari di Ilva, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, hanno presentato al MISE la versione definitiva del programma di Ilva e delle controllate in a.s. redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. 23 dicembre, n. 347 (di seguito, il "**Programma**"). In data 4 gennaio 2016, il MISE, con proprio decreto, ha approvato il Programma.

In data 23 aprile 2019, nelle procedure di Amministrazione Straordinaria delle società Ilva S.p.A., Ilva Servizi Marittimi S.p.A, Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.s., Tillet S.a.s. e Partecipazioni Industriali S.p.a., sono stati nominati, con decorrenza a far data dall'1 giugno 2019, in sostituzione dei dimissionari Avv. Corrado Carrubba, Dott. Piero Gnudi, Prof. Enrico Laghi, i seguenti Commissari[2]:

- dott. Francesco Ardito,
- avv. Antonio Lupo
- dott. Antonio Cattaneo

In data 21 giugno 2019, con decreto ministeriale, vista la lettera del 23 maggio 2019, con la quale il dott. Antonio Cattaneo dichiarava di non poter assumere le funzioni di commissario straordinario, è stato nominato il Prof. Alessandro Danovi quale membro del collegio commissariale.

---

[1] Originariamente composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), dall'avv. M. Cesare (esperto), da ENI S.p.A. (creditore) e da Intesa San Paolo S.p.A. (creditore). Rispettivamente in data 1° luglio e 26 luglio 2019, la composizione del Comitato di Sorveglianza ha riportato le seguenti modifiche: nomina di Mercitalia Rail S.r.l. e S.A.V. S.r.l. F.lli Santagata in qualità di creditori in sostituzione di Eni S.p.a. ed Intesa SanPaolo S.p.a. e nomina del Dott. P. G. Demarchi Albengo a Presidente del Comitato di Sorveglianza in sostituzione del dimissionario Prof. Avv. M. Confortini. In data 30 novembre 2020, è stato nominato quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza il Dott. M. Maceroni, in sostituzione del dimissionario Avv. M. Cesare.

[2] I sopracitati Commissari entranti, ai sensi dell'art 1. Comma 2, con effetto immediato, sono stati richiesti di cooperare con il precedente collegio Commissariale nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle predette società.

Nella presente relazione sono riportati, ove possibile, soltanto gli aggiornamenti relativi al periodo di riferimento, mentre per quanto qui non riportato si richiama il contenuto delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 sino al dicembre 2021.

Si ricorda inoltre che:

- ai sensi dell'art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 "*il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'Industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del Programma*";
- il Programma di cui sopra è unitario per tutte le società del gruppo ILVA;
- a far data dal 1° novembre 2018, a seguito della sottoscrizione in data 28 giugno 2017 del contratto di affitto di ramo d'azienda con AM InvestCo Italy S.p.A (oggi Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), la gestione delle attività di Ilva e di alcune delle sue controllate in A.S. è passata in capo all'affittuaria.

Per quanto sopra, a partire dalla presente relazione, viene modificato il layout di presentazione del documento, immutati i contenuti. Vengono forniti gli aggiornamenti sul Programma e sulle residue attività, come richiesto dal Comitato di Sorveglianza, in separate sezioni, ognuna delle quali intestata a ciascuna società del Gruppo Ilva.

Vengono inoltre forniti i dati economico-finanziari relativi a ciascuna società in A.S.

Sul sito internet - www.gruppoilvainas.it - vengono pubblicate tutte le informazioni inerenti la Procedura.

Milano, 11 luglio 2022

I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da
**FRANCESCO ARDITO**
CN = FRANCESCO ARDITO
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

Dott. Francesco Ardito

Firmato digitalmente da
**ANTONIO LUPO**
CN = ANTONIO LUPO
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

Avv. Antonio Lupo

Firmato digitalmente da
**ALESSANDRO DANOVI**
CN = ALESSANDRO DANOVI
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

Prof. Alessandro Danovi

## Ilva S.p.A in A.S.

# Parte I - Attività durante l'amministrazione straordinaria

## 1. Attività della Procedura

### 1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

Con riferimento agli avvenimenti relativi alla società francese S.L.D. S.A. e alla società greca Hellenic Steel Company S.A. in liquidazione ("**HSC**") parimenti a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

### 1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° gennaio 2022 – 30 marzo 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza delle società in A.S. volta a volta interessate, le seguenti questioni:

- Gruppo Ilva: 20 gennaio 2022:
    1. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 giugno 2021 e relativi allegati;
    2. Schemi Mise Ilva in AS al 30 giugno 2021;
    3. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 settembre 2021 e relativi allegati;
    4. Schemi Mise Ilva in As al 30 settembre 2021;
    5. Conferimento incarico: valutazione beni aziendali;
    6. Non di competenza;
    7. Istanza per conferimento 3 mandati.

### 1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 31 dicembre 2021, che si intendono qui integralmente richiamate.

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per Ilva sono pendenti:
- n. 66 giudizi di opposizione,
- n. 65 giudizi per Cassazione;
- un giudizio di rinvio avanti al Tribunale di Milano.

## 1.4 Costi della procedura

In ottemperanza alla circolare MISE del 22 gennaio 2016, Ilva ha predisposto all'interno del sito *internet* una sezione, denominata "*Trasparenza*", per il recepimento degli obblighi informativi di cui alla circolare sopra menzionata.

Nel rispetto delle disposizioni, si allega il prospetto dei costi della procedura al 31 marzo 2022 (**ALL. 1**) e il prospetto degli incarichi professionali e di consulenza come da circolare MISE sopra richiamata (**ALL. 2**).

# 2. Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali al 30 giugno 2021.

## 2.1 Piano relativo ad interventi volti a garantire sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola - Art. 1 comma 8.5, D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, e s.m.i

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

## 2.2 Aggiornamento sull'andamento finanziario

**(OMISSIS)**

**(OMISSIS)**

## 2.3 Dismissioni degli *asset non core*

Con riferimento alla cessione del complesso immobiliare di proprietà di Ilva sito in Varzi non vi sono aggiornamenti da segnalare; si rinvia a quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

Con riferimento al complesso immobiliare di proprietà di Ilva sito in Torino, Strada della Cebrosa n. 87, il MISE, previo parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza, con decreto del 7 gennaio 2022 ha autorizzato i Commissari Straordinari ad accettare l'unica offerta di acquisto del complesso immobiliare ricevuta. Il complesso immobiliare di Torino è stato dunque venduto all'offerente con contratto di compravendita sottoscritto in data 26 gennaio 2022.

# Parte II - Attività corrente

## 1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Al 31 marzo 2022, i ricavi delle vendite e prestazioni, pari 38,0 mln/€, sono relativi principalmente al canone di affitto (€ 37,7 mln/€).

Il credito complessivo netto nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. ammonta a 768,2 mln/€ di cui 573,3 mln/€ relativi alla vendita dei magazzini materie prime e prodotti finiti, il cui incasso è previsto al termine del contratto di affitto oltre al canone di affitto per 187,0 mln/€, 6,4 mln/€ per riaddebito 50% costi AFO2, 1,1 mln/€ per interessi di mora e altri crediti per 0,4 mln/€.

L'ammontare complessivo delle ore di sospensione nel trimestre di riferimento è stato di 889.840 corrispondenti al 84,4% delle ore lavorabili per un numero medio pari a 1704 unità.

Al 31 marzo 2022 per effetto delle conciliazioni per incentivi all'esodo sono usciti dal Gruppo Ilva nr. 1.306 lavoratori, con un incremento nel I trimestre 2022 di 2 unità.

Nel periodo si è dato corso ai richiami di quota parte di lavoratori di ILVA Taranto in CIGS per essere adibiti alle attività di bonifica, così come rappresentato alle Organizzazioni Sindacali di riferimento nei diversi incontri tenuti.

Nel periodo sono continuate le attività di bonifica e decontaminazione.

Si ricorda che nel 2017 è stato emesso un prestito obbligazionario sottoscritto dal Fondo Unico di Giustizia finalizzato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. I valori rinvenienti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario sono stati versati in un Patrimonio Destinato e gestiti con contabilità sparata secondo la previsione degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile. Il Patrimonio Destinato a fine marzo 2022 ammonta a 818,3 mln/€. Si rimanda al paragrafo sull'andamento finanziario per maggiori dettagli di movimentazione.

## 2.Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

Di seguito sintesi degli interventi e/o misure nella Tabella A e un dettaglio degli stessi nella Tabella B.

PRINCIPALI AZIONI E MISURE IMPLEMENTATE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI AIA - PROGETTI CONTENUTI NEL RAPPORTO COMMISSARI
Tabella A - Aggiornamento al 31 MARZO 2022

| INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AREA INTERVENTO | Speso al 31 Ott 2018 (€/000) | Speso dal 1° Nov 2018 al 31 Marzo 2022 (€/000) | Speso Totale al 31/03/2022 (€/000) | Speso Totale al 31/03/2022 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000) |
| AREA IMPIANTI MARITTIMI PER GESTIONE MATERIE PRIME | € - | € - | € - | € - |
| AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME | € 69.656 | € 201.831 | € 271.487 | € 231.761 |
| AREA NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI | € 76.386 | € 54.015 | € 130.401 | € 130.401 |
| AREA COKERIA | € 64.943 | € 117.582 | € 182.525 | € 181.206 |
| AREA GESTIONE ROTTAMI FERROSI e ACCIAIERIA | € 26.102 | € 5.365 | € 31.467 | € 12.169 |
| AREA ALTOFORNO | € 10 | € 2.811 | € 2.822 | € - |
| AREA AGGLOMERATO | € 7.375 | € 43.014 | € 50.390 | € - |
| PIANO ACQUE METEORICHE | € 6.271 | € 36.822 | € 43.092 | € 27.392 |
| PIANO ACQUE DI PROCESSO | € 96 | € 12.062 | € 12.159 | € 11.741 |
| ADDENDUM ARTICOLO 3 .7 | € - | € 224 | € 224 | € - |
| ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE | € 41.800 | € 11.874 | € 53.674 | € 57 |
| DE-NOX TARANTO ENERGIA | € - | € 30.421 | **€ 30.421** | **€ 30.421** |
| **PA - TOTALE PIANO AMBIENTALE** | € 292.640 | € 516.021 | **€ 808.661** | **€ 625.147** |
| **PR - TOTALE PIANO RIFIUTI** | € 21.432 | € 65.536 | **€ 86.968** | **€ 28.151** |
| TOTALE IMPORTO PAGATO (PA+PR) | **€ 314.072** | **€ 581.558** | **€ 895.629** | **€ 653.298** |

PA - Piano Ambientale
PR - Piano Rifiuti

PRINCIPALI AZIONI E MISURE IMPLEMENTATE IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI AIA - PROGETTI CONTENUTI NEL RAPPORTO COMMISSARI

Tabella B - Aggiornamento al 31 MARZO 2022

| INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL) | | Stato attuazione | | DATI DA RAPPORTO COMMISSARI AL 31/03/2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA INTERVENTO | Elenco prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547 - PIANO AMBIENTALE | Attuata | In corso | PPM CODE | Descrizione progetto | Speso al 31 Ott 2018 (€/000) | Speso dal 1° Nov 2018 al 31 Marzo 2022 (€/000) | Speso Totale al 31/03/2022 (€/000) | Speso Totale al 31/03/2022 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000) |
| | **AREA IMA GESTIONE MATERIE PRIME** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME | Pr. q/bis - Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119828 | 119828-30 P12A A/968 RAW MATERALS YARDS SOIL AND GROUNDWATER DECONTIMINATION AIA - TARANTO | 601 | 4.280 | 4.881 | 4.881 |
| | Pr. 1 - Completa copertura Parco Minerale<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2019* | X<br>(31.12.2019) | | 119826 | 119826-28 P12 A/696 IRON ORES YARD COVERING AIA - TARANTO | 31.974 | 67.819 | 99.793 | 99.793 |
| | Pr. 1 - Completa copertura Parco Fossile<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119825 | 119825-27 P11 A/697 COAL YARD COVERING (STACKERS TRANSFERRED IN 125702) AIA - TARANTO | 20.395 | 82.861 | 103.255 | 103.255 |
| | Pr. 1 - Completa copertura Parco Fossile<br>*In corso* | | X | 125702 | 125702-290 NSD-525 STACKER RECLAIMERS FOR COAL YARD AIA - TARANTO | 0 | 15.965 | 15.965 | |
| | Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: CALCARE (Conv. 1) e (Nastro 5-3 e 6-2)<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119823 | 119823-24 P10 A/416 - LIMESTONE YARD COVERING AIA - TARANTO | 11.758 | 797 | 12.555 | 12.555 |
| | Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: OMO<br>*In corso* | | X | 120108 | 120108-23 P10 A/987 ORE BLENDING YARD COVERING AIA - TARANTO | 3.478 | 14.577 | 18.054 | |
| | Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: AGL/Sud<br>*Prescrizione AIA attuata* | X<br>(28.02.2021) | | 123509 | 123509-284 P10 A/60 SOUTH SINTERING YARD COVERING AIA - TARANTO | 1.107 | 4.142 | 5.250 | 5.250 |
| | Pr. 4 - Completa copertura Parchi Minori: AGL/Nord<br>*In corso* | | *X* | 123510 | 123510-285 P10 A/1000 NORTH SINTERING YARD COVERING AIA - TARANTO Prevously integrated with A/60 | 0 | 1.269 | 1.269 | |
| | Pr. 4 - Pavimentazione Parco LOPPA<br>*Prescrizione AIA attuata (6 di 8 parchi)* | X<br>(30.09.2019) | | 119824 | 119824-25 P10 A/417 BF SLAG YARD PAVING AIA - TARANTO | 344 | 4.755 | 5.099 | 5.099 |
| | Pr. 4 - Pavimentazione Parco LOPPA<br>*Prescrizione AIA attuata (6 di 8 parchi)* | X<br>(30.09.2019) | | 134374 | 134374-336 P10 A/1001 BF SLAG PAVEMENT ORDERS (NOT Patrimonio destinato) - AIA TARANTO | 0 | 928 | 928 | 928 |
| | Pr. 4 - Installazione barriere frangivento in area Parco LOPPA<br>*In corso* | | X | 120109 | 120109-26 P10 A/417 BF SLAG YARD WIND FENCES AIA - TARANTO | 0 | 4.438 | 4.438 | |
| | **AREA PARCHI STOCCAGGIO MATERIE PRIME** | | | | | **€ 69.656** | **€ 201.831** | **€ 271.487** | **€ 231.761** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI** | Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119815 | 119815-14 P09 A/379 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - LIME KILNS AIA - TARANTO | 13.665 | 3.414 | 17.079 | 17.079 |
| | Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119816 | 119816-15 P09 A/403 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE NUMBER 2 AIA - TARANTO | 704 | 333 | 1.037 | 1.037 |
| | Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119817 | 119817-16 P09 A/404 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - SINTERING AIA - TARANTO | 10.036 | 2.623 | 12.659 | 12.659 |
| | Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119818 | 119818-17 P09 A/406 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE NUMBER 4 AIA - TARANTO | 1.839 | 6.749 | 8.588 | 8.588 |
| | Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119819 | 119819-18 P09 A/410 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - RAW MATERIALS YARDS FEEDING AIA - TARANTO | 24.659 | 27.125 | 51.784 | 51.784 |
| | Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119820 | 119820-19 P09 A/411 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - BLAST FURNACE HARBOUR PEERS AIA - TARANTO | 3.542 | 3.562 | 7.104 | 7.104 |
| | Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119821 | 119821-20 P09 A/413 A/487 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - COKE OVENS / BYPRODUCTS AIA - TARANTO | 15.851 | 4.663 | 20.514 | 20.514 |
| | Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportastori e cadute<br>*Prescrizione AIA attuata* | X | | 119822 | 119822-21 P09 A/641 CONVEYOR BELTS ENCLOSURES - STEEL SCRAP YARD AIA - TARANTO | 68 | 0 | 68 | 68 |
| | Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Cokeria<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119841 | 119841-46 P36 A/154 SEALING AND DEDUSTING OF COKE OVEN BUILDINGS AIA - TARANTO | 2.986 | 324 | 3.310 | 3.310 |
| | Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Sili CEC<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119874 | 119874-48 P36 A/984 SILI CEC AIA - TARANTO | 1.491 | 1.649 | 3.140 | 3.140 |
| | Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Stock House 4<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119875 | 119875-49 P36A A/448 SEALING AND DEDUSTING OF STOCK HOUSE AFO /BF 4 AIA - TARANTO | 1.051 | 2.397 | 3.448 | 3.448 |
| | Pr. 16.i -Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - OMO/2<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119873 | 119873-47 P36 A/454 SEALING AND DEDUSTING OF SINTERING BUILDINGS AIA - TARANTO | 407 | 518 | 925 | 925 |
| | Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - PCI<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119876 | 119876-50 P36A A/459 SEALING AND DEDUSTING OF PCI BUILDING AIA - TARANTO | 88 | 657 | 745 | 745 |
| **AREA NASTRI - TORRI DI COLLEGAMENTO ed EDIFICI** | | | | | | **€ 76.386** | **€ 54.015** | **€ 130.401** | **€ 130.401** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AREA COKERIA BATTERIE 5-6** | Pr. 16.e - Dismissione Batterie n 3-4 oppure 5-6<br>*In corso* | | X | 131652 | 131652-323 NSD-553 COKE OVEN BATTERIES 5_6 DEMOLITION - AIA TARANTO | 0 | 1.153 | 1.153 | |
| **AREA COKERIA BATTERIE 7-8** | Pr. 16.m - Batteria 7-8 Sistema di regolazione della pressione ai forni<br>*Prescrizione AIA attuata* | X (31/05/21) | | 119728 | 119728-7 P07 A/96 BATTERIES 7-8 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO | 4.666 | 5.975 | 10.641 | 10.641 |
| | Pr. 37 - Batteria 7-8 Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento<br>*Prescrizione AIA attuata* | X (31/05/21) | | 119838 | 119838-43 P34 A/973 BATTERIES 7-8 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO | 787 | 6.218 | 7.004 | 7.004 |
| | Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo filtro camino n.4<br>*Prescrizione AIA attuata* | X (31/05/21) | | 119730 | 119730-9 P07 A/762 COKE OVEN 7/8 -FILTER T STACK N. 4 AIA - TARANTO | 8.003 | 1.434 | 9.437 | 9.437 |
| | Pr. 49 - Batteria 7-8 Installazione nuova doccia n.4-bis<br>*Prescrizione AIA attuata* | X (31/05/21) | | 119729 | 119729-8 P07 A/97 COKE OVEN 7/8 - QUENCHING TOWER N. 4 BIS AIA - TARANTO | 1.287 | 7.704 | 8.991 | 8.991 |
| **AREA COKERIA BATTERIE 9-10** | Pr. 16.f - Batteria 9-10 rifacimento refrattari<br>*Prescrizione AIA attuata per batteria 9* | X (31/01/21) | | 119731 | 119731-10 P08 A/81 BATTERIES 9 AND 10 REFRACTORIES WORKS AIA - TARANTO | 19.994 | 25.111 | 45.105 | 45.105 |
| | Pr. 16.f - Batteria 9-10 - Sistema di regolazione della pressione ai forni<br>*Prescrizione AIA attuata per batteria 9* | X (31/01/21) | | 119812 | 119812-11 P08 A/82 BATTERIES 9 AND 10 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO | 2.836 | 9.654 | 12.490 | 12.490 |
| | Pr.37 - Batteria 9-10 Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento<br>*Prescrizione AIA attuata per batteria 9* | X (31/01/21) | | 119839 | 119839-44 P34 A/974 BATTERIES 9-10 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO | 2.414 | 20.713 | 23.127 | 23.127 |
| | Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro camino n.5<br>*Prescrizione AIA attuata* | X (31/01/21) | | 119814 | 119814-13 P08 A/763 BATTERIES 9 AND 10 FILTER T STACK N. 5 AIA - TARANTO | 7.295 | 3.892 | 11.186 | 11.186 |
| | Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5<br>*Prescrizione AIA attuata* | X (31/01/21) | | 119813 | 119813-12 P08 A/85 BATTERIES 9 AND 10 QUENCHING TOWER N. 5 AIA - TARANTO | 4.697 | 6.013 | 10.710 | 10.710 |
| **BATTERIA 11** | Pr. 16.l - Batteria 11 Sistema di regolazione della pressione ai forni<br>*In corso* | | X | 119724 | 119724-3 P06 A/94 BATTERIES 11 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO | 0 | 100 | 100 | |
| | Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari<br>*In corso* | | X | 120105 | 120105-2 P06 A/91 BATTERIES 11 REFRACTORY WORKS AIA - TARANTO | 0 | 66 | 66 | |
| **AREA COKERIA BATTERIA 11/12** | Pr. 37 - Batteria 11/12- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento<br>*Completata* | X (31/12/21) | | 119840 | 119840-45 P34 A/975 BATTERIES 11-12 COKE SIDE DUST CAPTURE AIA - TARANTO | 1.598 | 10.992 | 12.590 | 12.590 |
| | Pr. 49 - Batteria 11/12 Installazione nuova doccia n.6<br>*Completata* | X (31/12/21) | | 119725 | 119725-4 P06 A/95 COKE OVEN 11/12 - QUENCHING TOWER N. 6 AIA - TARANTO | 4.654 | 4.293 | 8.947 | 8.947 |
| **AREA COKERIA BATTERIA 12** | Pr. 16.o - Batteria 12 Sistema regolazione della pressione ai forni<br>*Completata* | X (31/12/21) | | 119726 | 119726-5 P06 A/101 BATTERIES 12 INDIVIDUAL PRESSURE CONTROL SYSTEM AIA - TARANTO | 2.065 | 2.444 | 4.509 | 4.509 |
| | Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro camino n.7<br>*Completata* | X (31/12/21) | | 119727 | 119727-6 P06 A/158 COKE OVEN 11/12 - FILTER T STACK N. 7 AIA - TARANTO | 4.604 | 1.320 | 5.924 | 5.924 |
| | Pr. 45 - Impianto desolforazione gas | X | | 120138 | 120138-68 P94 A/840 COKE OVEN GAS DESULPHURIZATION PHASE I AIA - TARANTO | 44 | 10.500 | 10.544 | 10.544 |
| | Prescrizione AIA attuata | | | 130149 | 130149-308 NSD-539 COKE OVEN GAS DESULPHURIZATION PHASE II AIA - TARANTO - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **AREA COKERIA** | | | | | **€ 64.943** | **€ 117.582** | **€ 182.525** | **€ 181.206** |
| **AREA GRF e ACC1-2** | Pr. 16h/70c - area GRF: Installazione cappe mobili lato TNA (I°fase) e lato AFO (II° fase)<br>*Completata installazione cappe mobili lato TNA al 31/12/2018. In corso altri interventi.* | X | | 119829 | 119829-33 P26 A/209 MOBILE HOODS METAL SCRAP AREA SMP AIA - TARANTO | 9.521 | 2.648 | 12.169 | 12.169 |
| | Pr. 16h/70c - area GRF: realizzazione Barriera frangivento<br>*In corso* | | X | 120126 | 120126-34 P26 A/988 WIND FENCES METAL SCRAP AREA SMP AIA - TARANTO | 0 | 1.332 | 1.332 | |
| | 70.a - Realizzazione nuovo impianto DES Acciaieria 1<br>*In corso* | | X | 119957 | 119957-31 P20 A/191 STEEL N°1 DESULPHURIZATION AIA - TARANTO | 9.358 | 417 | 9.775 | |
| | 70.a - Realizzazione nuovo impianto DES Acciaieria 2<br>*In corso* | | X | 119958 | 119958-32 P21 A/192 STEEL N°2 DESULPHURIZATION AIA - TARANTO | 7.223 | 968 | 8.191 | |
| | **AREA GESTIONE ROTTAMI FERROSI e ACCIAIERIA** | | | | | **€ 26.102** | **€ 5.365** | **€ 31.467** | **€ 12.169** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AREA ALTOFORNO** | Pr.18 - Demolizione impianto Altoforno 3<br>*In corso* | | X | 120127 | 120127-51 P38B A/655 BLAST FURNACE n°3 - DEMOLITION AND WASTE DISPOSAL PHASE I AIA - TARANTO | 10 | 890 | 900 | 0 |
| | | | | 123301 | 123301-283 P38B A/655 BLAST FURNACE n°3 - DEMOLITION AND WASTE DISPOSAL PHASE II AIA - TARANTO | 0 | 1.921 | 1.921 | |
| **AREA ALTOFORNO** | | | | | | **€ 10** | **€ 2.811** | **€ 2.822** | **€ -** |
| **AREA AGGLOMERATO** | Pr. 55-57 area AGL: Installazione filtri<br>*In corso* | | X | 120104 | 120104-1 P03 A/175 MEROS FILTER (SINTER PLANT) AIA - TARANTO | 7.375 | 43.014 | 50.390 | |
| **AREA AGGLOMERATO** | | | | | | **€ 7.375** | **€ 43.014** | **€ 50.390** | **€ -** |
| **PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture** | Pr. UA7 - Raccolta acque delle coperture Parchi Maggiori (2^ pioggia)<br>*Completata* | X | | 119827 | 119827-29 P12 A/993 IRON/COAL YARD COVERAGES: 2^ RAIN MANAGEMENT AIA - TARANTO | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture** | Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Maggiori (Minerale e Fossile) e parchi minori (Agl sud, Loppa)<br>*Completata* | X | | 120434 | 120434-63 AM9 + AM6 PHASE I (P50E2 A/661- P50C1 A/662 - P50B3 A/699 - P50B2 A981 - P50B1 A/980 AM9 RAIN WATER COLLECTING AND TREATMENT BF/1 , B/F SLAG YARD, SINTER SOUTH AND ORE/COAL COVERAGES) AIA - TARANTO | 134 | 6.820 | 6.954 | 6.954 |
| | Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (AGL/S - Loppa)<br>*Completata* | X | | | | | | | |
| **PIANO ACQUE METEORICHE Stabilimento (aree_a_caldo)** | Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1-2 e Z.L.<br>*Fase II* | | x | 122964 | 122964-281 AM9 + AM6 PHASE II RAIN WATER TREATMENT AIA - TARANTO | 0 | 0 | 0 | |
| | Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC1e Z.L.<br>*Fase II* | | x | | | | | | |
| **PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture** | Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (AGL/N - OMO)<br>*Attività subordinata alla realizzazione delle coperture* | | x | 120135 | 120135-64 P50E3 A/665 P50B2 A/698 AM10 RAIN WATER COLLECTING AND TREATMENT BF/4 AND BF/5 (INCLUDES RAIN WATER TREATMENT ORE BLENDING & NORTH SINTER COVERAGES) AIA - TARANTO | 76 | 64 | 141 | |
| **PIANO ACQUE METEORICHE Stabilimento (aree_a_caldo)** | Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4-5 e Z.L.<br>*In corso* | | x | | | | | | |
| **PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture** | Pr. UA7 - Raccolta acque coperture in area Parchi Minori (CALCARE)<br>*In corso* | | X | 134376 | 134376-338 P50B1 A/695 Limestone Coverage rain water collecting - AIA TARANTO | 287 | 163 | 449 | |
| **PIANO ACQUE METEORCHE Area_Coperture** | Pr. UA7 - Trattamento acque delle coperture in area Parchi Minori (Calcare)<br>*Attività subordinata alla realizzazione delle coperture* | | X | 120129 | 120129-53 P50A A/684 AM4 RAIN WATER COLLECTING AND TREATMENT SEA-IRF-PCA (UA10) AIA - TARANTO | 2.347 | 6.878 | 9.225 | |
| **PIANO ACQUE METEORICHE Area_IRF_SEA_PCA** | Pr. UA10 - Gestione acque meteoriche in area IRF-SEA -PCA<br>*In corso* | | X | | | | | | |
| | Pr. UA10 - Gestione e rimozione di cumuli non trattati di sorie di acciaieria nell'area IRF<br>*Completata* | X | | 120130 | 120130-54 P50A A/983 IRON REMOVAL PLANT FOR POWDER STOCKPILE AIA - TARANTO | 0 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
| | *Pr. UA10 - Gestione e rimozione di cumuli non trattati di sorie di acciaieria nell'area IRF*<br>*Completata* | X | | 131654 | 131654-324 NSD-554 SCRAP RECOVERY FROM IRF SS SLAG STOCKPILE - AIA TARANTO | 0 | 1.993 | 1.993 | 1.993 |
| **PIANO ACQUE METEORCHE Area_IMA** | Pr. UA8-24/25/26 - Gestione acque meteoriche II° sporgente<br>*Aree dissequestrate. In corso* | | X | 119878 | 119878-58 P50D1 A/667 AM1 2° PIER RAINWATER MANAGEMENT AIA - TARANTO | 675 | 2.286 | 2.961 | |
| | Pr. UA8-24/25/26 - Gestione acque meteoriche III° sporgente<br>*Aree dissequestrate. In corso* | | X | 119879 | 119879-59 P50D2 A/668 AM2 3° PIER RAINWATER MANAGERMENT AIA - TARANTO | 1.110 | 38 | 1.148 | |
| | Pr. UA8-24/25/26 - Gestione acque meteoriche V° sporgente<br>*Aree dissequestrate. In corso* | | X | 119880 | 119880-60 P50 D3 A/671 AM3 5° PIER AND COIL YARD RAINWATER MANAGENT AIA - TARANTO | 1.237 | 30 | 1.267 | |
| **PIANO ACQUE METEORICHE Stabilimento (aree_a_caldo)** | Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L.<br>*In corso* | | X | 120128 | 120128-52 P50A A/683 AM5 RAINWATER COLLECTING AND TREATMENT GRF-FOC1 (UA9) AIA - TARANTO | 163 | 0 | 163 | |
| | Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2 e Z.L.<br>*In corso* | | X | 120132 | 120132-56 P50C2 A/663 AM8 RAIN WATER COLLECTING AND TREATEMENT STEELMAKING n°2 / LIME KILNS n°2 AIA - TARANTO | 114 | 49 | 163 | |
| | Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.<br>*In corso* | | X | 120133 | 120133-62 P50E1 A/660 AM11 RAIN WATER TREATMENT COKE OVEN AIA - TARANTO | 129 | 55 | 184 | |
| **PIANO ACQUE METEORICHE** | | | | | | **€ 6.271** | **€ 36.822** | **€ 43.092** | **€ 27.392** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PIANO ACQUE DI PROCESSO Area_COK_AFO_LAF** | Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area COK<br>*Attività completata* | X (31/12/20) | | 120137 | 120137-66 P50F A/670 INDUSTRIAL WATER TREATMENT COKE OVEN AIA - TARANTO | 24 | 4.629 | 4.653 | 4.653 |
| | Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area COK (SELENIO)<br>*In corso* | | X | 139329 | 139329-339 NSD-562 Selenium removal plant for Coke Oven WWT AIA - TARANTO | 0 | 417 | 417 | |
| | Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area AFO<br>*Attività completata* | X (31/12/20) | | 120136 | 120136-65 P50E4 A/701 INDUSTRIAL WATER TREATMENT BLAST FURNACES PHASE I AIA - TARANTO | 0 | 6.344 | 6.344 | 6.344 |
| | Pr. UA11 - Trattamento acque di processo area LAF<br>*Attività completata* | X (31/12/20) | | 131972 | 131972-324 NSD-554 Cold Rolling Waste Water treatment plant - AIA TARANTO | 0 | 509 | 509 | 509 |
| | Pr. UA11 - Adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi<br>*Attività completata* | X | | 119883 | 119883-69 P95 A/979 AUTOMATIC WATER DRAIN MONITORING SYSTEM AIA - TARANTO | 73 | 163 | 235 | 235 |
| | **PIANO ACQUE DI PROCESSO** | | | | | **€ 96** | **€ 12.062** | **€ 12.159** | **€ 11.741** |
| **ADDENDUM - ARTICOLO 3.7** | Addendum - Art 3.7<br>*In corso* | | X | 150243 | 150243 - 513 - Misure di prevenzione: Gestione e recupero prodotto in fase libera area TUL2 - AIA TARANTO | 0 | 118 | 118 | |
| **ADDENDUM - ARTICOLO 3.7** | Addendum - Art 3.7<br>*In corso* | | X | 150244 | 150244 - 514 - Misure di prevenzione: Gestione e recupero prodotto in fase libera area CCO5 - AIA TARANTO | 0 | 48 | 48 | |
| **ADDENDUM - ARTICOLO 3.7** | Addendum - Art 3.7<br>*In corso* | | X | 150245 | 150245 - 515 - Misure di prevenzione: Vani interrati TUL2 - AIA TARANTO | 0 | 29 | 29 | |
| **ADDENDUM - ARTICOLO 3.7** | Addendum - Art 3.7<br>*In corso* | | X | 150246 | 150246 - 516 - Misure di prevenzione: vani interrati ex BRA2 - AIA TARANTO | 0 | 7 | 7 | |
| **ADDENDUM - ARTICOLO 3.7** | Addendum - Art 3.7<br>*In corso* | | X | 150242 | 150242 - 512 - Misure di prevenzione: Acque di falda superficiale e profonda - AIA TARANTO | 0 | 21 | 21 | |
| | **ADDENDUM - ARTICOLO 3.7** | | | | | **€ -** | **€ 224** | **€ 224** | **€ -** |
| **ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE** | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 134375 | 134375-337 P32 S/2031, S/2032, S/2033, A/876, A/877, A/878 ASBESTOS GENERAL - AIA TARANTO | 4.607 | 677 | 5.284 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119895 | 119895-99 P32A2 Asbestos (Coke oven plant area) AIA TARANTO | 0 | 0 | 0 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119896 | 119896-100 P32B4 Asbestos (Steel shop electical maintenance) AIA TARANTO | 0 | 18 | 18 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119897 | 119897-101 P32C1 Asbestos (HSM/1) AIA TARANTO | 0 | 0 | 0 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119898 | 119898-102 P32C2 Asbestos (Plate mill) AIA TARANTO | 0 | 138 | 138 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119899 | 119899-103 P32C3 Asbestos (Cold rolling mill) AIA TARANTO | 0 | 0 | 0 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119900 | 119900-104 P32C4 Asbestos (HSM/2) AIA TARANTO | 0 | 0 | 0 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119901 | 119901-105 P32C5 Asbestos (STRIP FINISHING MILL) AIA TARANTO | 0 | 0 | 0 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119902 | 119902-106 P32G1 Asbestos (LOGISTICS/WAREHOUSE) AIA TARANTO | 0 | 0 | 0 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119933 | 119933-107 P32H Asbestos (TECHNICAL GAS PRODUCTION) AIA TARANTO | 15 | 26 | 40 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119934 | 119934-108 P32I Asbestos (ENERGY FACILITIES) AIA TARANTO | 0 | 241 | 241 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119935 | 119935-109 P32N Asbestos (MAIN ELECTRICAL WORKSHOP) AIA TARANTO | 0 | 309 | 309 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 119936 | 119936-110 P32W Asbestos (GENERAL SERVICES) AIA TARANTO | 0 | 43 | 43 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 139619 | 139619-362 P32G3 BONIFICA AMIANTO AREA LOG/IMA2 (AIA) AIA - TARANTO | 0 | 0 | 0 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 139611 | 139611-354 P32A7 BONIFICA AMIANTO AREA PCA (AIA) AIA - TARANTO | 0 | 18 | 18 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 140330 | 140330-374 P32A8 BONIFICA AMIANTO EX-AGGLOMERATO1 (AIA) AIA - TARANTO | 0 | 34 | 34 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 139606 | 139606-349 P32A3 BONIFICA AMIANTO AREA AGL (AIA) AIA - TARANTO | 0 | 19 | 19 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 119886 | 119886-72 P33A2 Fire Prevention certificate (Coke oven plant area) TARANTO | 1.171 | 1.529 | 2.700 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 119887 | 119887-73 P33A4 Fire Prevention certificate (Blast Furnace) TARANTO | 4.572 | 400 | 4.972 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 119888 | 119888-74 P33A5 Fire Prevention certificate (Ironmaking Byproducts) TARANTO | 1.349 | 426 | 1.775 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 119889 | 119889-75 P33B Fire Prevention certificate (Steelmaking) TARANTO | 278 | 145 | 423 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 119890 | 119890-76 P33C2 Fire Prevention certificate (Plate mill) TARANTO | 2.928 | 172 | 3.100 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 119891 | 119891-77 P33C4 Fire Prevention certificate (hsm/2) TARANTO | 1.171 | 816 | 1.987 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 119892 | 119892-78 P33H Fire Prevention certificate (Technical gas production) TARANTO | 1.915 | 527 | 2.442 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 119893 | 119893-79 P33N Fire Prevention certificate (main electrical workshop) TARANTO | 1.506 | 87 | 1.593 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120139 | 120139-80 P33 Fire Prevention certificate (General) TARANTO | 640 | 8 | 648 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120140 | 120140-81 P33A1 Fire Prevention certificate (Raw Material Area) TARANTO | 73 | 66 | 139 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120141 | 120141-82 P33A3 Fire Prevention certificate (Sinter plant) TARANTO | 5.123 | 9 | 5.132 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120142 | 120142-83 P33A6 Fire Prevention certificate (raw material No 1 harbour dock) TARANTO | 106 | 32 | 137 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120143 | 120143-84 P33A7 Fire Prevention certificate (Lime Kiln) TARANTO | 231 | 40 | 271 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120144 | 120144-85 P33C1 Fire Prevention certificate (HSM/1) TARANTO | 1.988 | 335 | 2.323 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120145 | 120145-86 P33C3 Fire Prevention certificate (Cold rolling) TARANTO | 4.214 | 717 | 4.931 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120146 | 120146-87 P33C5 Fire Prevention certificate (Strip finishing mill) TARANTO | 137 | 23 | 160 | |
| **ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE** | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120147 | 120147-88 P33D Fire Prevention certificate (main mechanical workshop) TARANTO | 1.140 | 79 | 1.219 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120148 | 120148-89 P33E Fire Prevention certificate (main buildings) TARANTO | 118 | 213 | 331 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120149 | 120149-90 P33F Fire Prevention certificate (Pipe coating) TARANTO | 2.974 | 494 | 3.469 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120150 | 120150-91 P33G Fire Prevention certificate (Logistics) TARANTO | 198 | 99 | 297 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120151 | 120151-92 P33I Fire Prevention certificate (Energy facilities) TARANTO | 3.698 | 1.029 | 4.727 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120152 | 120152-93 P33L Fire Prevention certificate (water treatment) TARANTO | 180 | 25 | 205 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120153 | 120153-94 P33M Fire Prevention certificate (main mechanical workshop) TARANTO | 83 | 0 | 83 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120154 | 120154-95 P33N1 Fire Prevention certificate (main electrical workshop) TARANTO | 130 | 0 | 130 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120155 | 120155-96 P33O Fire Prevention certificate (healt and safety dept.) TARANTO | 200 | 0 | 200 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 120185 | 120185-97 P33P Fire Prevention certificate (Material testing lab) TARANTO | 15 | 0 | 15 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 128821 | 128821-299 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Sinter / Blast Furnace | 0 | 389 | 389 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 128822 | 128822-300 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Steel Shop, Energy & Builidings | 0 | 287 | 287 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 128823 | 128823-301 P33 Fire Prevention Risk Assesment 2019 Finishing | 0 | 452 | 452 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 140921 | 140921-377 P33Z1 Consulenze Specialistiche CPI | 0 | 17 | 17 | |
| | Pr. UA20 - Certificato Prevenzioni Incendi - CPI - per lo Stabilimento: realizzazione interventi<br>*In corso* | | X | 140922 | 140922-378 P33G2 Fire Prevention certificate (Warehouse) | 0 | 50 | 50 | |
| | Pr. UA21 - Interventi afferenti la <<tematica acustica>><br>*In corso* | | X | 119882 | 119882-67 P76 A/694 NOICE REDUCTION PROJECT AIA - TARANTO | 65 | 132 | 197 | |
| | art.6 comma 1 del DPCM 2017<br>*In corso* | | X | 131974 | 131974-326 P61E A/738 DEMOLITION AND REMEDIATION OF EX OCD n°1 PUMPING STATION 3° PIER - AIA TARANTO | 0 | 336 | 336 | |
| | art.6 comma 1 del DPCM 2017<br>*In corso* | | X | 139597 | 139597-342 P61A A/720 Installazione filtro a tessuto spianatrice FNA/2 AIA - TARANTO | 0 | 335 | 335 | |
| | art.6 comma 1 del DPCM 2017<br>*In corso* | | X | 139601 | 139601-346 P61C A/729 Modifica sistema di abbattimento fumi acidi impianti di decapaggio (DEC/1 – DEC/2) AIA - TARANTO | 0 | 861 | 861 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRE PRESCRIZIONI IN AREE PRODUTTIVE | art.6 comma 1 del DPCM 2017<br>*In corso* | | X | 139598 | 139598-343 P61B A/726 Aspirazione e filtrazione fumi da ossitaglio zona SOITAAB AIA - TARANTO | 0 | 135 | 135 | |
| | Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto»<br>*In corso* | | X | 139600 | 139611-354 P32A7 BONIFICA AMIANTO AREA PCA (AIA) AIA - TARANTO | 0 | 24 | 24 | |
| | *Completata* | x | | 119881 | 119881-61 P50D5 A/719 CONFINEMENT OF HSM/2 WASTE WATER TREATMENT PLANT AIA - TARANTO | 0 | 57 | 57 | 57 |
| | *In corso* | | X | 119877 | 119877-57 P50D A/718 A/765 WATER RECOVERY AND REUSE PROJECT AIA - TARANTO | 977 | 5 | 982 | |
| **ALTRE PRESCRIZIONI IN AREA ILVA** | | | | | | **€ 41.800** | **€ 11.874** | **€ 53.674** | **€ 57** |
| TARANTO ENERGIA | AIA TARANTO ENERGIA<br>*Prescizione attuata* | X<br>(17/08/21) | | 131180 | 131180-322 NSD-552 ENGINEERING SERVICES FOR DE-NOX PROJECT - TARANTO ENERGIA | 0 | 205 | 205 | 205 |
| | AIA TARANTO ENERGIA<br>*Prescizione attuata* | X<br>(17/08/21) | | 139395 | 139395-340 NSD-563 DE-NOX @CET2 - AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 25.219 | 25.219 | 25.219 |
| | AIA TARANTO ENERGIA<br>*Prescizione attuata* | X<br>(17/08/21) | | 139592 | 139592-341 NSD-564 DE-NOX @CET3 - PHASE I (MOD 3) AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 2.159 | 2.159 | 2.159 |
| | AIA TARANTO ENERGIA<br>*Prescizione attuata* | X<br>(17/08/21) | | 144166 | 144166-432 NSD-620 DE-NOX @CET3 - PHASE II (MOD 1) AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
| | AIA TARANTO ENERGIA<br>*Prescizione attuata* | X<br>(17/08/21) | | 144717 | 144717-434 NSD-622 DE-NOX @CET3 - PHASE II (MOD 2) - AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 1.532 | 1.532 | 1.532 |
| | AIA TARANTO ENERGIA<br>*Prescizione attuata* | X<br>(17/08/21) | | 600007 | 600007 - 558 - Adeguamenti SME CET2 e CET3 - AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 277 | 277 | 277 |
| **DE-NOX TARANTO ENERGIA** | | | | | | **€ -** | **€ 30.421** | **€ 30.421** | **€ 30.421** |
| **PA - TOTALE PIANO AMBIENTALE** | | | | | | **€ 292.640** | **€ 516.021** | **€ 808.661** | **€ 625.147** |

| AREA INTERVENTO | Elenco prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547 - PIANO AMBIENTALE | Attuata | In corso | PPM CODE | Descrizione progetto | Speso al 31 Ott 2018 (€/000) | Speso dal 1° Nov 2018 al 31 Marzo 2022 (€/000) | Speso Totale al 31/03/2022 (€/000) | Speso Totale al 31/03/2022 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIANO RIFIUTI | Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei ed Impianto Pressa Vezzani<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119834 | 119834-39 P27C A/401 - P27C1 A/970 TEMPORARY WASTE DUMPS AIA - TARANTO | 4.271 | 1.354 | 5.625 | 5.625 |
| | Pr.UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2<br>*Prescrizione AIA attuata* | x<br>(21.06.2019) | | 119835 | 119835-40 P27D A/677 REMOVAL OF SLUDGE FROM WASTE WATER DISCHARGE CHANNEL AIA - TARANTO | 4.626 | 9.458 | 14.084 | 14.084 |
| | Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119837 | 119837-42 P27F A/682 S3 TANK SITE SECURING AIA - TARANTO | 2.575 | 1.617 | 4.193 | 4.193 |
| | Pr. UA26 - Fase1 (rimozione materiali), Fase 2 - indagini di caratterizzazione ambientale area PFU<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119884 | 119884-70 P506 A/976 WORN OUT TYRES DUMP SITE SOIL DECONTAMINATION AIA - TARANTO | 0 | 12 | 12 | 12 |
| | Pr. UA27 - Fase1 (rimozione materiali), Fase 2 - indagini di caratterizzazione ambientale area traversine<br>*Prescrizione AIA attuata al 31.12.2018* | X<br>(31.12.2018) | | 119885 | 119885-71 P505 A/977 RAILROAD TILES DUMP SOIL DECONTAMINATION AIA - TARANTO | 0 | 42 | 42 | 42 |
| | Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale<br>*Attività in corso* | | X | 119836 | 119836-41 P27E A/704 POWDER AND SCALE PILE TO BE REMOVED OUT OF ORE YARD AIA - TARANTO | 76 | 26.188 | 26.264 | |
| | Pr. UP2 - D.M. (MITE) 213/21 -Mitigazioni - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale<br>*Attività in corso* | X<br>(31.10.2021) | | 600006 | 600006 - P315 A/3104 - Sistemazione aree esterne alle nuove coperture delle materie prime - AIA TARANTO | 0 | 468 | 468 | 468 |
| | Pr. UP3 - Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO" (Zona 2, circa 400.000 ton)<br>*Attività di smaltimento in corso* | | X | 119832 | 119832-37 P27A9 A/985 BF SLUDGE DISPOSAL Zone n°2 AIA - TARANTO | 0 | 17.054 | 17.054 | |
| | Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae"<br>*Prescrizione AIA attuata* | x<br>(31.05.2019) | | 119833 | 119833-38 P27A7 A/710 NOT HAZARDOUS G2 WASTE DUMP SHUT DOWN / CLOSURE AIA - TARANTO | 1.865 | 1.862 | 3.727 | 3.727 |
| | D. Lgs. 5/01/2015 - Realizzazione nuova discarica rifiuti pericolosi<br>*Attività in corso* | | X | 119830 | 119830-35 P27A3 A/702 NEW HAZARDOUS WASTE DUMP AIA - TARANTO | 1.892 | 1.414 | 3.306 | |
| | D. Lgs. 5/01/2015 - Realizzazione nuova discarica rifiuti non pericolosi<br>*Attività in corso* | | X | 119831 | 119831-36 P27A4 A/703 NEW NOT HAZARDOUS WASTE DUMP AIA - TARANTO | 6.127 | 2.261 | 8.388 | |
| | *Gestione di materiali di scavo come rifiuto con riferimento agli interventi previsti nel DPCM 28/0/2017* | | X | 131033 | 131033-315 - AIA SITES EXCAVATED GROUND MANAGEMENT | 0 | 3.806 | 3.806 | |
| **PR - TOTALE PIANO RIFIUTI** | | | | | | **€ 21.432** | **€ 65.536** | **€ 86.968** | **€ 28.151** |
| **TOTALE IMPORTO PAGATO (PA+PR) al 31/03/2022** | | | | | | **€ 314.072** | **€ 581.558** | **€ 895.629** | **€ 653.298** |

## 3.Dati sulla qualità dell'aria in prossimità dello stabilimento di Taranto

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.


La qualità dell'aria esterna allo stabilimento Acciaierie d'Italia S.p.A (già ArcelorMittal Italia S.p.A) di Taranto viene costantemente monitorata attraverso una rete di centraline gestite dall'ARPA Puglia i cui dati vengono resi disponibili al pubblico sul sito web di ARPA Puglia, nonché formano oggetto di reportistica periodica effettuata da parte della stessa Agenzia.


La centralina di via Machiavelli è quella più completa dal punto di vista di inquinanti monitorati ed è generalmente presa a riferimento per la caratterizzazione della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi, vicino all'area industriale.


Nell'area in questione sono presenti, oltre ad Acciaierie d'Italia S.p.A., anche altre attività industriali, l'attività portuale e importanti vie di comunicazione quali principalmente: Taranto-Reggio Calabria, Taranto-Brindisi e Taranto-Statte.

Tra i parametri monitorati nella suddetta centralina che hanno destato particolare attenzione per gli effetti sulla salute pubblica, vi sono le polveri sospese (PM10 e PM2,5) e il benzo(a)pirene. Inquinanti che, oltre ad avere diverse origini naturali e antropiche, sono anche riconducibili alle emissioni derivanti dall'attività produttiva dello stabilimento siderurgico.

Di seguito si riportano i grafici con gli andamenti elaborati sulla base dei dati disponibili resi pubblici da ARPA Puglia.

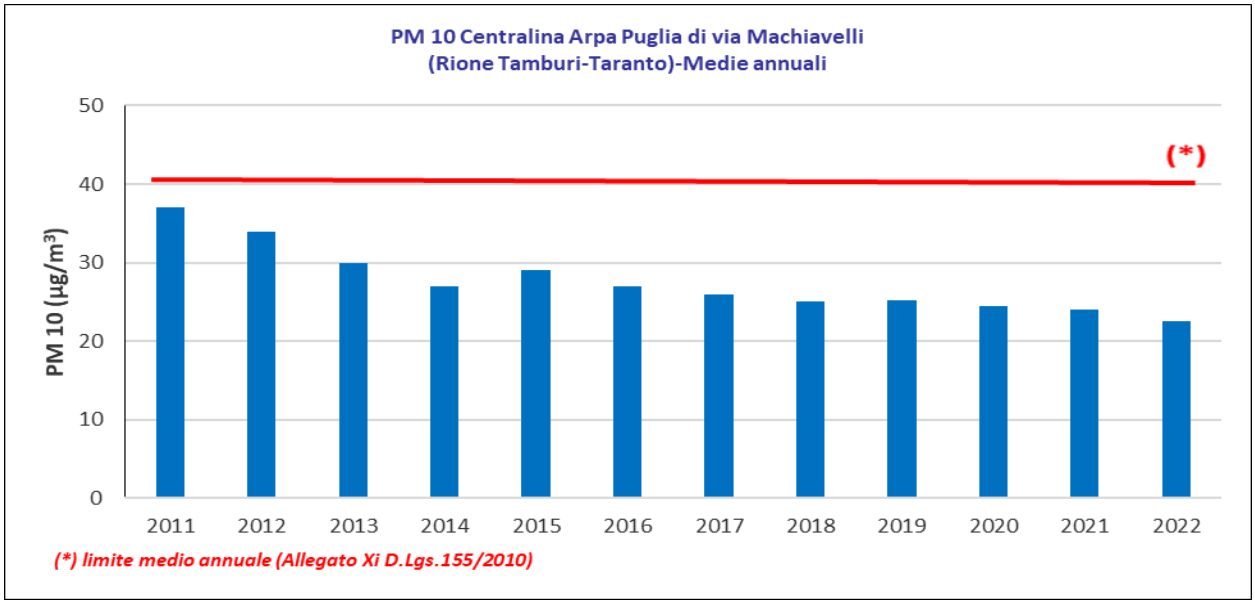

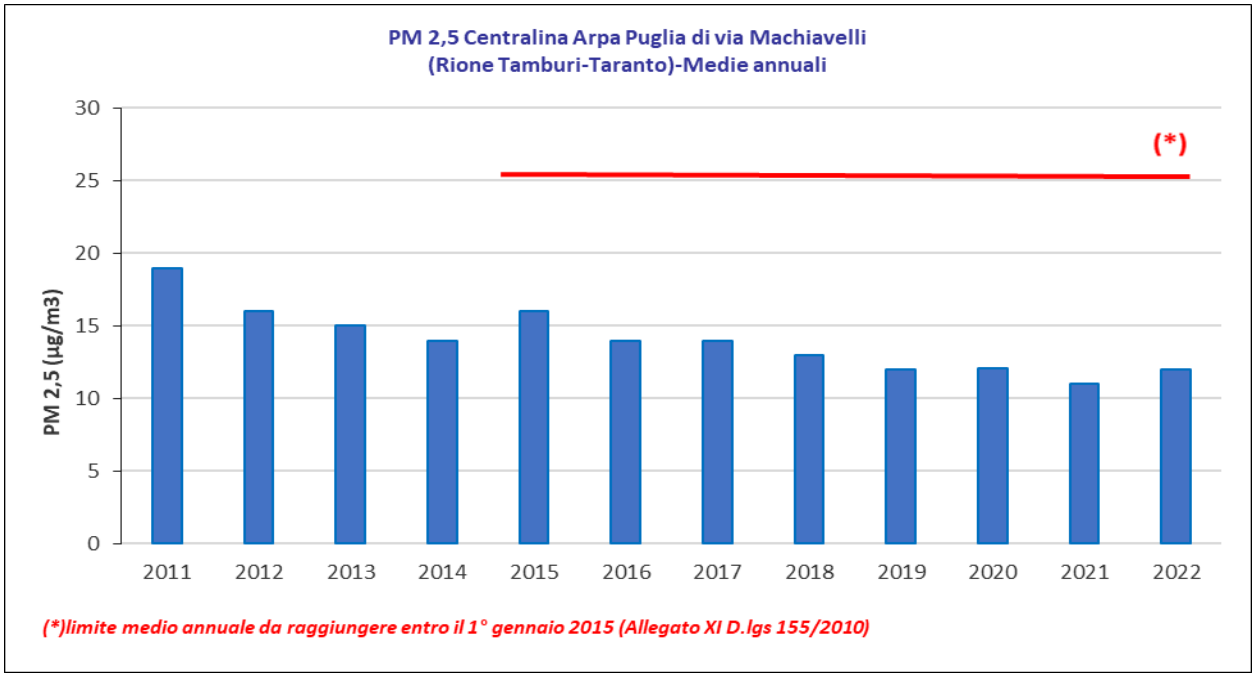

PM 2,5 Centralina Arpa Puglia di via Machiavelli
(Rione Tamburi-Taranto)-Medie annuali
PM 2,5 (µg/m3)
30
25
20
15
10
5
0
(*)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(*)limite medio annuale da raggiungere entro il 1° gennaio 2015 (Allegato XI D.lgs 155/2010)

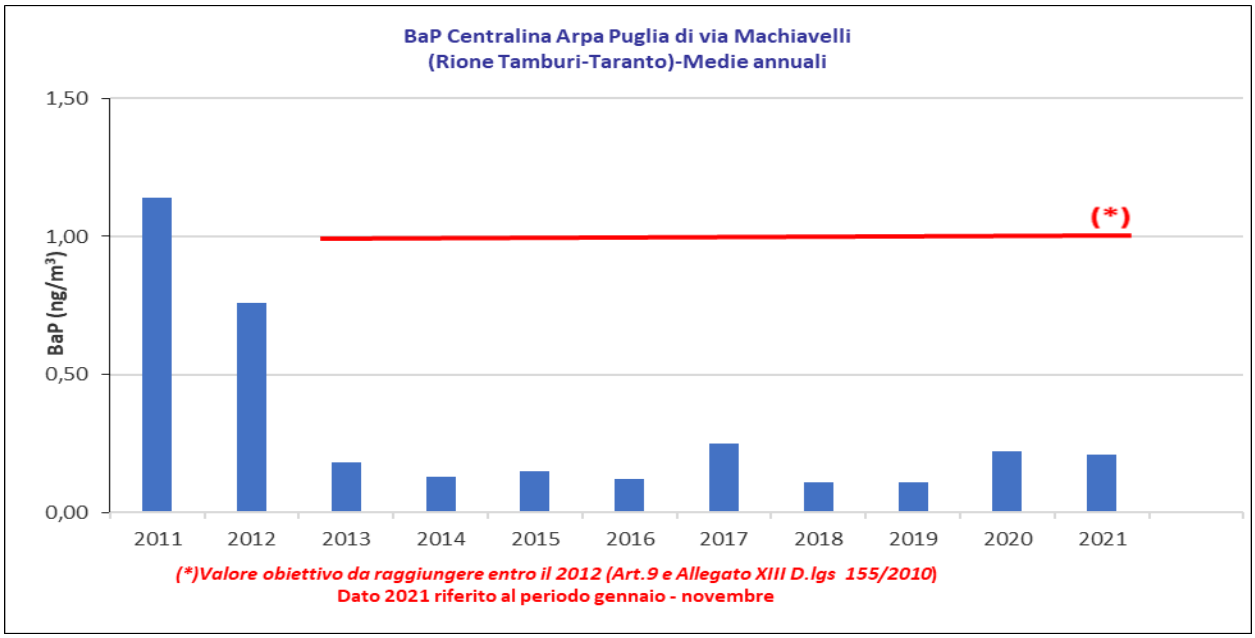

BaP Centralina Arpa Puglia di via Machiavelli
(Rione Tamburi-Taranto)-Medie annuali
BaP (ng/m³)
1,50
1,00
0,50
0,00
(*)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
(*)Valore obiettivo da raggiungere entro il 2012 (Art.9 e Allegato XIII D.lgs 155/2010)
Dato 2021 riferito al periodo gennaio - novembre


## 4.Sicurezza sul luogo di lavoro – Infortunistica

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

A conclusione del primo trimestre 2022, l'indice infortuni totali, l'indice infortuni indennizzati e l'indice di gravità, per l'intero gruppo Acciaierie d'Italia (escluse le imprese di appalto), si sono attestati, rispettivamente, su valori pari a 11.5, 11.0 e 0,1. L'andamento degli stessi è riportato nei grafici.

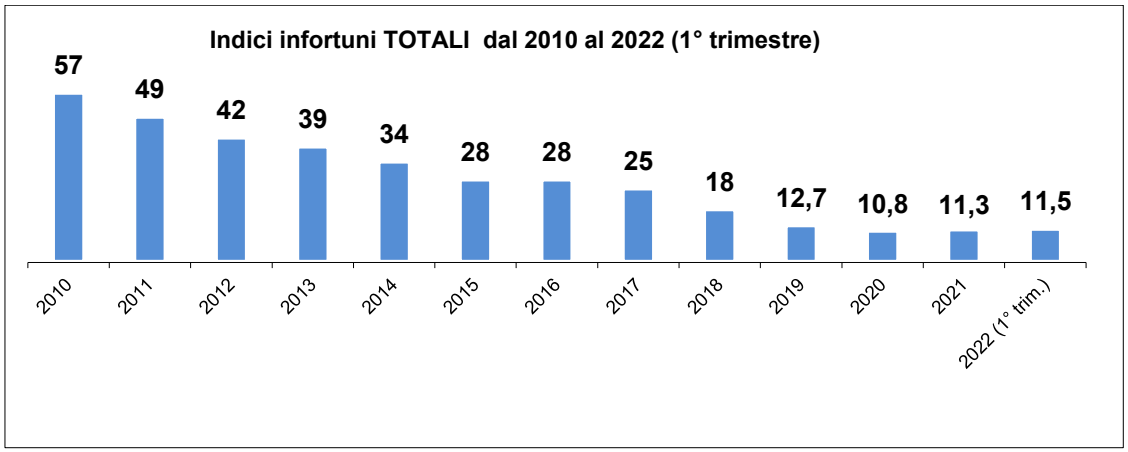

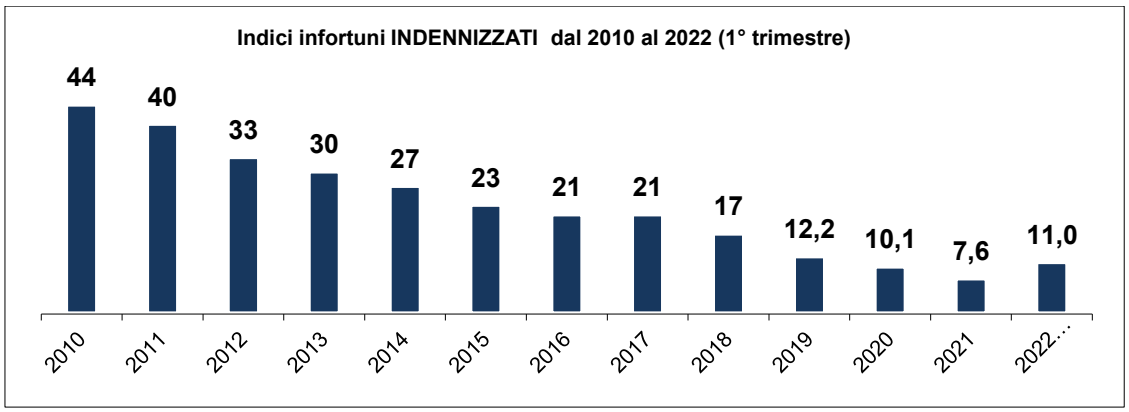In riferimento alle attività formative svolte nei vari siti del Gruppo, nel rispetto dei programmi di formazione annuali, costantemente aggiornati in funzione degli obblighi normativi e delle nuove attività schedulate, è proseguito lo svolgimento di attività finalizzate a:

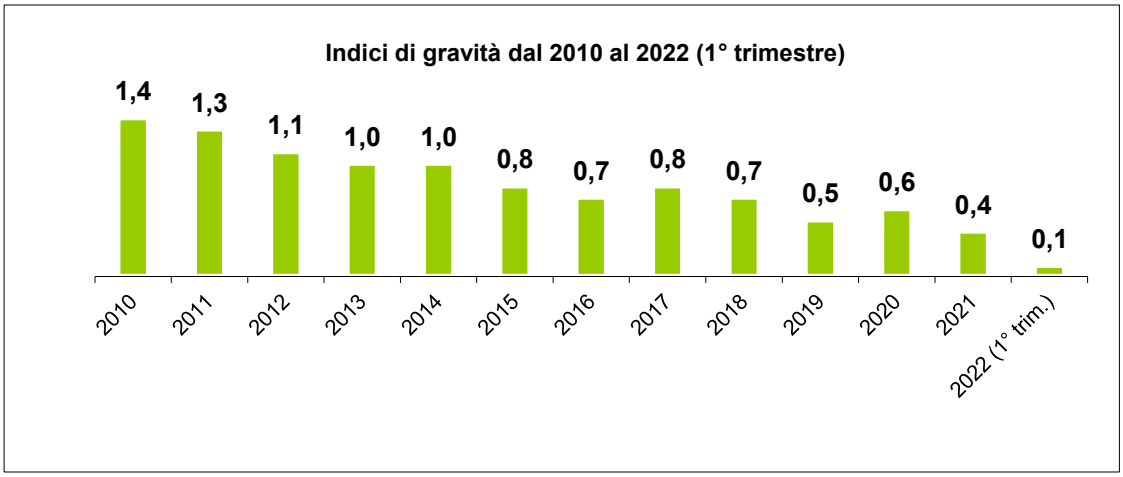- fornire conoscenza dei rischi dello specifico lavoro, anche sulla base dell'esperienza operativa maturata,
- conoscere il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
- illustrare il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro,
- trasmettere le informazioni relative alla gestione delle emergenze, ai rischi di incidenti rilevanti e alle procedure di lavoro.

Nel trimestre sono state erogate 34773 ore di formazione (fig.1), con 91906 partecipazioni registrate (fig.2).

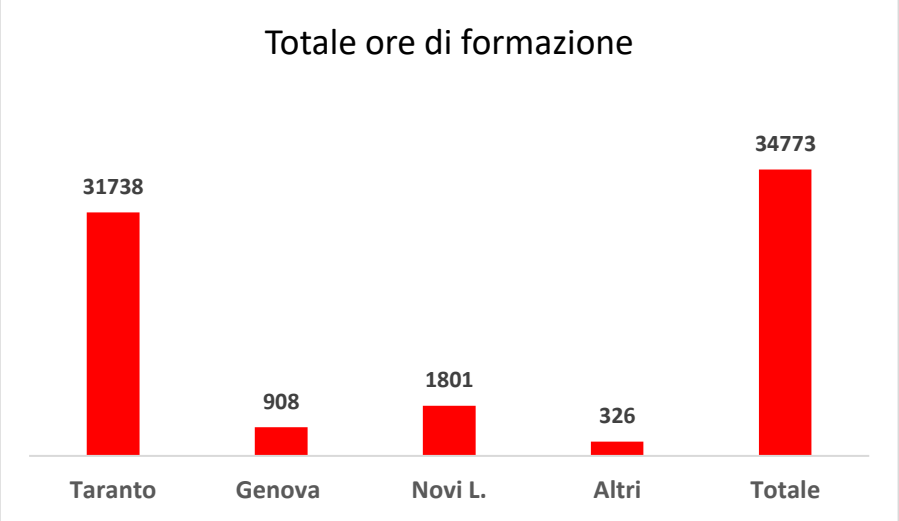



**Fig.1**

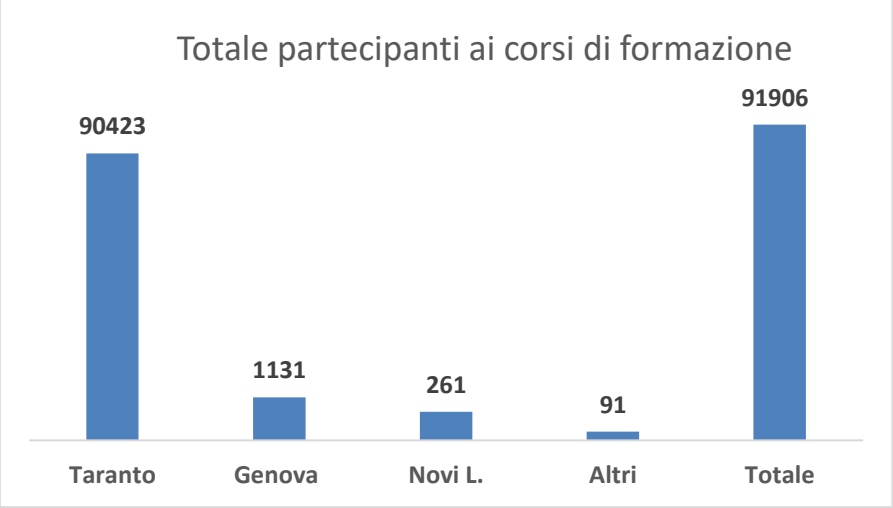




**Fig. 2**

Sono continuate le attività di monitoraggio dei lavori svolti dalle imprese appaltatrici.

Sono state eseguite, nel corso del primo trimestre 2022, nel sito di Taranto, n. 104 ispezioni nei cantieri. A fronte di tali ispezioni, nel trimestre, sono state formalizzate n.2 lettere di contestazione che hanno coinvolto n. 3 imprese.

È proseguita, nel sito di Taranto, l'attività di formazione di tutto il personale in ingresso al sito appartenente alle imprese appaltatrici. Nel trimestre sono stati coinvolti circa 1300 lavoratori delle imprese.

Relativamente ai dati infortunistici delle imprese d'appalto per l'intero gruppo Acciaierie d'Italia, il primo trimestre 2022 si è chiuso con un indice di frequenza pari a 6,1.

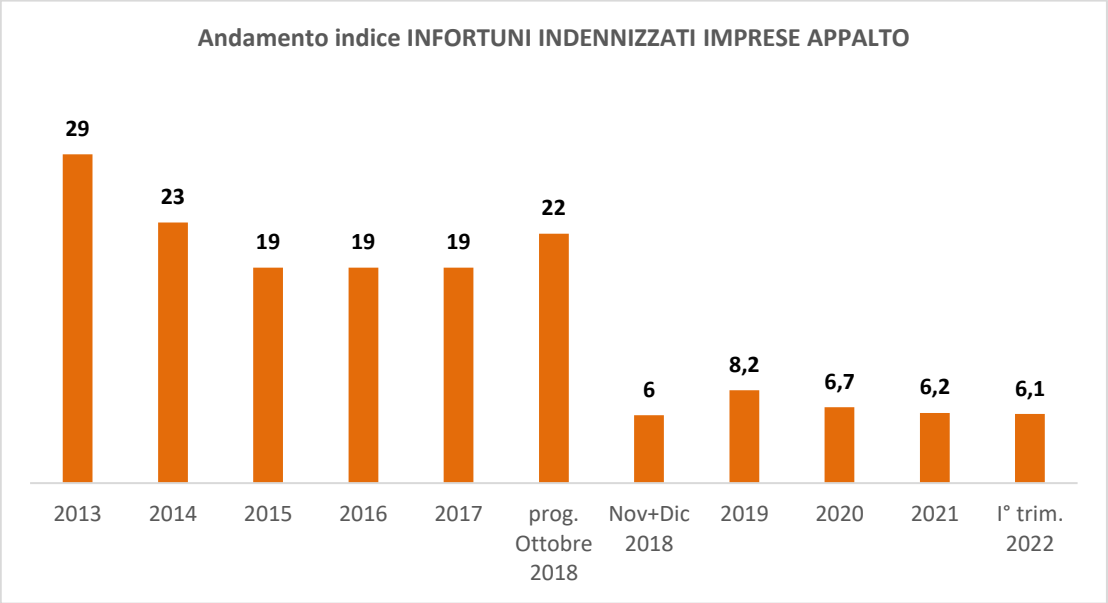


È continuata l'analisi sistematica e la condivisione, tra tutti i responsabili di area e la Direzione di stabilimento, degli infortuni dei dipendenti, dei lavoratori delle imprese e dei near miss verificatisi con anche l'approfondimento di tematiche specifiche di prevenzione che interessano il sito.

Relativamente all'emergenza COVID-19, sono proseguiti i controlli operativi per la verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione, sia nell'ambito degli ambienti di competenza aziendale che nei cantieri logistici delle imprese d'appalto.

Relativamente al sito di Taranto, alla data del 31/03/2022 si segnalano le seguenti ulteriori attività:

1. Per le attività di ispezione e monitoraggio dei materiali contenenti amianto e FAV, sono in fase di completamento le attività previste per l'anno 2021. La gran parte delle relazioni è già disponibile e trasmessa agli enti esterni. Per la medesima attività relativa all'anno 2022 è in corso l'assegnazione degli ordini alle ditte specializzate. In continuità con i risultati degli anni precedenti, le verifiche eseguite non hanno evidenziato criticità.

2. Per quanto attiene le attività di bonifica amianto risultano avviati diversi cantieri tra cui si segnalano, per rilevanza, la bonifica e la demolizione dell'altoforno n. 3, la bonifica degli spogliatori dismessi e di guarnizioni nell'area sottoprodotti. Sono state ultimate le attività di

bonifica amianto delle guarnizioni della condotta LAF Temper, delle guarnizioni del Camino E711 del LAF e della I e II unità della fabbrica ossigeno.

3. Relativamente ai monitoraggi personali e ambientali di inquinanti aerodispersi previsti dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), predisposto dal Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, a fronte dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale avvenuto a dicembre 2018, è continuata l'esecuzione delle campagne di monitoraggio da eseguirsi nel triennio 2019 – 2022. Sono stati conclusi nel trimestre di interesse i monitoraggi in area PCA/FOC e ACC2. Le attività in corso riguardano i monitoraggi in area LAF, IMA e PARCHI.
È, inoltre, in corso, sempre in collaborazione con il Politecnico di Torino, l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale resosi necessario a fronte delle novità legislative e tecniche intercorse.

4. Risultano in corso le attività di monitoraggio effettuate settimanalmente sui piani di carica delle batterie, secondo quanto disposto dall'AIA.

5. Per quanto attiene la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici, sono in corso le attività di aggiornamento del rapporto tecnico di valutazione del rischio Rumore e Vibrazioni meccaniche di stabilimento.

6. È stata ultimata la valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici in ambiente di lavoro.

7. È stata ultimata la valutazione del rischio stress lavoro correlato.

## 5. Aree Escluse di competenza Ilva

Le aree escluse di competenza Ilva sono 18 e sono classificabili in 4 segmenti di appartenenza:

1. **Aree sottoposte a sequestro con interventi in corso**: Gravina Leucaspide, Collinette Ecologiche e discarica Nord-Ovest;
2. **Aree con interventi in corso**: discarica ex cava Due Mari, discarica ex cava Cementir, Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC, discarica Nuove Vasche, Aree a verde lungo SP Statte lato ovest, Aree a verde Nord, Land A, Land C, Land D1, Land E, Aree limitrofe stoccaggio fanghi;
3. **Aree in manutenzione e con procedimento da definire**: Land L, Area Pozzo 25;
4. **Aree cedibili e prive di pendenze**: Land I.

## 5.1 AREE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO CON INTERVENTI IN CORSO

**COLLINE LEUCASPIDE E VECCHIE VASCHE**


L'area antistante la Gravina Leucaspide fu individuata sin dagli anni '60 come area in cui depositare, secondo le consuetudini e le leggi vigenti all'epoca, i terreni di risulta degli scavi, oltre che i residui di produzione, creando terrapieni che presero la denominazione di "colline".

Il deposito dei materiali cessò agli inizi degli anni '70 e le aree sulla sommità delle "colline" furono adibite alla realizzazione di n. 7 "vasche" per la sedimentazione ed ispessimento di residui oleosi, prima del trasferimento degli stessi agli impianti di conferimento finale.

Le cd. "vasche" sono ampi volumi sagomati in rilevato mediante argini in terrapieno (ossia non sono strutture in cemento o similari).


Tale attività proseguì fino circa alla metà degli anni '80, quando fu poi definitivamente interrotta, anche in relazione alle nuove regolamentazioni in materia di gestione dei rifiuti.

L'area interessata dal rilevato (cd. "colline") e le relative vasche 1-7 sono evidenziati nella seguente figura:

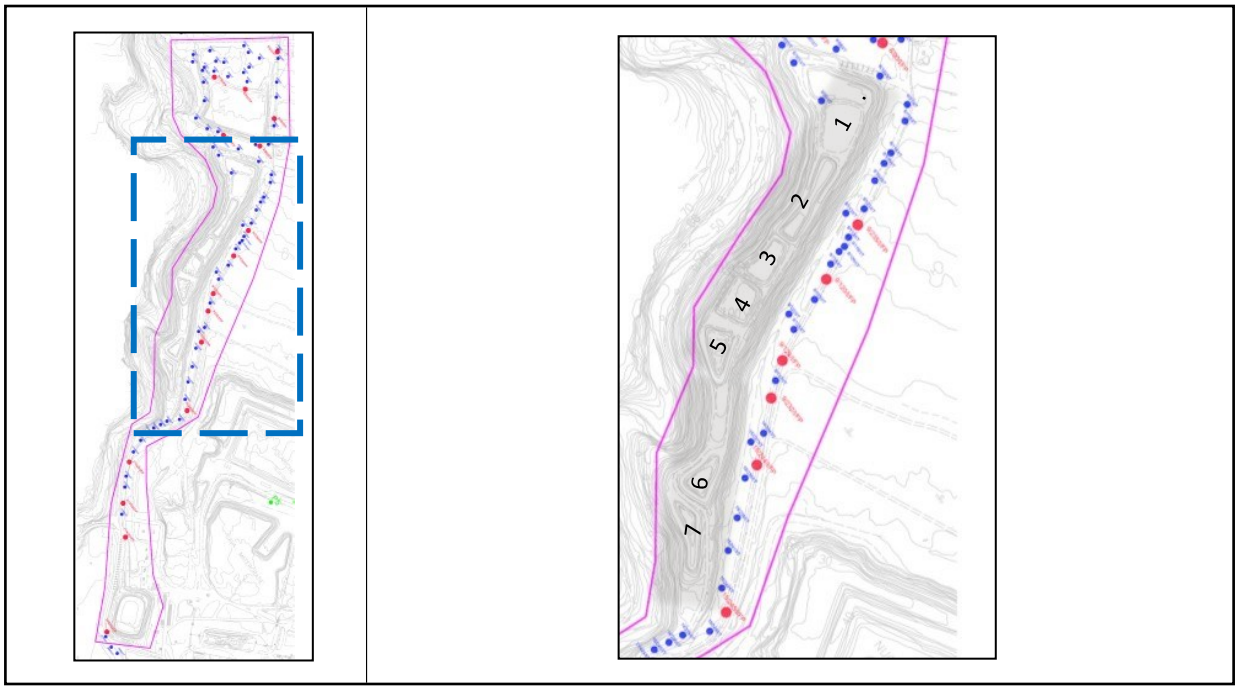


La discarica Sud Ovest e relativa vasca 8 risulta parzialmente differente rispetto alle "collinette".

In particolare, essa è fisicamente separata dalle "collinette", non è direttamente prospiciente alla Gravina e la "vasca" per la decantazione fanghi non era stata realizzata in rilevato bensì in depressione sulla sommità della discarica.
Stante la cessazione totale delle attività di decantazione fanghi più o meno contestuale al periodo in cui veniva realizzata la vasca, non è noto se la struttura sia mai stata messa in servizio oppure se il progetto sia stato di fatto abbandonato prima della sua realizzazione.
Nella seguente figura è riportata l'ubicazione della discarica Sud-Ovest con la relativa vasca 8:

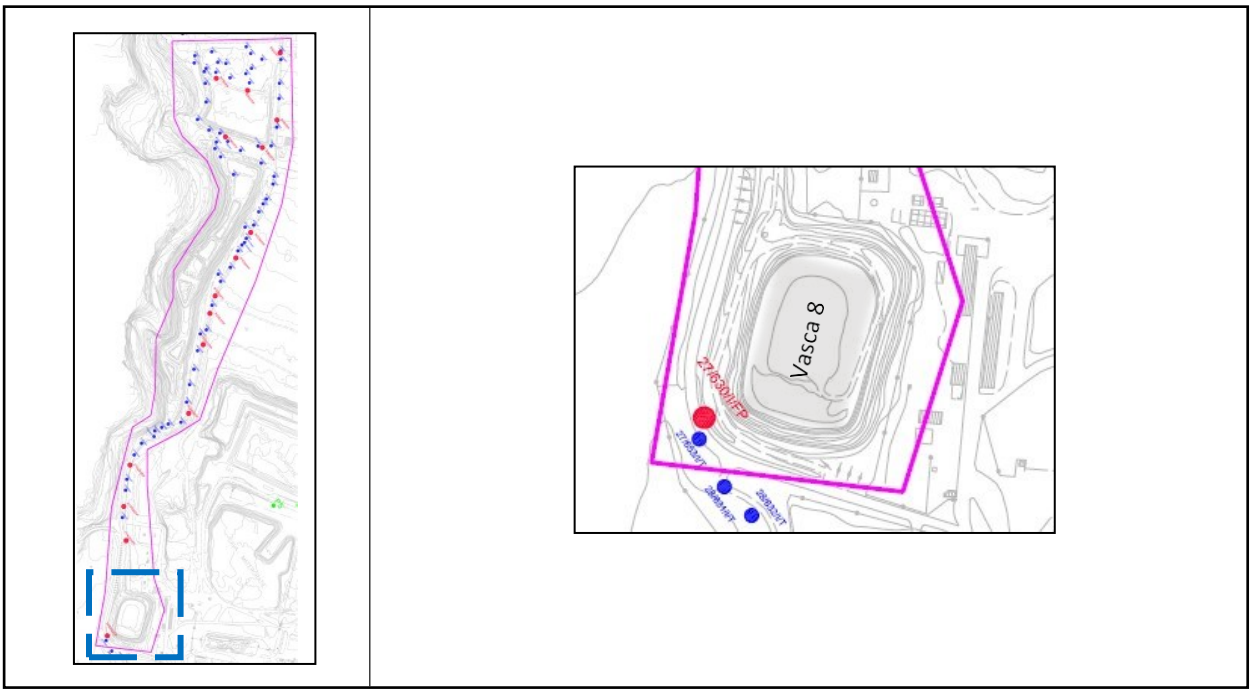


Le attività in corso sono:

- <u>indagini di caratterizzazione (ordine 640 del 02.10.2020)</u>: nel 2018, Ilva ha presentato alla Procura della Repubblica di Taranto un piano di indagini ambientali, elaborato dall'Ing. Maurizio Francesco Onofrio (cd. "Piano Onofrio"), finalizzato ad analizzare i rilevati e a verificare l'eventuale presenza di impatti correlabili all'attività di essiccamento fanghi che venne effettuata fino alla prima metà degli anni '80 all'interno delle vasche ubicate sulla sommità dei rilevati stessi. Il piano fu oggetto di osservazioni e prescrizioni da parte di ARPA Puglia, richiedendo pertanto una successiva rielaborazione. Si riportano di seguito i passaggi intercorsi nella definizione del piano:
  - maggio 2018 - Ilva ha depositato il Piano Onofrio;
  - ottobre 2018 – ARPA Puglia ha trasmesso il proprio parere;
  - maggio 2019 – Ilva ha depositato la revisione del Piano Onofrio;
  - febbraio 2020 – ARPA Puglia ha depositato il proprio parere.

  All'esito della sequenza progettuale sopra indicata, è stato delineato un elenco di attività, alcune delle quali ritenute direttamente eseguibili, pur con le dovute limitazioni derivanti dalla peculiare morfologia dei luoghi, e altre di non immediata attuazione, in quanto connesse all'esecuzione di attività in luoghi attualmente non accessibili;


- <u>indagini ambientali in zone ad accessibilità limitata (ordine 597 del 2.10.2020)</u>: l'attività comprende le indagini proposte nel "Piano Onofrio", oltre a n. 3 sondaggi verticali

integrativi ubicati da ARPA Puglia in postazioni con un grado di complessità analogo a quello dei sondaggi già previsti. Nell'esecuzione delle attività, sono inoltre state recepite tutte le prescrizioni ARPA direttamente eseguibili (integrazioni analitiche, rilievi o altre attività prive di impatti in termini di operatività). Nella figura alla pagina successiva è riportata l'ubicazione:

- delle indagini eseguite in attuazione del Piano di Caratterizzazione (approvazione, 2003; attuazione, 2004-2006 per l'intero stabilimento; relazione tecnica finale, 2007):
  - in blu sono evidenziati i sondaggi;
  - in rosso i piezometri;
- delle nuove indagini previste dal "Piano Onofrio", comprensive dei sondaggi integrativi prescritti da ARPA Puglia, di cui:
  - da S1 a S6: sondaggi previsti dal "Piano Onofrio";
  - da S7 a S9: sondaggi integrativi prescritti da ARPA Puglia.

Oltre all'esecuzione dei sondaggi, con relativo campionamento ed analisi dei terreni attraversati, il "Piano Onofrio" comprende anche le seguenti attività:

- monitoraggio della falda in corrispondenza dei piezometri esistenti, con determinazione di tutti i parametri elencati nel D.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2;
- estrazione e successivo ripristino delle pompe e relativi collegamenti idraulici ed elettrici dai pozzi di monitoraggio relativi alla "Discarica Nord Ovest", ai fini della installazione di tubi-guida che consentano la misura del livello piezometrico (precedentemente non possibile).

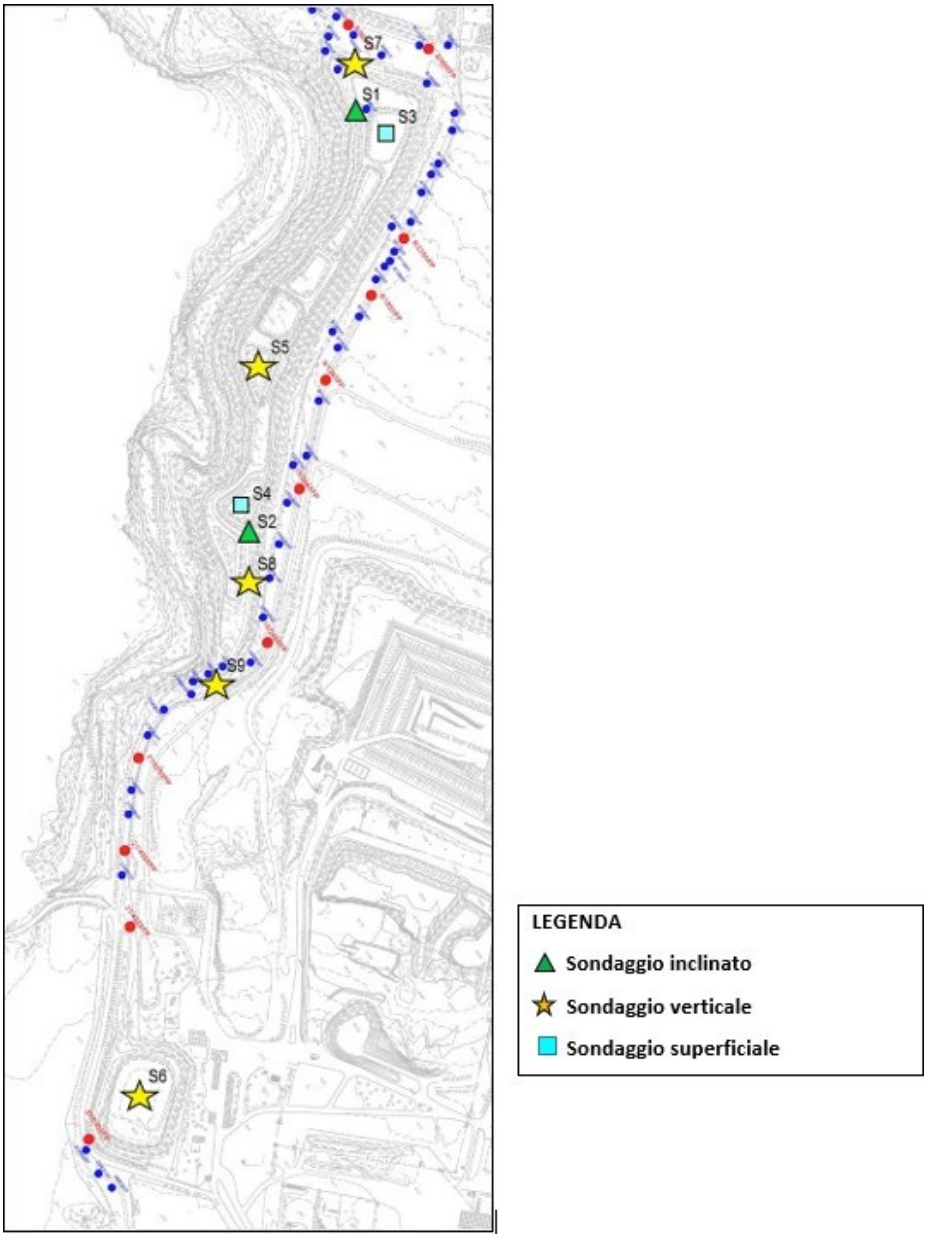


Le attività pianificate sono:

1. monitoraggio in continuo del rilevato: a seguito degli esiti delle indagini indirette condotte sul corpo del rilevato, finalizzate all'aggiornamento del PSC, si è appreso che la struttura dell'intero rilevato risulta essere fortemente disomogenea, sia per la natura dei materiali che lo compongono sia per grado di addensamento e compattazione dei materiali stessi. Infatti, gli esiti dello studio hanno evidenziato che le scarpate risulterebbero piuttosto stabili mentre la parte sommitale, per uno spessore medio di circa cinque metri e giacitura concordante con il versante, sarebbe costituita da una coltre sabbioso-ghiaioso, perlopiù degradata e mobilizzata, su cui si rinvengono fessure beanti e crepe sul ciglio. Inoltre, nel settembre 2016, il corpo rilevato era già stato oggetto di uno studio, effettuato da Techgea S.r.l. ("**Techgea**"), che aveva constatato la stabilità globale del rilevato e dei versanti, pur riscontrando, lungo il fondovalle del versante sinistro della Gravina, sia un fenomeno di erosione al piede che un fenomeno di erosione diffusa (ruscellamento) sulle

superfici denudate. Tali evidenze, pertanto, necessiterebbero di una maggiore valutazione mediante l'installazione di un sistema di monitoraggio. A tal proposito Ilva ha emesso in data 12/01/2022 la RdA n. 25/22 per la predisposizione di un sistema monitoraggio atto a verificare la stabilità dell'intero corpo del rilevato. Successivamente, nel periodo 14-21/01/2022, si sono tenuti i sopralluoghi con le n. 5 società interpellate. In data 11/03/2022 è stato emesso l'Ordine n. 79/22 in favore dello Studio Tecnico di Geologia e Ingegneria Ambientale con sede a Firenze;

2. messa in sicurezza del rilevato rispetto all'erosione al piede e dei versanti: Ilva aveva commissionato un'analisi di stabilità del rilevato alla società Techgea. La relazione tecnica stilata nel 2016 riportava le seguenti valutazioni: stabilità del corpo del rilevato, erosione al piede, erosione ai fianchi con limitata rivegetazione. Ilva ha pertanto deciso di mandare in affidamento la progettazione definitiva delle opere di messa in sicurezza del rilevato, come individuate nell'ambito dello studio effettuato da Techgea. A tal fine, è stata emessa la specifica tecnica ATO 02_2020 del 19.3.2020 e la relativa RDA 763_2020 del 24.3.2020. A seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente con le ditte invitate alla gara, è emersa la necessità di disporre di adeguati dati geotecnici del corpo del rilevato, ai fini di poter effettuare verifiche più analitiche circa la stabilità complessiva e l'estensione e modalità di applicazione degli interventi di messa in sicurezza. Tali indagini riguarderebbero anche zone non direttamente accessibili;

3. sondaggi ambientali in zone attualmente inaccessibili: ARPA Puglia ha chiesto ad Ilva di effettuare approfondimenti circa la fattibilità dell'esecuzione di sondaggi all'interno di ciascuna vasca. Ilva ha deciso di dare attuazione a quanto richiesto tramite una gara, con la quale ha ricercato sul mercato società che valutassero le soluzioni operative per accedere ai luoghi e presentassero conseguente offerta vincolante all'esecuzione. Tale modalità di ricerca ha lo scopo di non disgiungere le valutazioni di fattibilità dalla effettiva operabilità di quanto eventualmente prospettato. La gara ha avuto uno svolgimento piuttosto lungo e articolato, sia per la difficoltà di reperire più soggetti in grado di offrire il servizio richiesto, sia per recepire progressive osservazioni e indicazioni operative da parte dei tecnici e professionisti che effettuavano gli approfondimenti nella ricerca delle possibili soluzioni di accesso. Rispetto alle previsioni iniziali, che prevedevano la sola esecuzione delle indagini ambientali, la gara è stata estesa all'esecuzione di indagini geotecniche per la determinazione dei parametri utili alla progettazione definitiva delle opere di messa in sicurezza del rilevato, per il quale era stata avviata una gara distinta. Il quadro emerso dalle verifiche ed approfondimenti effettuati in sede di gara, ha portato all'individuazione di tre soggetti che hanno presentato offerta per eseguire le indagini previste. A seconda dei fornitori, le soluzioni individuate per gli accessi sono, alternativamente: gru di elevate dimensioni ovvero elicottero. Per la finalizzazione della gara è stato necessario emettere una nuova RDA di importo adeguato rispetto al costo risultante dai preventivi ricevuti, superiore ad un milione di euro, nonché sono state aggiornate e integrare le specifiche tecniche, con i relativi capitolati e computi metrici. Gli esiti delle indagini integrative, finalizzate ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi ai fini dell'aggiornamento del PSC, hanno evidenziato la presenza di fessure beanti e crepe sul ciglio del versante. Per tali motivi, Ilva si è attivata al fine di predisporre un sistema di monitoraggio del sito in modo da verificare l'assenza di fenomeni di instabilità dei versanti, delle aree attualmente oggetto di erosione e, comunque, dell'intero corpo del rilevato in prospettiva delle future attività previste nel nell'area. Per tali ragioni, ad oggi, non sarebbe più percorribile la soluzione di accesso alle vasche, mediante gru di elevate dimensioni, considerato che,

per il raggiungimento di tutti i punti di indagine previsti nelle vasche, il posizionamento della gru ricadrebbe esattamente in corrispondenza del versante più critico, tra la vasca 3 e la vasca 4;

4. monitoraggio annuale della falda profonda: viene eseguito congiuntamente alla discarica Nord-Ovest. Fino al 2019, il monitoraggio è stato effettuato adottando il set analitico definito nell'ambito del PMC. Dal monitoraggio 2020, è stato adottato il set di monitoraggio prescritto da ARPA Puglia nell'ambito delle osservazioni al Piano Onofrio. Nel 2020, il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito dell'ordine affidato per l'esecuzione delle indagini del Piano Onofrio. Una sintesi dei risultati, comprensiva degli anni pregressi, è stata trasmessa agli Enti competenti ed alla Procura di Taranto a giugno 2021. Per una migliore comparabilità dei dati, il monitoraggio viene effettuato circa nello stesso periodo dell'anno, ossia nell'ultimo trimestre. Il monitoraggio per l'anno 2022 (RdA 582/22) è stato pianificato per fine agosto/inizio settembre, su richiesta di ARPA Puglia;

5. aggiornamento caratterizzazione (procedimento SIN): come per l'area Discarica Nord-Ovest (su cui *infra*).

**DISCARICA NORD OVEST E AREA FINTECNA**

Nell'ambito del Piano di Caratterizzazione dello stabilimento Ilva nel suo complesso (ERM, 2003) e sua attuazione, l'area in questione era stata suddivisa in tre aree distinte:

- cd. "discarica Nord-Ovest", identificata nel Piano di Caratterizzazione come area originariamente adibita a discarica;
- cd. "area ex Fintecna", non identificata nel Piano di Caratterizzazione come area di discarica, ma laddove i sondaggi eseguiti in sede di caratterizzazione (2004-2006) evidenziarono la presenza di rifiuti;
- aree adiacenti alla "ex Fintecna", non identificata nel Piano di Caratterizzazione come area di discarica e risultata come terreni conformi in base ai sondaggi eseguiti per la caratterizzazione (2004-2006).

L'interpretazione risultante dal Piano di Caratterizzazione e dall'esito delle indagini è stata poi mantenuta negli atti e documenti successivi, dando luogo alle prescrizioni di cui al DPCM 14.3.2014 e D.L. 1/2015 (cd. Piano Rifiuti).

A seguito dei maggiori approfondimenti documentali condotti nel 2017, venne compreso che le aree di cui trattasi facevano invece originariamente parte di un'unica area in passato adibita a discarica.

Conseguentemente, Ilva ha trasmesso agli Enti competenti le note di chiarimento DIR 429/2017 e DIR 439/2017, manifestando l'intenzione di estendere l'intervento di messa in sicurezza permanente già previsto per la cd. "Discarica Nord-Ovest" anche alle circostanti aree denominate "Area Fintecna" e adiacenti.

Ad agosto 2018, fu redatto uno studio di fattibilità (da Desmos s.r.l.), volto a definire alcune questioni tecniche e vincolistiche, ai fini della rimodulazione del progetto, il quale, in estrema sintesi, consisterà nella estensione dell'intervento di messa in sicurezza permanente già previsto per la "Discarica Nord Ovest" a tutte e tre le aree di cui sopra.

A causa delle improprie modalità di caratterizzazione dell'area ex-Fintecna, conseguenti all'errato inquadramento effettuato in sede di Piano di Caratterizzazione (2003), i dati analitici allora raccolti non forniscono informazioni pertinenti circa le caratteristiche dei rifiuti rinvenuti in tale area.

In merito, lo studio di fattibilità condotto da Desmos s.r.l. ha proposto tre approcci:

- accertare le caratteristiche di non pericolosità dei rifiuti presenti nell'area ex-Fintecna e, in tal caso, estendere a tutto il nuovo perimetro l'intervento autorizzato per il vecchio perimetro della discarica Nord-Ovest (ex prescrizione UP4), il quale consiste in un capping standard per discariche di rifiuti non pericolosi;
- in assenza di analisi di caratterizzazione dei rifiuti, integrare cautelativamente il pacchetto di copertura con un telo impermeabile, realizzando sostanzialmente un capping per discariche di rifiuti pericolosi:
- solo in corrispondenza dell'area ex-Fintecna;
- oppure, tutta la discarica risultante dalla nuova perimetrazione.

Tra le alternative prospettate nello studio di fattibilità, Ilva ha ritenuto preferibile effettuare le indagini integrative volte ad accertare le caratteristiche dei rifiuti presenti nell'area ex-Fintecna
Si riepilogano di seguito le principali tappe:

- 26.11.2020 – Autorizzazione GIP per l'esecuzione di indagini integrative;
- 20.2.2021 – Ilva ha informato ARPA Puglia della programmazione delle attività, con avvio sondaggi previsto per il 1.3.2021;
- 25.2.2021 – ARPA Puglia ha chiesto che le attività fossero sospese e che Ilva trasmettesse preventivamente alcuni documenti ed informazioni per espressione di parere;
- 1.3.2021 – Ilva ha trasmesso i documenti richiesti;
- 5.5.2021 – Il MiTE ha trasmesso a Ilva il parere di ARPA e ISPRA;
- 25.5.2021 – Ilva ha trasmesso le proprie osservazioni, evidenziando che il parere era stato espresso in termini di piano di caratterizzazione, mentre le attività in esame non hanno né la tipologia né le finalità di un piano di caratterizzazione, il quale è stato peraltro presentato da Ilva ad aprile 2021 per le relative valutazioni. Ilva ha pertanto proposto una modalità per accogliere le prescrizioni pertinenti alla caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna, rimandando quelle attinenti al piano di caratterizzazione al relativo procedimento;
- 1.7.2021 – Il MiTE trasmette riscontro alla nota di Ilva in data 25.5.2021, chiedendo di dare avvio alle attività e di fornire relativo cronoprogramma;
- 20.7.2021 – Il MiTE ha precisato che eventuali chiarimenti avrebbero dovuto essere richiesti agli Enti estensori dei pareri;
- 23.7.2021 – Ilva ha trasmesso il Piano Operativo ad ARPA ed ISPRA con relativo cronoprogramma, ricordando le differenti finalità tra la caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna e le indagini di caratterizzazione delle matrici ambientali, demandate ad un altro procedimento amministrativo;
- 29.7.2021 – ARPA Puglia ha espresso il proprio nulla osta e ha comunicato la propria presenza per le verifiche in campo
- 29-30-31.7.2021 – sono stati eseguiti i sondaggi;
- 28.10.2021 – è stato emesso il report di fine lavori della caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna dal quale si evince che tutti i campioni sono classificabili come non pericolosi, in accordo con la classificazione storica della discarica.

Tenuto conto che nel rilascio del parere tecnico relativo alle indagini ambientali, finalizzate al campionamento e l'analisi dei rifiuti, eseguite in corrispondenza della sola area Ex Fintecna, ARPA Puglia ed ISPRA hanno richiesto dei "*chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno portato ad escludere dal presente piano di indagini la porzione che si trova subito a ovest dell'area (quella delimitata dalla linea celeste nella figura 2.1)*" (cit.), Ilva ha ritenuto di dover verificare

analiticamente anche la porzione indicata da ISPRA ed ARPA, ossia l'area posta a ovest dell'area ex Fintecna.
Pertanto, preliminarmente alla progettazione della messa in sicurezza permanente ("**MISP**"), saranno eseguite ulteriori indagini con le medesime modalità e set analitico condiviso con la PP.AA. nell'area adiacente.
Attualmente è in corso di affidamento la progettazione definitiva della variante al progetto di MISP, con estensione del capping a tutto il nuovo perimetro della discarica Nord-Ovest. Il report di fine lavori relativo all'ordine 694/20 (indagini ambientali) è stato trasmesso a MITE, ARPA, ISPRA ed Autorità Giudiziaria, oltre ad essere stata depositato in Procura.
Parallelamente alle indagini integrative per verificare la natura dei rifiuti nell'area ex-Fintecna, Ilva ha presentato il Piano di Caratterizzazione ex art. 242, 245 e 252 d.lgs. 152/06 agli Enti competenti. Il piano è relativo all'area complessiva Discarica Nord-Ovest, Colline Leucaspide e vecchie vasche 1-8 (ordine 640 del 02.10.2020).
Di seguito i principali passaggi:

- 12.4.2021 – trasmissione del Piano di Caratterizzazione agli Enti competenti;
- 5.5.2021 – Il MiTE ha proposto alla Regione Puglia di avviare un'istruttoria condivisa, poiché parte dell'area ricade all'esterno del SIN;
- 10.9.2021 - Il MiTE ha trasmesso le osservazioni di ARPA Puglia, chiedendo ad Ilva di integrare quanto indicato e sollecitando un riscontro da parte della Regione Puglia circa la condivisione dell'iter amministrativo;
- 20.1.2022 – Ilva ha trasmesso le integrazioni/osservazioni, in riscontro alla richiesta del MiTE.
- 28.2.2022 – trasmissione di una nota alla Regione Puglia con richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi per le aree non ricadenti nel SIN Taranto, in applicazione del procedimento *ex* art. 252 D.Lgs. n. 152/2006;
- 08.3.2022 – la Regione Puglia ha trasmesso il prorio nulla osta per la convocazione di una Conferenza di Servizi, in applicazione del procedimento *ex* art 252 D.Lgs. n. 152/2006.

L'attività dovrà essere terminata entro sei mesi dalla data di emissione del Decreto di approvazione.
Inoltre, la ex-prescrizione UP4 include il monitoraggio della falda da avviare contestualmente all'intervento di MISP.
Nelle more dell'avvio di tale intervento, Ilva ha proseguito il monitoraggio annuale, già in precedenza effettuato in attuazione del PMC 2016 dell'AIA, sebbene non sia più soggetto obbligato.
Tale monitoraggio in autocontrollo è stato eseguito congiuntamente all'area delle Colline e vecchie vasche. Fino al 2019, il monitoraggio è stato effettuato adottando il set analitico definito nell'ambito del PMC.
Dal monitoraggio 2020, è stato adottato il set di monitoraggio prescritto da ARPA Puglia nell'ambito delle osservazioni al "Piano Onofrio". Una sintesi dei risultati, comprensiva degli anni pregressi, è stata trasmessa agli Enti competenti ed alla Procura di Taranto a giugno 2021.
Nel 2020, il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito dell'ordine affidato per l'esecuzione delle indagini del cd. "Piano Onofrio".
Con nota prot. 74210 del 28/10/2021 Arpa Puglia ha validato i risultati analitici relativi alle acque sotterranee della campagna di monitoraggio. Nella stessa nota l'Agenzia ha richiesto di eseguire le future campagne di monitoraggio della falda in contraddittorio in un periodo di scarsa alimentazione dell'acquifero (agosto-settembre).
Il monitoraggio riferito all'anno 2021 è stato eseguito nel periodo 20-30.12.2021 in contraddittorio con i tecnici di Arpa Puglia.

Inoltre, relativamente ai piezometri afferenti alla discarica Nord-Ovest, essendo attrezzati con pompe fisse, la presenza di tali attrezzature precludeva la possibilità di misurare la soggiacenza della falda.
Per risolvere la problematica, Ilva a gennaio 2021 ha fatto installare, per ciascun piezometro, un tubo guida che consenta di inserire il sondino piezometrico. Tale operazione ha richiesto l'estrazione delle pompe con gru ed il successivo riallestimento delle stesse.
A seguito dell'estrazione delle pompe, due di esse hanno mostrato segni di deterioramento. Dopo verifiche da parte di ditta specializzata, è emersa la necessità di sostituire una delle due pompe mentre l'altra è stata ripristinata tramite pulizia e manutenzione.
Su richiesta di ARPA Puglia, sono state effettuate le videoispezioni dei pozzi relativi alle pompe che avevano mostrato i segni di deterioramento.
Dalle videoispezioni, è emerso che il piezometro 6/90/I/FP è parzialmente intasato nella parte terminale, apparentemente per attrezzature (cavi o altro) caduti nel pozzo durante attività precedenti, in merito alle quali non si hanno informazioni.
Conseguentemente, Ilva ha emesso una specifica tecnica, ed affidato un ordine supplementare, per la terebrazione di un nuovo pozzo in adiacenza e sostituzione di quello esistente, che non risulta avere più caratteristiche idonee al monitoraggio.
Per l'esecuzione delle attività integrative (videoispezioni, manutenzione pompe e fornitura nuova pompa), è stata emessa in data 02.02.2021 una variante all'ordine 597_2020 (EcoTrend s.r.l.).
Per la realizzazione del nuovo piezometro, è stata invece fatta una nuova gara ed emesso l'ordine 188/21 var. 1 del 09.09.2021 (Trivelsonda s.r.l.).
Prima di procedere alla realizzazione del nuovo piezometro in data 14.10.2021 è stata richiesta conferma di validità alla Provincia di Taranto in merito alle autorizzazioni, precedentemente ricevute, per l'attività di sostituzione del piezometro. Il riscontro dell'Ente è pervenuto in data 03.2.2022.
Pertanto, l'attività di realizzazione del nuovo piezometro è stata pianificata, ed attualmente è in corso di assegnazione la nomina di Direttore dei Lavori (DL) e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE).

**COLLINETTE ECOLOGICHE TAMBURI**

Le "Collinette Ecologiche" sono dei rilevati costruiti negli anni '70 tra lo stabilimento siderurgico ed il limitrofo quartiere Tamburi; esse sono costituite da n. 3 rilevati denominati, da Ovest verso Est rispettivamente Collinetta 1, Collinetta 2, Collinetta 3. Si specifica che le aree interessate sono sottoposte a sequestro preventivo da parte delle Procura della Repubblica di Taranto.
Le indagini ambientali sono state condotte secondo quanto indicato nel piano indagini ARPA.
Gli *step* degli interventi attuati sono i seguenti:

- aprile 2019 - indagini del top soil effettuate da ARPA (in attesa risultati completi ARPA);
- luglio 2019 – completate indagini del top soil da parte di ILVA (su piano ARPA);
- agosto 2019 – completato intervento per attuazione misure di precauzione - Collinetta 3
- febbraio 2020 - completata manutenzione straordinaria del verde;
- maggio 2020 – formalizzata retrocessione «Collinette ecologiche» e «Area pozzo 25»;
- luglio 2020 – completate indagini ambientali ed esiti trasmessi a Procura ed ARPA;
- aprile 2021 – ARPA ha chiesto integrazioni documentali;
- giugno 2021 – Ilva ha trasmesso le predette integrazioni;
- giugno 2021 – deposito Analisi di Rischio sanitario-ambientale presso la Procura di Taranto;
- da settembre 2021 - esecuzione manutenzione straordinaria del verde (In attesa risposta Anas per chiusura carreggiata della SS7).

Sintesi risultati indagini 2020:

- generale conformità di top soil e terreni alle CSC per aree ad uso industriale.
- diffuse non conformità ai valori di riferimento al test di cessione per i riporti.
- alcuni superamenti delle CSC in falda, con sostanziale assenza di correlazione ai parametri non conformi al test di cessione.

Sintesi risultati analisi di rischio 2021:

- assenza di rischio sanitario ed ambientale correlato ai materiali che costituiscono i rilevati;
- assenza di rischio sanitario sia per i soggetti esposti all'interno delle aree (lavoratori) sia per la popolazione residente all'esterno delle aree stesse (adulti e bambini).

Le attività in corso sono le seguenti:

- ordine n. 193 del 06.8.2021 per rimozione e potatura alberi;
- richiesta di acquisto 445 dell'8.3.2022: intervento miglioramento stato vegetativo collinette;
- ordine n. 96 del 31.3.2022: ripristino di un tubo piezometrico pianificato per la seconda decade di aprile '22; 'autorizzazione di accesso, rilasciata dalla Procura di Taranto in data 16.03.2022 e notificata dal NOE di Lecce in data 25.3.2022.
- ordine n. 190 del 3.8.2021 il campionamento e l'analisi dell'acqua di falda è pianificato per fine aprile 2022, a valle del ripristino del tubo piezometrico.

## 5.2 AREE CON INTERVENTI IN CORSO

**DISCARICA EX CAVA DUE MARI**

L'estensione dell'area è pari a circa 14 ha e il costo per l'intervento è pari a 5,05 M€.

Il progetto definitivo di copertura (capping) e sistemazione finale della discarica ex cava Due Mari è stato approvato con D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 (convertito in Legge n. 20 del 4 marzo 2015).

L'attività di intervento prevedeva la messa in sicurezza permanente (MISP) tramite i seguenti step:

- scavo e sbancamento del terreno vegetale;
- regolarizzazione e messa in opera del nuovo capping con pacchetto RNP secondo D.Lgs. 36/2003;
- copertura su argine Nord della discarica costituita da uno strato di materiale vegetale strutturato e da un rilevato in terra rinforzata integrata con stesura di tessuto sintetico geogriglia e biostuoia;
- realizzazione sistema di regimazione e captazione acque meteoriche superficiali mediante fossi di guardia e canalette in calcestruzzo prefabbricate perimetrali;
- realizzazione di una vasca di sedimentazione, trincea drenante, sistema di vasche di accumulo con captazione delle acque verso impianto di irrigazione;
- realizzazione di viabilità di accesso sommità capping e piantumazione di specie arboree.

L'intervento è stato completato.

Alla luce dell'adeguamento del sistema di copertura sono previsti dal progetto approvato una serie di monitoraggi ambientali:

- monitoraggio delle acque sotterranee da eseguirsi con frequenza semestrale;
- monitoraggio delle acque di drenaggio superficiale da effettuarsi con cadenza semestrale;
- monitoraggio morfologico con frequenza annuale nei primi tre anni e successivamente quinquennale.

Attualmente sono in corso i monitoraggi delle acque di falda e delle acque di drenaggio superficiale per i quali sono stati emessi gli ordini n. 8/22 e n. 102/22.
Il monitoraggio morfologico verrà avviato a seguito della realizzazione delle basette in calcestruzzo sulla copertura, ed entro, e non oltre, il 31.12.2022.

Per la fornitura di energia elettrica ad uso cantiere, Ilva ha predisposto l'ordine n. 504/20 ed è in attesa di riscontro da parte di e-distribuzione. La Società ha inviato numerose PEC di sollecito al Gestore.

**DISCARICA EX CAVA CEMENTIR**
Anche in quest'area, che si estende per 8,6 ha, è in corso la messa in sicurezza permanente (MISP) tramite realizzazione di capping superficiale ed il completo rifacimento del diaframma perimetrale. Il progetto per la Messa in sicurezza permanente è stato approvato con D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 (convertito in Legge n. 20 del 4 marzo 2015).
In corso di MISP, Ilva ha ritenuto opportuno, a seguito di approfondimenti effettuati in area discarica con una campagna di indagini ambientali, redigere un progetto di variante migliorativo che prevede l'adozione di un pacchetto di copertura idrologicamente equivalente a quello previsto attualmente per le discariche per rifiuti pericolosi.
La variante è stata approvata con Determina Ministeriale n. 116 del 28.3.2022 e consiste in:

- modifica del tracciato del diaframma plastico con incremento della superficie di discarica contenuta all'interno che è passata da mq 85.000 a mq 89.000 circa;
- modifica della stratigrafia del capping con adozione di geo-tessuto in HDPE;
- realizzazione del sistema di estrazione del percolato e stoccaggio in appositi serbatoi.

La realizzazione del diaframma plastico è al 55%. Il termine dell'attività è previsto per l'8.2.2023.

Il progetto prevede, inoltre, una serie di monitoraggi specifici dei quali sono attualmente in corso:

- monitoraggio delle acque sotterranee con frequenza trimestrale;
- monitoraggio del percolato con frequenza semestrale.

A questo proposito sono stati emessi gli ordini n. 9-10/22.

Dall'osservazione degli esiti delle campagne di indagine delle acque di falda si è rilevato che, già a partire dalla sessione di monitoraggio del febbraio 2006 ed anche nelle successive, sono stati rilevati superamenti delle CSC in alcuni dei piezometri monitorati.

In considerazione di questo, a partire da gennaio 2022, è stata potenziata l'attività di recupero del percolato (ordine 102/21) e sono stati attivati interventi di MISE delle acque di falda superficiali, mediante spurghi forzati periodici in corrispondenza del piezometro 51/1588/C/FS (ordine 95/22).
L'attività di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato è stata interrotta tempestivamente il 18.3.2022 a seguito di analisi aggiuntive (ordini 106/22 e 107/22), i cui risultati hanno fatto emergere la pericolosità del rifiuto per il valore del pH. Pertanto, allo stato attuale lo stesso percolato viene smaltito come rifiuto pericoloso.
Per la fornitura di energia elettrica ad uso cantiere, Ilva ha predisposto l'ordine n. 504/20 ed è in attesa di riscontro da parte di e-distribuzione. La Società ha inviato numerose PEC di sollecito.

**STOCCAGGIO FANGHI AFO FANGHI ACC E AREE LIMITROFE**
L'intero lotto ha un'estensione complessiva di circa 15.10 ha e comprende due distinte zone adiacenti, una denominata "area fanghi" (circa 7 ha), l'altra denominata "aree limitrofe" (circa

8.1 ha). L'area fanghi è attualmente adibita alla rimozione dei fanghi d'altoforno e fanghi d'acciaieria, precedentemente stoccati nell'area in deposito temporaneo, mentre le aree limitrofe non sono caratterizzate da attività.
Nell'area fanghi è prevista la rimozione di 490.000 t di cumuli di fanghi con trasporto transfrontaliero (via nave) o nazionale (via camion, intermodale o nave). Per l'attività di prelievo, trasporto e invio a recupero/smaltimento dei fanghi AFO e ACC sono in corso i seguenti ordini:

- n. 564/20 – Ecologica: 10.042 ton di fanghi AFO
- n. 111/21 – Ecologica: 7.702 ton di fanghi AFO;
- n. 114/21 – PH Facility: 19.217 ton di fanghi ACC;

L'area verrà caratterizzata al termine dell'intervento in corso. A tal proposito è già stato presentato un Piano di Caratterizzazione, ma il MiTE ha richiesto una nuova presentazione del PdC alla fine della rimozione e dello smaltimento dei fanghi.

**DISCARICA NUOVE VASCHE**
Discarica in gestione post-operativa secondo il Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con Determinazione del Dirigente n. 39 del 06.03.2008 e integrato dalle prescrizioni ISPRA (verbale 18.6.2018)
Le attività comprendono:

- manutenzione conservativa di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti elettrici di messa a terra, i presidi antincendio (estintori, idranti) che saranno soggetti alle verifiche periodiche di legge.al fine di garantirne l'efficienza;
- mantenimento dell'integrità e delle funzionalità della recinzione e dei presidi di accesso alla discarica e mantenimento dell'integrità e pulizia della viabilità interna ed esterna;
- ispezioni visive secondo le periodicità prescritte dal Piano di Sorveglianza e Controllo;
- mantenimento dell'integrità, della pulizia e della funzionalità della rete di raccolta e collettamento e stoccaggio nella vasca di accumulo delle acque meteoriche;
- mantenimento dell'integrità e della funzionalità: del sistema di estrazione della rete di raccolta, stoccaggio intermedio, collettamento e rilancio del percolato; dei pozzi a presidio delle acque sotterranee P6, P7 ed MF3; della rete di monitoraggio delle emissioni diffuse;
- prosecuzione dell'attuazione delle procedure di monitoraggio con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
    1. acque sotterranee: prelievo ed analisi, con frequenza semestrale, dai piezometri di controllo denominati P6, MF3, P7, ubicati rispettivamente il primo a monte e i restanti due a valle della discarica;
    2. percolato: controllo dei volumi e della composizione con frequenza semestrale;
    3. emissioni diffuse: campionamento ambientale delle polveri totali, con frequenza semestrale, in due punti di prelievo localizzati lungo la direttrice principale del vento a monte e a valle della discarica;
    4. fibre di amianto: prelievo con campionatori ambientali, con frequenza semestrale, per verificarne l'eventuale presenza;
    5. monitoraggio morfologico: rilievi plano-altimetrici eseguiti con frequenza annuale al fine di verificare la sussistenza di fenomeni di assestamento e/o cedimento della massa di rifiuti ed in particolare del sistema di ricopertura finale;
    6. monitoraggio meteoclimatico: allo stato attuale Ilva riceve giornalmente le osservazioni meteorologiche dall'Osservatorio «Luigi Ferraiolo» di Talsano.

La durata della gestione post-operativa è pari a 30 anni (2048).
Gli ordini relativi alle attività di monitoraggio in corso sono: n. 11/22 (acque di falda, meteoriche, percolato), n. 12/22 (polveri), n. 13/22 (fibre aerodisperse), n. 22/22 (rilievo topografico).

È infine previsto il potenziamento della rete di raccolta delle acque meteoriche per cui Ilva ha già assegnato l'ordine n. 65/22 in data 24.2.2022.

**AREA AD OVEST SP STATTE**

Il sito "Aree a verde lungo SP Statte lato ovest" ha un'estensione di circa 6.9 ha e ricade nel territorio di Comune di Statte (Sito di Interesse Nazionale di Taranto). Si tratta di un'area a verde industriale, esterna al perimetro dello stabilimento, non interessata da attività produttive. È stata sottoposta a caratterizzazione per la prima volta nel 2006 e nuovamente caratterizzata nel 2021 ai fini dello svincolo dal SIN di Taranto.

Attualmente è in elaborazione l'analisi di rischio da parte della società di consulenza esterna Engea (ordine n. 7/22 del 19. 1.2022). Secondo la destinazione urbanistica l'area ricade per la parte ovest in colonna A (Tab.1 – All.5 – Tit.V – Parte IV del D. lgs. 152/06) e per la parte est in colonna B. Engea sta predisponendo l'analisi di rischio secondo questi scenari, utilizzando come layout il format indicato nelle linee guida ISPRA.

L'area è stata oggetto di attività di rimozione di rifiuti abbandonati (ordine n. 196/21 del 06.8.2021).

Tra le attività in agenda è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale (ordine n. 672). Per questa attività la Provincia ha richiesto una polizza fideiussoria che Ilva ha predisposto in data 25.3.2022 ed ha eseguito i relativi bonifici a favore di Regione Puglia e Provincia di Taranto.

**AREA A VERDE NORD**

Il sito "Area a verde Nord" ha un'estensione di circa 26,7 ha e ricade nel territorio del Comune di Statte (Sito di Interesse Nazionale di Taranto). È un'area a verde industriale, esterna al perimetro dello stabilimento, non interessata da attività produttive. È stata sottoposta a caratterizzazione per la prima volta nel 2006 e sono attualmente in corso le indagini di caratterizzazione (ordine 90/21 del 14.4.2021) ai fini dello svincolo dal SIN di Taranto: l'attività di caratterizzazione della matrice terreno è stata completata e la Società ha ricevuto i risultati provvisori. Si è in attesa dei risultati definitivi e del report di fine lavori da parte della ditta esecutrice. Sono in corso di realizzazione due piezometri di falda profonda e, su richiesta di ARPA Puglia in verbale sottoscritto il 22.03.2022, è stato pianificato un campionamento delle acque di falda per settembre/ottobre 2022.

La predisposizione dell'analisi di rischio (ordine n. 7/22 del n. 19.1.2022) verrà curata dalla società di consulenza esterna Engea. Secondo il certificato di destinazione urbanistica l'area ricade in zona con numerosi vincoli ambientali, l'analisi di rischio sarà elaborata confrontando i limiti di riferimento normativi con la Colonna A (Tab.1 – All.5 – Tit.V – Parte IV del D.lgs 152/06).

L'area è stata oggetto di attività di rimozione di rifiuti abbandonati (ordine n. 197/21 del 06/08/2021).

**AREA LAND A**

L'area LAND A ricade nel territorio del Comune di Taranto ed ha un'estensione di circa 3,0 ha (Sito di Interesse Nazionale di Taranto). Nell'area non sono svolte attività produttive di alcun tipo e non ci sono interventi o opere in atto.

Il 27..5.2020, è stato condotto nell'area in oggetto un sopraluogo al fine di verificare preliminarmente lo stato attuale dei luoghi. In questa fase è stato possibile constatare la presenza di rifiuti di vario genere sull'intera area, con una distribuzione casuale e quindi eterogenea. L'area è stata oggetto di una prima fase di rimozione dei rifiuti abbandonati (ordine n. 249/21 con RdA n. 80/21 e 1840/21) ma dato il quantitativo cospicuo di rifiuti rinvenuti, preliminarmente non visibili a causa della fitta vegetazione, è stato necessario predisporre un'integrazione all'ordine (RdA n. 455/22). La fase di rimozione dei cumuli è in pianificazione, ma Ilva, dato il rinvenimento e la

parziale rimozione di queste grandi quantità di rifiuti, sta predisponendo per gli enti pubblici una nota con proposta di indagini integrative al Piano di Caratterizzazione, approvato dal MiTE ma non ancora avviato a causa della presenza degli stessi. A valle del completamento dell'ordine n. 249/21 potranno avere inizio le indagini di caratterizzazione (ordine 92/21 del 13.04.2021). Tenuto conto delle tempistiche necessarie per l'esecuzione della caratterizzazione, ad oggi non sarebbe possibile rispettare i termini indicati dal MiTE.
Inoltre, l'area risulta attualmente priva di recinzioni, condizione questa che ha portato il sito ad essere soggetto ad abbandono occasionale di rifiuti da parte di soggetti terzi. A conclusione delle attività di rimozione rifiuti potranno iniziare i lavori per la realizzazione della recinzione perimetrale. Per questa attività la Provincia ha richiesto una polizza fideiussoria che Ilva ha predisposto in data 25.3.2022 ed ha eseguito i relativi bonifici a favore di Regione Puglia e Provincia di Taranto.

**AREA LAND C**

Il sito "LAND C" ricade nel territorio del Comune di Taranto ed ha un'estensione di circa 1.8 ha (Sito di Interesse Nazionale di Taranto). La destinazione d'uso è "Verde Industriale". Sono allo studio scenari di riconversione di tipo produttivo (green).
Non sono presenti attività produttive con generazione di rifiuti. L'area non è mai stata utilizzata per lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti generati dal ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico. Il 27.5.2020 è stato effettuato un sopralluogo, durante il quale non è stata riscontrata la presenza di rifiuti.
È stata sottoposta a caratterizzazione per la prima volta nel 2006 e nuovamente caratterizzata tra novembre e dicembre 2021 ai fini dello svincolo dal SIN di Taranto: l'attività di caratterizzazione della matrice terreno ed acque sotterranee è stata completata e la Società ha ricevuto i risultati definitivi.
La predisposizione dell'analisi di rischio è stata assegnata alla società di consulenza esterna Engea. Secondo il certificato di destinazione urbanistica l'area ricade in ambito di scenari misti e verrà elaborato confrontando i limiti di riferimento normativi con le Colonne A-B (Tab.1 – All.5 – Tit.V – Parte IV del D.lgs 152/06) in funzione della destinazione d'uso relativa all'area di riferimento.

**AREA LAND D1**

L'area LAND D1 ricade nel territorio del Comune di Taranto ed ha un'estensione di circa 3,0 ha (Sito di Interesse Nazionale di Taranto).
Ilva sta valutando eventuali scenari di riconversione d'uso, compatibilmente con gli strumenti urbanistici in essere, comunque riferibili ad utilizzi di tipo produttivo, preferibilmente nell'ambito della green economy (energia verde, selvicoltura, etc.). È un'area a verde industriale che è stata sottoposta a caratterizzazione nel 2006. È stato redatto un Piano di Caratterizzazione nel 2020, ai fini dello svincolo dal SIN di Taranto, approvato dal MiTE a gennaio 2021.
Le indagini della caratterizzazione integrativa (ordine n. 94/2021), avviate a giugno 2021, sono state sospese in più riprese a causa dell'interferenze di sottoservizi e strutture interrate non note come il 1° Canale di Scarico dello Stabilimento di Acciaierie d'Italia che, da particolari storici ricevuti in data 18.11.2021 dal Consorzio ASI, si attesterebbe intorno ad una profondità di posa di circa 10 m da p.c.
A tal proposito, per ultimare la caratterizzazione, la Società sta predisponendo una proposta di integrazione al Piano Operativo delle indagini di caratterizzazione da sottoporre ad ARPA Puglia per approvazione.
A valle della conclusione delle indagini l'elaborazione dell'analisi di rischio è stata assegnata alla società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19.1.2022. La predisposizione avverrà secondo lo scenario previsto da certificato di destinazione d'uso.

**LAND E – EX AREA SIDERCOMIT**

L'intero lotto ricade integralmente nel territorio del Comune di Taranto ed ha un'estensione complessiva di circa 4,30 Ha (Sito di Interesse Nazionale di Taranto).

Nell'area, in conformità alla destinazione d'uso urbanistica del sito, sono sempre state svolte attività di tipo industriale. Gli stabilimenti della Sidercomit producevano e commercializzavano prodotti siderurgici nei diversi comparti dell'alluminio e dell'inox. Attualmente Ilva sta valutando eventuali scenari di riconversione del sito, con destinazioni in linea con gli strumenti urbanistici riferibili ad utilizzi di tipo industriale.

Ilva ha assegnato l'ordine n. 80/22 per le indagini di caratterizzazione alla società di consulenza esterna Engea in data 10.3.2022 e ha verificato l'ottenimento delle istanze autorizzative necessarie all'inizio dell'attività.

Inoltre, all'interno dell'area è stato rinvenuto un serbatoio e dell'amianto da rimuovere e smaltire. Anche per queste attività sono state predisposte delle richieste d'acquisto.

A valle dei risultati ottenuti dalle indagini di caratterizzazione l'eventuale 'analisi di rischio verrà predisposta dalla stessa società che eseguirà le indagini di caratterizzazione.

Intanto Ilva, in ottemperanza a quanto prescritto dal MiTE nel Decreto di approvazione del PdC n. 123 del 09.07.2021, ha richiesto i dati ambientali pregressi a ADI tramite PEC (agosto 2021, marzo 2022).

## 5.3 AREE IN MANUTENZIONE E CON PROCEDIMENTO DA DEFINIRE

**LAND L – CAVA L'AMASTUOLA**

Il sito è interessato dalla presenza di una discarica di seconda categoria degli anni 80.

A valle della definizione della destinazione d'uso e del progetto di recupero finale sarà effettuato un piano di indagini ambientali.

Ilva ha emesso l'ordine n. 3/22 per l'assegnazione dell'incarico di direttore di cava ad un professionista esterno.

Il 30.3.2022 è stato effettuato da parte della Società un sopralluogo presso l'area per valutare la presenza di rifiuti e, a seguito di quanto riscontrato, ha avviato la redazione per una specifica tecnica e richiesta d'acquisto per affidare ad un professionista lo studio di fattibilità per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nell'area della cava.

**AREA LAND D2**

L'area LAND D2 ricade nel territorio del Comune di Taranto ed ha un'estensione di circa 0,1 ha (Sito di Interesse Nazionale di Taranto).

L'area è un'area a verde industriale. Ilva sta valutando eventuali scenari di riconversione d'uso, compatibilmente con gli strumenti urbanistici in essere, comunque riferibili ad utilizzi di tipo produttivo, preferibilmente nell'ambito della green economy (energia verde, selvicoltura, etc.).

Attualmente è in elaborazione l'analisi di rischio da parte della società di consulenza esterna Engea (ordine n. 7/22 del 19.1.2022). Secondo il certificato di destinazione urbanistica l'area ricade in area a vincoli. Pertanto, l'elaborazione dell'analisi di rischio sarà predisposta confrontando i limiti di riferimento normativi con la Colonne A (Tab.1 – All.5 – Tit.V – Parte IV del D.lgs 152/06), utilizzando come layout il format indicato nelle linee guida ISPRA.

Ilva sta valutando la possibilità del restauro della chiesetta presente sull'area.

**AREA POZZO 25**

L'intero lotto in oggetto ricade nel territorio del Comune di Taranto (TA), ed ha un'estensione complessiva di circa 0.5 ha.

Il sito in oggetto, ricade in parte in area con destinazione "Zona verde di rispetto" e in parte "Zona industriale con divieto di espansione". Nella parte con destinazione industriale è presente il pozzo n. 25 con il relativo impianto di sollevamento di acqua di falda, destinato ad uso irriguo ed antincendio per le "Collinette ecologiche Tamburi". L'area non è sottoposta a sequestro. A maggio 2020 l'area ed il relativo pozzo sono stati retrocessi ad Ilva, sebbene a tale data gli impianti asserviti al pozzo non risultassero funzionanti. Ilva ha fatto eseguire il ripristino della funzionalità del pozzo e connessi impianti di sollevamento ed adduzione, compresa sezione di distribuzione presso le "Collinette ecologiche".
Il 24.3.2022 Ilva ha emesso la richiesta d'acquisto 543 per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione.
È in corso la procedura di rinnovo della concessione per l'emungimento delle acque sotterranee (richieste di pagamento n. 2356-2357-2358). Le analisi eseguite nell'ambito di questa attività hanno evidenziato una contaminazione salina per cui la Società ha provveduto ad emettere una specifica tecnica per impianto ad osmosi inversa (richiesta di acquisto n. 493 del 16.3.2022).
Inoltre, Ilva ha provveduto al pagamento dei canoni arretrati relativi agli anni 2018-2021 (richiesta di pagamento n. 2353/21).
L'azienda concessionaria, per consentire un efficace monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche sotterranee regionali, è obbligata a comunicare alla Provincia, con cadenza semestrale il risultato delle analisi chimiche relative ai valori di NITRATI, TOC, CLORURI e SALINITÀ TOTALE. A tal proposito ha predisposto ordine n. 103/22.

## 5.4 AREE CEDIBILI E PRIVE DI PENDENZE

**LAND I – AREA A VERDE VICINO A OSPEDALE NORD**

L'area in oggetto è un'area a verde non utilizzata a scopi produttivi e lontana dalla zona industriale. Ilva ipotizza di cederla nell'attuale stato di fatto.

# 6. Gestione del personale

## 6.1 Occupazione

La forza lavoro occupata in Ilva al 31 marzo 2022 è di 1.842 dipendenti (con un decremento di 20 unità rispetto al trimestre precedente), a cui si aggiunge 1 risorsa in somministrazione – staff leasing.
Le altre società italiane facenti parte del Gruppo assegnate alla presente gestione commissariale occupano 31 dipendenti, di cui 19 di Celestri e 12 di Taranto Energia, per i quali si rimanda al corrispondente paragrafo dedicato.

## 6.2 Ammortizzatori Sociali

Per quanto concerne Ilva, come conseguenza dell'accordo del 6 settembre 2018 e alle ragioni in esso sottese, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Decreto del 14 ottobre 2021 per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria *ex* art. 7 co. 10-*ter* L. 236/93, con pagamento diretto da parte dell'INPS, in favore di un numero massimo di 1.843 dipendenti distribuiti come di seguito:

- Taranto fino a 1592 unità; Genova fino a 250 unità; Novi Ligure fino 1 unità.

L'ammontare complessivo delle ore di sospensione nel trimestre di riferimento per i suddetti siti è stato di 889.840, corrispondenti al 84,4% delle ore lavorabili.

## 6.3 Progetti Risorse Umane

**Richiami in servizio per attività di bonifica**

Anche al fine di dare esecuzione alle previsioni dell'accordo del 6 settembre 2018, in base al quale tutti i lavoratori che non avranno ricevuto una proposta assunzionale da parte di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. (già AM InvestCo Italy S.p.A.) o sue società affiliate, "*potranno essere impiegati nelle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria… nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento ambientale*…", la Società ha avviato il progetto di bonifica delle c.d. Aree Escluse.
Dopo una fase di informazione / consultazione con le competenti OO.SS. Ilva ha comunicato che, per l'esecuzione delle attività di bonifica, in ausilio alle ditte specializzate, sarebbero stati impiegati dipendenti di Ilva e Taranto Energia sospesi in CIGS, a tal fine richiamati in servizio previo superamento delle visite mediche di idoneità.
Per individuare i lavoratori da richiamare in servizio l'Azienda ha stilato una graduatoria contenente tutti i dipendenti sospesi in CIGS, ordinandoli secondo criteri "oggettivi" condivisi con le parti sociali, ovvero: maggiori carichi di famiglia ed anzianità aziendale.
Sulla base della suddetta graduatoria, nel trimestre di riferimento sono stati coinvolti circa 80 lavoratori.

## 6.4 Formazione

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

## 6.5 Dettaglio forza lavoro Gruppo Ilva

| società | forza al 31/03/2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dir | qua | imp | equ | ope | tot | int | tot gen |
| ILVA MILANO | 9 | 5 | 18 | - | - | 32 | - | 32 |
| ILVA GENOVA | - | 4 | 21 | 8 | 209 | 242 | - | 242 |
| ILVA TARANTO | 2 | 7 | 64 | 51 | 1.443 | 1.567 | 1 | 1.568 |
| ILVA MARGHERA | | | | | | | | |
| ILVA NOVI LIGURE | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| ILVA RACCONIGI | | | | | | | | |
| ILVA PATRICA | | | | | | | | |
| ILVA LEGNARO | | | | | | | | |
| ILVA C.S. PADERNO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **ILVA ITALIA** | **11** | **16** | **104** | **59** | **1.652** | **1.842** | **1** | **1.843** |
| | | | | | | | | |
| CELESTRI LECCO | - | 1 | 3 | - | 4 | 8 | - | 8 |
| CELESTRI GALLARATE | - | 1 | 5 | - | 5 | 11 | - | 11 |
| **CELESTRI S.R.L.** | - | 2 | 8 | - | 9 | 19 | - | 19 |
| **TARANTO ENERGIA S.R.L.** | - | - | 6 | - | 6 | 12 | - | 12 |
| **ILVAFORM S.P.A.** | | | | | | | | |
| **ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A.** | | | | | | | | |
| **Controllate ILVA ITALIA** | - | 2 | 14 | - | 15 | 31 | - | 31 |
| | | | | | | | | |
| **Totale GRUPPO ILVA ITALIA** | **11** | **18** | **118** | **59** | **1.667** | **1.873** | **1** | **1.874** |
| | | | | | | | | |
| **ILVA S.A.** | | | | | | | | |
| **ILVA AMERICA** | | | | | | | | |
| **SOCOVA S.A.** | | | | | | | | |
| **TILLET** | | | | | | | | |
| **STE LYONNAISE DE DEROULAGE** | | | | | | | | |
| **ILVA MAGHREB** | | | | | | | | |
| **TUNISACIER S.A.** | | | | | | | | |
| **HELLENIC STEEL** | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | | | | | | | |
| **totale GRUPPO ILVA ESTERO** | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | | | | | | | |
| **TOTALE GRUPPO ILVA** | **11** | **18** | **118** | **59** | **1.667** | **1.874** | **1** | **1.875** |

## 7.Accadimenti legali/giudiziari

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali contenziosi civili e amministrativi e dei procedimenti penali pendenti ([3]).

**Corte d'Appello di Milano R.G. 1412/19 (già R.G. 39161/2013 – Tribunale di Milano)**
**Valbruna Nederland B.V. / Ilva S.p.A. + altri - Esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Riva Fire S.p.A.**

Con comparsa di costituzione in data 27 febbraio 2015, Ilva si è costituita nel giudizio instaurato il 14 maggio 2013 da Valbruna Nederland B.V. nei confronti di Riva Fire S.p.A. e altri soggetti per il risarcimento del danno, quantificato in circa € 33 milioni, derivante dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento su Ilva.

Ilva ha chiesto la prosecuzione del giudizio a seguito dell'interruzione determinata dall'ammissione alla procedura di A.S. formulando, altresì, nei confronti di Riva Fire S.p.A. ed altri soggetti una richiesta di risarcimento danni per esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento per un importo non inferiore a circa € 484 milioni.

Preso atto dell'avvenuta ammissione di Riva Fire (ora Partecipazioni Industriali S.p.A.) alla procedura di amministrazione straordinaria, il giudizio è stato riassunto.

In data 26 giugno 2017, in conformità a quanto previsto dall'accordo transattivo concluso in data 24 maggio 2017 da Ilva S.p.A. in A.S. (anche per conto di sue controllate), Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. (già Riva Fire S.p.A. in Liquidazione, anche per conto della controllata Siderlux S.à.r.l.) e taluni membri della famiglia Riva (e società loro riferibili), Ilva S.p.A. in A.S. ha notificato a Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. e ai Sig.ri Riva dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.

---

([3]) Per non appesantire la lettura della presente relazione, sono stati eliminati i riferimenti ai seguenti giudizi, trattati nelle precedenti relazioni trimestrali, in quanto gli stessi risultano definiti: *(i)* Giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza di Ilva S.p.A. promossi rispettivamente da Riva Fire S.p.A. + altri e da Marilli e Scarnera (Tribunale di Milano – R.G. 14312/2015 e 15145/2015); *(ii)* Giudizi di annullamento del decreto del MISE del 21.1.2015 di ammissione di Ilva alla procedura di A.S. e dei decreti del MISE del 20.2.2015 di ammissione alla procedura di A.S. delle società controllate (Tar Lazio – R.G. 4047/2015 e 4049/2015); *(iii)* Adriano Riva - Annullamento del decreto del MEF del 2.4.2015 di autorizzazione all'emissione obbligazionaria (Tar Lazio – R.G. 6733/2015); *(iv)* Riva F.I.R.E. S.p.A. in liquidazione / MISE - Ministero della Salute - Ministero dell'Ambiente - Ilva S.p.A. - Commissario Straordinario - Impugnazione del primo commissariamento ex D.L. 61/2013 e del piano (Consiglio di Stato – R.G. 10724/2015); *(v)* Ilva - Azione risarcitoria nei confronti di Riva Fire per l'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento (Tribunale di Milano - R.G. 21262/2017 (già R.G. 47998/2016); *(vi)* Annullamento del decreto del MISE del 4.1.2016 di autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva (Tar Lazio – R.G. 1543/2016); *(vii)* Annullamento della nota del MISE del 4.4.2016 di diniego di accesso al "Programma dei Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347" e alla "Relazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 347/2003 sulle cause di insolvenza di Ilva S.p.A. in A.S." (Tar Lazio – R.G. 5161/2016); *(viii)* – R.G. 54953/2019 AM InvestCo Italy S.p.A. (+ altri) / ILVA S.p.A. in a.s. (+ altri) – Recesso dal Contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda del 28 giugno 2017. ; *(ix)* TRIBUNALE DI MILANO – R.G. 12334/2020 CODACONS / ILVA S.p.A. in a.s. (+ altri) / AM InvestCo Italy S.p.A. (+ altri) – Reclamo avverso l'Ordinanza del 6.3.2020; *(x)* 7681/14 R.G.N.R. Procura Taranto - infortunio mortale Angelo Iodice del 4.9.14; *(xi)* TAR LAZIO – R.G. 9857/2015 Valbruna Nederland B.V. - Annullamento del decreto del MISE del 21.1.2015 di ammissione di Ilva alla procedura di A.S; *(xii)* Proc. n. 6586/13 R.G.N.R. Procura Taranto – sequestro vasche e rifiuti del 18 dicembre 2015;*(xiii)* TAR Puglia – R.G. 397/2020 - Consiglio di Stato – R.G. 1482/2021 Declaratoria di nullità/annullamento, previe misure cautelari ex art. 55 c.p.a., dell'ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, avente a oggetto: "Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività" e della comunicazione del Sindaco di Taranto del 29 marzo 2020, avente a oggetto "Ordinanza sindacale n. 15 del 27 febbraio 2020 - Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente di sospensione delle attività" e degli atti a questi presupposti.

All'udienza del 12 settembre 2017 il Giudice ha dichiarato l'estinzione della causa nei confronti di Ilva. Il giudizio è, pertanto, definito nei rapporti tra Ilva e Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., mentre prosegue tra le restanti parti, e quindi anche tra Valbruna e Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. ([4]).

Con sentenza n. 1958/2019 del 27 febbraio 2019, il Tribunale di Milano ha: rigettato la richiesta di chiamata in causa di Riva Forni Elettrici S.p.A.; dichiarato improcedibile la domanda attorea di accertamento contro Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S.; rigettato la domanda attorea contro tutti i convenuti, assorbita in tale pronuncia la domanda dei convenuti nei confronti del terzo chiamato.

La società Valbruna Nederland B.V. ha depositato atto di citazione in appello presso la Corte di Appello di Milano in data 8 aprile 2019. L'udienza è stata fissata per il 25 settembre 2019 e, successivamente, rinviata d'ufficio al 20 novembre 2019.

In seguito ad una serie di rinvii, all'udienza del 15 gennaio 2020, la Corte d'Appello ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la valutazione circa la funzionalità e coerenza del contratto di servizio oggetto del giudizio, nonché la congruità del corrispettivo economico previsto[5].

Depositata la relazione tecnica dal CTU in data 1° giugno 2021, alla successiva udienza del 16 giugno 2021 la Corte di Appello di Milano ha concesso *(i)* a tutte le parti appellate termine sino al 31 luglio 2021 per il deposito di una nota contenente critiche all'elaborato tecnico del CTU e *(ii)* all'appellante Valbruna Nederland B.V. termine sino al 30 settembre 2021 per deposito di una breve memoria di replica alle predette note. La Corte, inoltre, ha aggiornato la causa all'udienza del 20 ottobre 2021, all'esito della quale la causa è stata ulteriormente rinviata al 16 febbraio 2022 per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni, con provvedimento in data 16 febbraio 2022, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

---

([4]) Si intende quindi con l'occasione precisare l'affermazione contenuta nella precedente relazione, laddove si era parlato di giudizio "chiuso in relazione alla posizione di Ilva".

Con ordinanza del 8 ottobre 2018 il Giudice ha revocato il precedente provvedimento e ha fissato l'udienza al 13 novembre 2018 per la precisazione delle conclusioni e per il prosieguo del giudizio anche nei confronti di Ilva. All'udienza di novembre la causa è stata trattenuta in decisione.

([5]) È stata fissata per il giorno 10 giugno 2020 l'udienza per il conferimento dell'incarico al C.T.U. nominato, dott. Giuseppe Perretta. Nel corso di detta udienza il CTU, dott. Perretta, ha prestato giuramento e la Corte ha disposto l'inizio delle operazioni peritali per il 30 giugno 2020, fissando termine al 31 gennaio 2021 per il deposito dell'elaborato peritale definitivo.

A seguito della rinuncia all'incarico da parte dei consulenti tecnici di Valbruna Nederland B. V., il CTU ha formulato in data 29 giugno 2020 istanza di differimento delle operazioni peritali.

In accoglimento a tale istanza, la Corte di Appello ha differito l'inizio delle operazioni peritali al 2 settembre 2020 e il termine per il deposito della perizia definitiva al 31 marzo 2021, fissando per la prosecuzione della causa l'udienza del 14 aprile 2021.

Il 3 settembre 2020 sono state concluse le fasi iniziali dell'apertura della CTU tramite una riunione condotta dal CTU dott. Perretta.

Il CTU ha assegnato agli altri CTP i seguenti termini:

- sino al 16 ottobre 2020 per la redazione di una prima memoria riassuntiva;
- sino al 30 ottobre 2020 per una replica.

Successivamente il CTU si è impegnato a redigere la bozza dell'elaborato peritale entro il 1° febbraio 2021 assegnando termine ai CTP sino al 28 febbraio 2021 per formulare le loro osservazioni.

La Corte d'Appello, con provvedimento del 13 gennaio 2021, ha fissato un nuovo termine per il deposito della relazione definitiva al 31 maggio 2021, originariamente previsto per il 31 marzo 2021, autorizzando il CTU alla fissazione di nuovi termini intermedi in favore dei consulenti di parti e rinviando la causa all'udienza del 16 giugno 2021.

**R.G. 10166/2021 Tribunale Milano - Ricorso ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.**
**Zaninelli + altri c/ ADI Holding, ADI e ILVA**

Con ricorso ex articolo 840-*sexsdecies* c.p.c. in data 16 luglio 2021, notificato in data 22 settembre 2021, taluni residenti di Taranto e di Comuni limitrofi hanno agito nei confronti di Ilva, Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ("**ADIH**") e Acciaierie d'Italia S.p.A. ("**ADI**") – quali, rispettivamente, proprietaria e affittuarie dello stabilimento siderurgico di Taranto – chiedendo al Tribunale di Milano di ordinare loro:

(i) la chiusura dell'area a caldo degli impianti di Taranto, ovvero la cessazione delle relative attività, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori in sicurezza;

(ii) in via subordinata, la chiusura delle cokerie, ovvero la cessazione delle relative attività, entro lo stesso termine;

(iii) in via ulteriormente subordinata, di fermare l'attività produttiva dell'area a caldo fino alla completa attuazione delle prescrizioni AIA recepite dal piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 e di ogni altra che successivamente dovesse essere prescritta; nonché, in ogni caso

(iv) predisporre un piano industriale che preveda l'abbattimento di non meno del 50% delle emissioni di gas ad affetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio entro il 2026, ovvero di adottare le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Con memoria di costituzione in data 18 novembre 2021, Ilva si è costituita in giudizio chiedendo al Tribunale di Milano di:

(i) in via preliminare e pregiudiziale, (a) dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, (b) l'inammissibilità delle domande avversarie e (c) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Ilva;

(ii) in via principale nel merito, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto; e

(iii) in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie.

Con memoria di costituzione in data 19 novembre 2021 anche ADIH e ADI si sono costituite in giudizio chiedendo anch'esse il rigetto integrale delle domande dei ricorrenti, sulla base di difese analoghe a quelle formulate da Ilva.

Con provvedimento in data 30 novembre 2021 il Tribunale di Milano, su istanza dei ricorrenti, ha rinviato la causa al 17 marzo 2022, con assegnazione di termine per memorie al 24 gennaio 2022 per i ricorrenti e al 28 febbraio 2022 per le resistenti.

Depositate le predette memorie, all'udienza del 17 marzo 2022 si è svolta la discussione, all'esito della quale il Tribunale si è riservato ogni decisione. Attualmente, dunque, si è in attesa dello scioglimento di tale riserva.

**TAR LAZIO R.G. 3887/2018 (già TAR PUGLIA – R.G. 1481/2017)**
**Annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13".**

In data 28 novembre 2017 è stato notificato a Ilva un ricorso dinanzi al TAR Puglia promosso dal Comune di Taranto per l'annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017

avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1 febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti ivi incluso il Decreto del MISE del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva.
In data 22 dicembre 2017 il Comune di Taranto ha notificato atto di rinuncia alla domanda cautelare.
In data 28 dicembre 2017 l'Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino ha notificato atto di intervento *ad adiuvandum*.
Ilva si è costituita in giudizio in data 4 gennaio 2018.
Rispettivamente in data 8 gennaio e 5 febbraio 2018, la Sig.ra Melle + altri e Legambiente hanno notificato alle parti costituite un atto di intervento *ad adiuvandum*.
A seguito della rinuncia alla domanda cautelare da parte del Comune, l'udienza di discussione inizialmente fissata per il 9 gennaio 2018 è stata rinviata al 6 marzo 2018 per la trattazione dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, da Ilva e da AM InvestCo Italy.
Con ordinanza del 7 marzo 2018 il TAR Puglia ha dichiarato la incompetenza territoriale a decidere il ricorso, individuando come competente il TAR Lazio, con pendenza dei termini per la riassunzione dinanzi allo stesso TAR Lazio ovvero per il regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato.
In data 5 aprile 2018 il Comune di Taranto ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Lazio.
In data 14 maggio 2018 Ilva si è costituita in giudizio.
L'udienza di discussione, sollecitata dal Comune di Taranto con istanza di prelievo depositata il 25 febbraio 2021, è stata fissata per il 23 marzo 2022.
All'udienza di discussione del 23 marzo 2022, su richiesta del Comune di Taranto, la causa è stata cancellata dal ruolo ed è stato assegnato il termine per la presentazione della fissazione di udienza al 22 aprile 2023.

**TAR LAZIO R.G. 3676/2018 (già TAR PUGLIA – R.G. 1477/2017)**
**Annullamento, previa sospensiva, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13".**
A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

**TAR PUGLIA – R.G. 1512/2017**
**Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.**
A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

**Ricorso n. affare 135/2018 - Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica-CODACONS**
**TAR Lazio – R.G. 2994/2019**

**Consiglio di Stato – R.G. 7842/2019**
**Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1° febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.**
A far data dal 31 marzo 2021 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

**Ricorso Straordinario al Presidente delle Repubblica – Lina Ambrogi Melle+20, Peacelink, Fondo Antidiossina Taranto Onlus.**
**Annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, del DPCM del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14.03.2014, a norma dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 04 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni dalla Legge 1febbraio 2016 n. 13" e degli atti presupposti.**
A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

**TRIBUNALE DI TARANTO – R.G. 938/2010**
**Procedimento penale "Ambiente Svenduto".**
Il Procedimento c.d. "Ambiente Svenduto" si è concluso in primo grado dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto.
Ilva è stata incolpata *ex* D.Lgs. n. 231/2001 per differenti ipotesi di reato a carico di figure apicali della precedente organizzazione aziendale, tra le quali anche i precedenti proprietari.
Le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato per la società si fondano su fattispecie criminose di varia natura ascritte alla famiglia Riva e ai suoi fiduciari: dall'ipotesi di associazione a delinquere tra la precedente proprietà e i suoi fiduciari, funzionale a commettere differenti ipotesi di reati contro l'ambiente, finalizzati alla massimizzazione del profitto nella gestione dello stabilimento a discapito di esigenze di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, ad ulteriori illeciti, quali ipotesi di omicidio colposo aggravate, ovvero, ancora, reati contro la pubblica amministrazione, finalizzati ad eludere i controlli in materia ambientale.
Nell'ambito delle indagini preliminari, la società era stata destinataria di un sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente *ex* artt. 321 c.p.p. e 19 del D.lgs. 231/2001; tale misura cautelare è stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione[6].

[6] Nell'ambito dell'udienza preliminare, in data 16 dicembre 2014, il GUP presso il Tribunale di Taranto ha escluso le richieste di costituzione di parte civile contro Ilva quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.
In seguito, la società è stata citata quale responsabile civile per i reati compiuti dai suoi preposti; il GUP di Taranto, in accoglimento dell'eccezioni sollevate dalla difesa di Ilva, ha escluso la società dal procedimento nella suddetta veste processuale.
Nel corso dell'udienza preliminare dell'1luglio 2015 Ilva ha depositato l'istanza di applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla quale la Procura di Taranto non ha prestato il proprio

consenso. Al termine della successiva udienza del 23 luglio 2015, il Giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, con udienza fissata per il giorno 20 ottobre 2015.
A tale udienza, stante un difetto di notifica ad uno degli imputati, vi è stato un rinvio all'udienza dell'1dicembre 2015, che non si è poi tenuta a causa dell'astensione degli avvocati penalisti.
Alla successiva udienza del 9 dicembre 2015 la Corte d'Assise ha dichiarato la nullità del Decreto del 23 luglio 2015 a seguito della violazione del diritto di difesa nei confronti di alcuni imputati e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare.
Il 23 dicembre 2015 il GUP ha emesso il nuovo avviso di fissazione dell'udienza per il giorno 5 febbraio 2016 e, in tale data, è stato fissato il calendario delle udienze in cui è stata articolata la nuova fase dell'udienza preliminare. All'esito dell'udienza del 29 febbraio 2016 il GUP ha emesso il nuovo Decreto che dispone il giudizio dinanzi alla Corte di Assise con udienza fissata per il 17 maggio 2016.
Nel corso di tale udienza e della successiva del 14 giugno 2016, sono stati depositati nuovi atti di costituzione di parte civile nei confronti di Ilva, quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, con richiesta di autorizzazione alla citazione della stessa quale responsabile civile, che è stata accolta dalla Corte d'Assise con Decreto depositato in data 15 giugno 2016.
Nel corso della successiva udienza del 18 luglio 2016 e a seguito delle eccezioni formulate dalla difesa di Ilva, la Corte di Assise ha revocato l'autorizzazione alla citazione della stessa in qualità di responsabile civile.
Durante le successive udienze celebrate nel corso dei mesi di luglio e settembre 2016 sono state sollevate dagli imputati ulteriori questioni preliminari, in merito alle quali la Corte di Assise si è riservata di decidere rinviando il processo all'udienza del 4 ottobre 2016.
Nel corso di tale udienza la Corte d'Assise, modificando l'orientamento del GUP del 16 dicembre 2014, ha ritenuto legittime le richieste di costituzione di parte civile contro Ilva quale ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001.
Durante le successive udienze del 12 e 26 ottobre 2016 sono state sollevate dalle parti ulteriori questioni preliminari e la Procura della Repubblica ha modificato il capo d'imputazione relativo agli illeciti amministrativi delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali.
In particolare, i Pubblici Ministeri hanno contestato l'attività di controllo esercitata dalla Riva Fire S.p.A. nei confronti di Ilva S.p.A. mediante l'utilizzo di contratti di cash pooling e di conto corrente di corrispondenza, l'utilizzo di contratti di assistenza tecnica e di servizi e l'impiego di personale fiduciario all'interno dello stabilimento Ilva, che rispondeva direttamente alla controllante Riva Fire S.p.A.
Inoltre, nel nuovo capo d'imputazione non è stato più indicato l'importo di € 8.100.000.000 a titolo di quantificazione dell'omessa esecuzione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente.
Nel corso dell'udienza del 6 dicembre 2016 Ilva ha depositato l'istanza di patteggiamento munita del consenso dei Pubblici Ministeri, in relazione alla quale la Corte d'Assise si è riservata di decidere alla successiva udienza fissata per il 17 gennaio 2017, successivamente rinviata al 1 marzo 2017.
In tale udienza la Corte d'Assise ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la nomina di una diversa Corte d'Assise per la valutazione della suddetta istanza di patteggiamento.
La nuova Corte d'Assise, dopo il rinvio dell'udienza del 9 giugno 2017, all'esito della celebrazione dell'udienza del 30 giugno 2017, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della sanzione e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d'Assise in diversa composizione fisica, investita del procedimento principale, con rinvio all'udienza del 12 luglio 2017.
Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione in data 13 luglio 2017.
In data 20 dicembre 2017, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso di Ilva sul piano strettamente processuale, in quanto non è stato ritenuto abnorme il provvedimento impugnato, ha comunque riconosciuto la fondatezza dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso; vizi che pertanto, come chiarito in motivazione dal giudice di legittimità, potranno essere fatti valere da Ilva con l'impugnazione della sentenza conclusiva del processo di primo grado, ove questa non applicasse le sanzioni già oggetto di istanza di applicazione della pena.
Nel corso dell'udienza del 12 luglio 2017 sono state sollevate da alcune parti processuali ulteriori eccezioni in materia di obbligo di astensione dei componenti togati della Corte di Assise, comunque rigettate.
Nel corso dell'udienza del 20 settembre 2017 è stata disposta la riunione del procedimento separato a carico di Ilva con quello originario ed è ripresa l'attività istruttoria.
Con cadenza media di tre udienze a settimana, sono state celebrate sino al 30 giugno 2019 n. 180 udienze istruttorie. Nonostante si fosse esaurita la fase istruttoria relativa alle richieste di prova della Pubblica Accusa, esame imputati e richiesta prove delle parti civili, in data 10 aprile 2019 il PM ha depositato in udienza elenco afferente attività integrativa di indagine. All'esito delle stesse, all'udienza del 15 maggio 2019 il PM ha formulato alla Corte richieste istruttorie, chiedendo di produrre documenti e integrando la lista testimoni. Con ordinanza la Corte ha assegnato termine alle parti sino all'udienza del 21 maggio 2019, al fine di articolare al meglio prova contraria in merito alle richieste di prova formulate dal PM. Ilva si è avvalsa di tale facoltà depositando lista testi a prova contraria. In seguito all'escussione dei nuovi testi indicati dal PM riprenderà l'istruttoria dibattimentale relativa alle richieste di prova delle difese. Sono state calendarizzate ulteriori 8 udienze per il mese di luglio 2019.
Ilva ha depositato la lista testi a prova contraria in data 21 maggio 2019. Successivamente è ripresa l'istruttoria dibattimentale. Sono state celebrate ulteriori udienze istruttorie di escussione dei testimoni indicati dalle difese, con cadenza di n. 3 udienze a settimana.

Nel mese di gennaio 2021 sono state celebrate n. 5 udienze; la Corte d'Assise ha respinto tutte le istanze di integrazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiarandola chiusa in data 19 gennaio 2021.
Nei mesi di febbraio e marzo 2021 sono state celebrate n. 26 udienze.
Si è conclusa la requisitoria del PM; le parti civili hanno rassegnato le proprie conclusioni; sono in corso le discussioni delle difese.
La ripresa delle attività è fissata per il 6 aprile 2021.
Tra i mesi di febbraio e maggio 2021 si sono svolte le discussioni conclusive.
All'esito del giudizio di primo grado, in data 31 maggio 2021, ILVA è stata condannata alle seguenti sanzioni amministrative da reato: 1) sanzione pecuniaria di € 4.647.000,00; 2) sanzione interdittiva di 12 mesi, sostituita con il commissariamento giudiziale ex art. 15 D. Lgs. 231/2001; 3) confisca del profitto ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 di € 2.100.000.000,00.
È stata disposta altresì, quale conseguenza della condanna delle persone fisiche imputate, la confisca dell'area a caldo, ex art. 240 c.p.
Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la motivazione è stata riservata nel termine straordinario di 180 giorni.
Il termine suddetto non è stato rispettato. Si resta in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, momento dal quale decorreranno i rituali 45 giorni per proporre impugnazione.
In data 28 marzo 2022 è stata depositata istanza di restituzione dell'Area a Caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Si resta in attesa della decisione della Corte d'Assise di Taranto.

**L'istanza di trasferimento di somme sottoposte a sequestro.**
A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

**Proc. n. 4606/15 RGNR Procura di Taranto - infortunio mortale Alessandro Morricella del 8.6.15.**
In data 8 giugno 2015, presso lo stabilimento di Taranto, si è verificato un infortunio a seguito del quale è deceduto il dipendente Alessandro Morricella.
In data 9 febbraio 2017 il Pubblico Ministero ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini nel quale risultano indagati sei dipendenti Ilva e la stessa Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per il reato di cui all'art. 589 c.p.
In data 25 settembre 2017 Ilva ha ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 27 novembre 2017, con allegata la relativa richiesta di rinvio a giudizio a carico della Società ex D.Lgs. 231/2001.
In tale udienza e in quella successiva del 9 aprile 2018 non è stata svolta alcuna attività per motivi procedurali, l'udienza successiva è stata celebrata in data 8 ottobre 2018, con esclusione delle richieste di costituzione di parte civile nei confronti di Ilva quale ente incolpato ex D. Lgs. 231/2001.
Nelle successive udienze del 4 e 13 marzo 2019 si sono svolte tutte le discussioni delle parti.

---

Nel corso del periodo marzo – giugno 2020, a causa della pandemia da Covid 19, non sono state celebrate udienza con attività istruttoria.
Nel mese di settembre 2020 sono state celebrate n. 14 udienze dibattimentali, con escussione dei consulenti tecnici delle difese.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 sono state celebrate n. 26 udienze dibattimentali.

In data 18 aprile 2019 il PM ha depositato memoria di replica. In data 8 maggio 2019, Ilva ha presentato le proprie note difensive.
Il GUP ha fissato una ulteriore udienza per replica in data 15 maggio 2019; a tale udienza ha rinviato a giudizio la Società e gli imputati, con udienza fissata al 1° ottobre 2019, presso il Tribunale Monocratico di Taranto. Infine, il GUP, con provvedimento depositato il 27 giugno 2019, ha rigettato l'istanza di definitivo dissequestro dell'impianto (Altoforno AFO 2). Ai fini della compiuta esecuzione del sequestro preventivo, la Procura di Taranto, il 9 luglio 2019 ha disposto lo spegnimento del suddetto impianto secondo il cronoprogramma da redigere a cura del Custode.
In esecuzione del provvedimento del 9 luglio 2019, il Custode, Ing. Valenzano, ha proceduto a dare avvio alle attività di spegnimento dell'Altoforno AFO 2, effettuando l'accesso presso lo Stabilimento di Taranto, dapprima in data 16 luglio 2019 e, successivamente, il 19 luglio 2019.
Il Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 31 luglio 2019, ha rigettato l'istanza di concessione della facoltà d'uso avanzata da Ilva il 23 luglio 2019. Avverso questo provvedimento, Ilva il 2 settembre 2019 ha proposto appello presso il Tribunale del Riesame di Taranto.
Nelle more, Ilva ha proposto una seconda istanza di concessione della facoltà d'uso dell'impianto, anch'essa rigettata dal Tribunale Monocratico con ordinanza in data 10 settembre 2019. Anche avverso tale ultima ordinanza, Ilva ha depositato appello in data 16 settembre 2019, dinnanzi al Tribunale del Riesame di Taranto.
In data 17 settembre 2019 il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell'appello proposto da Ilva avverso la prima ordinanza di rigetto del Tribunale in composizione monocratica, ha concesso la facoltà d'uso dell'impianto, condizionata all'adempimento delle residue prescrizioni entro il 13 dicembre 2019.
In seguito alla suddetta decisione, Ilva ha depositato in data 30 settembre 2019 dichiarazione di rinuncia all'atto d'appello Ilva proposto avverso la seconda ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Taranto.
In data 13 novembre 2019 Ilva ha documentato l'adempimento delle prescrizioni in scadenza per tale data. In data 25 novembre 2019 Ilva ha presentato istanza di proroga per la residua prescrizione C, in scadenza al 13 dicembre 2019. Con ordinanza del 12 dicembre 2019, stante il parere favorevole della Procura, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha negato la suddetta proroga rigettando la concessione della facoltà d'uso dell'impianto. In data 17 dicembre 2019 Ilva ha impugnato il provvedimento da ultimo assunto. Il 30 dicembre 2019 si è celebrata l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Taranto.
Con Ordinanza n. 151/19 (ex art. 322 bis c.p.p.) depositato in data 7 gennaio 2020, il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto da Ilva, ha concesso la facoltà d'uso dell'Altoforno 2, subordinatamente all'adempimento delle residue prescrizioni, annullando l'ordinanza del Giudice monocratico del 10 dicembre 19 ed il provvedimento connesso del 12 dicembre19.
In merito alla prosecuzione del dibattimento, l'udienza successiva si è tenuta il 15 gennaio 2020. Con ordinanza depositata il 4 febbraio 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 gennaio 2020, il Giudice ha escluso le parti civili, rigettando le eccezioni formulate in ordine alle richieste di costituzione avanzate nei confronti di Ilva. Ilva ha depositato ulteriori documenti il 18 febbraio 20, in relazione all'adempimento delle prescrizioni previste. A causa della pandemia da Covid 19 il processo è stato rinviato all'udienza del 10 novembre 2020. In data 6 agosto 2020 il Tribunale ha accolto l'istanza di proroga ai fini dell'adempimento delle prescrizioni richiesta da ILVA causa Covid, procrastinando il termine ultimo per l'adempimento al 6 marzo 2021.
In data 23 marzo 2021 è stata celebrata la prima udienza dibattimentale.
A fronte dell'adempimento delle residue prescrizioni, in data 31 marzo 2021 Ilva ha presentato istanza di restituzione definitiva dell'Altoforno 2.

Il giudice ha rigettato l'istanza di restituzione stante il mancato perfezionamento delle prescrizioni n. 5, 7.5, 7.8, concedendo un termine ulteriore al 17 settembre 2021.
Alla scadenza del termine suddetto, ILVA ha depositato documentazione comprovante l'adempimento delle residue prescrizioni.
Sono state celebrate n. 6 udienze tra il 16 giugno ed il 22 settembre 2021, nei giorni 16 e 29 giugno, 7 luglio, 7, 21 e 22 settembre 2021.
In data 21 ottobre 2021 è stato disposto il definitivo dissequestro dell'impianto, con piena restituzione del bene.
È stata celebrata un'udienza dibattimentale in data 25 novembre 2021, con conclusione dell'esame dei testi indicati dalla Pubblica Accusa; per il 12 gennaio 2022 è stato calendarizzato l'esame degli imputati.
Nelle udienze del 12 gennaio e del 24 febbraio 2022 è stato concluso l'esame degli imputati.
La prossima udienza è fissata per il 17 maggio 2022.

**Proc. n. 8836/15 R.G.N.R. Procura Lecce – sequestro Parco Loppa del 28.9.17.**

A far data dal 31 dicembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato.

**Decisione della Commissione Europea**

A far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato.


# Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

## 1. Premessa

### La struttura del Gruppo Ilva

Alla data di ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria, il Gruppo Ilva era composto, considerando società controllate e partecipate, consorzi e cooperative, da n. 27 soggetti giuridici, e precisamente, oltre ad Ilva:

- n. 7 società (Ilvaform S.p.A., S.L.D. S.A., Tillet S.a.S., Socova S.a.s., Tunisacier S.A., Ilva Maghreb S.A., Hellenic Steel S.A.) attive nella produzione e finitura di acciaio;
- n. 1 società (Taranto Energia S.r.l.) attiva nella produzione di energia;
- n. 3 società (Ilva S.A., Celestri S.r.l., Ilva America Inc.) attive nella vendita e distribuzione;
- n. 3 società (Sanac S.p.A., INNSE Cilindri S.r.l., Ilva Servizi Marittimi S.p.A.) dedicate ad attività ausiliarie (produzione di refrattari, produzione di cilindri per treni di laminazione, servizi di trasporto marittimo);
- n. 4 società (Ilva Commerciale S.r.l., Immobiliare Siderurgica S.r.l., Ilva Immobiliare S.r.l., Companhia Italo-Brasileira de Pelotização – ITABRASCO) dedicate ad altre attività diversificate;
- n. 8 consorzi, cooperative e società (tra cui: ICLIS Soc. coop., Consorzio NOVIGAS, Consorzio RIVAGAS).

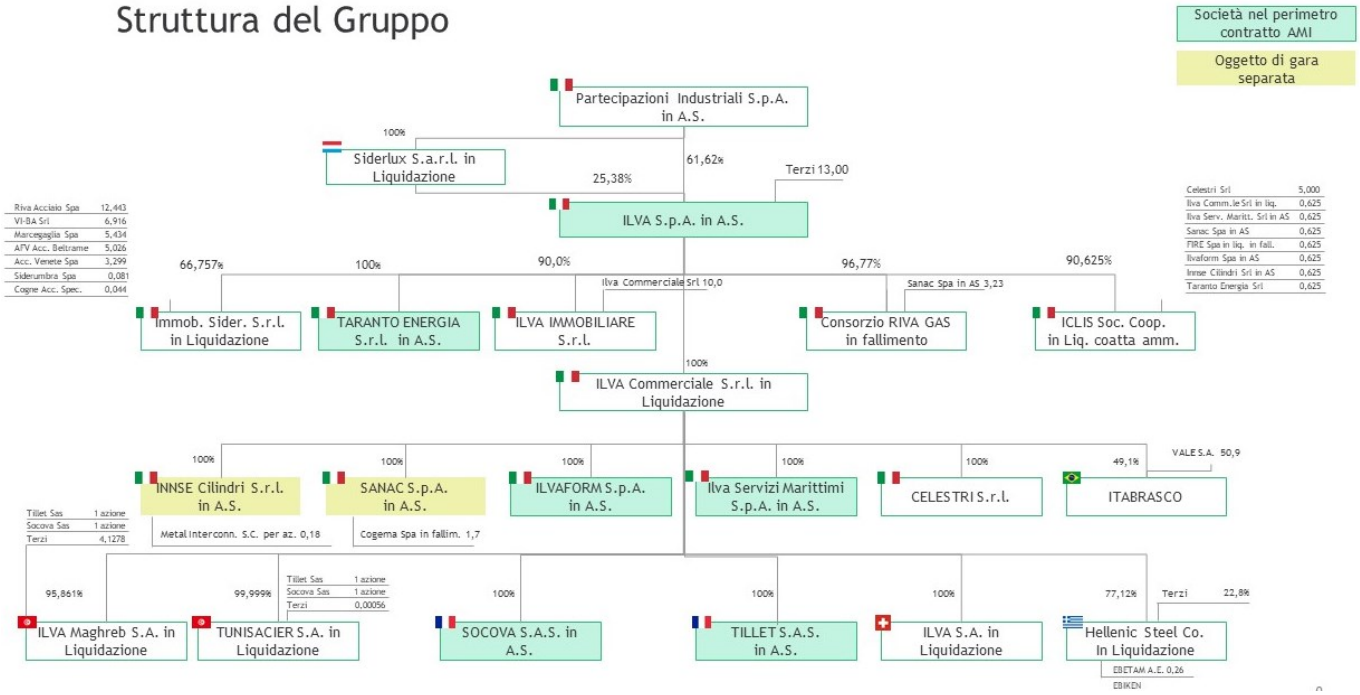

## A. Società per le quali si è proceduto con la messa in liquidazione e/o la cessazione

A far data dal 30 settembre 2021 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

## B. Società in continuità aziendale

Con riferimento alla società **Celestri S.r.l**, a far data dal 31 dicembre 2020 non vi sono aggiornamenti rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Con riferimento alla società **Companhia Italo-Brasileira de Pelotização – ITABRASCO**, a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che si intendono qui integralmente richiamate.

Con riferimento alla società **Ilva Immobiliare S.r.l.** si segnala che la società è stata cancellata dal competente Registro delle Imprese in data 20 gennaio 2022.

## 2. Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022

**(OMISSIS)**

( OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

## Ilvaform S.p.A. in A.S.

# 1. Attività della Procedura

## 1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Ilvaform a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

## 1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° gennaio 2022 – 30 marzo 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza delle società in A.S. volta a volta interessate, le seguenti questioni:

- Gruppo Ilva: 20 gennaio 2022:
    1. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 giugno 2021 e relativi allegati;
    2. Schemi Mise Ilva in AS al 30 giugno 2021;
    3. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 settembre 2021 e relativi allegati;
    4. Schemi Mise Ilva in As al 30 settembre 2021
    5. Non di competenza;
    6. Non di competenza;
    7. Non di competenza.

## 1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 31 dicembre 2020, che si intendono qui integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si segnala che per Ilvaform non vi sono contenziosi pendenti.

## 1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

# 2 Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla

procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo di Ilva (paragrafo 2, pg 12) e nelle precedenti relazioni trimestrali al 30 giugno 2021.

# Parte II - Attività corrente

## 1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Ilvaform è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle attività è passata interamente in capo all'affittuaria.

## 2.Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Ilvaform, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.). Ilvaform, pertanto, non ha dipendenti.

## 3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

# Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

## Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

## Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S.

# 1. Attività della Procedura

## 1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Ilva Servizi Marittimi S.p.A. a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

## 1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° gennaio 2022 – 30 marzo 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza delle società in A.S. volta a volta interessate, le seguenti questioni:

- Gruppo Ilva: 20 gennaio 2022:
    1. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 giugno 2021 e relativi allegati;
    2. Schemi Mise Ilva in AS al 30 giugno 2021;
    3. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 settembre 2021 e relativi allegati;
    4. Schemi Mise Ilva in As al 30 settembre 2021;
    5. Non di competenza;
    6. Non di competenza;
    7. Non di competenza.

- ISM: 20 gennaio 2022:
    1. Relazione relativa ad Ilva Sevizi Marittimi, ex art 75 d. lgs. 270/1999;
    2. Varie ed eventuali.

- ISM: 3 febbraio 2022:
    1.Relazione relativa ad Ilva Sevizi Marittimi, ex art 75 d. lgs. 270/1999;
    2. Varie ed eventuali.

## 1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 30 settembre 2019, che si intendono qui integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per Ilva Servizi Marittimi sono pendenti n. 3 ricorsi in Cassazione.

## 1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

## 2. Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo di Ilva (paragrafo 2, pg 12) e nelle precedenti relazioni trimestrali al 30 giugno 2021.

Si segnala che in data 7 marzo 2022 la Procedura ha presentato al MISE il bilancio finale con il conto della gestione, unitamente alla relazione del Comitato di Sorveglianza, ex artt. 44 e 75, D.Lgs. n. 270/1999. Si è in attesa dell'autorizzazione del MISE al deposito di detta documentazione presso la cancelleria del tribunale.

# Parte II - Attività corrente

## 1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Ilva Servizi Marittimi è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle attività è passata interamente in capo all'affittuaria.

## 2.Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Ilva Servizi Marittimi, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.). Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., pertanto, non ha dipendenti.

## 3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

## Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

### Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

## Taranto Energia S.r.l. in A.S.

# 1. Attività della Procedura

## 1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Taranto Energia, a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

## 1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° gennaio 2022 – 30 marzo 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza delle società in A.S. volta a volta interessate, le seguenti questioni:

- Gruppo Ilva: 20 gennaio 2022:
    1. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 giugno 2021 e relativi allegati;
    2. Schemi Mise Ilva in AS al 30 giugno 2021;
    3. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 settembre 2021 e relativi allegati;
    4. Schemi Mise Ilva in As al 30 settembre 2021;
    5. Non di competenza;
    6. Non di competenza;
    7. Non di competenza.

## 1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 31 marzo 2021, che si intendono qui integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per Taranto Energia sono pendenti n. 4 ricorsi in Cassazione.

## 1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

# 2. Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia

Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo di Ilva (paragrafo 2, pg 12) e nelle precedenti relazioni trimestrali al 30 giugno 2021.

# Parte II - Attività corrente

## 1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Taranto Energia è oggetto contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle attività è passata in capo all'affittuaria.

## 2. Principali azioni e misure implementate in relazione alle prescrizioni AIA

Nell'ambito delle periodiche procedure di comunicazioni dati/informazioni, ai sensi del Contratto di Affitto, l'affittuaria ha comunicato quanto sotto riportato.

Di seguito un dettaglio degli stessi.

| INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE (DAL 01 NOVEMBRE 2018 IN GESTIONE AD ARCELOR MITTAL) | | Stato attuazione | | DATI DA RAPPORTO COMMISSARI AL 31/03/2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA INTERVENTO | co prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547 - PIANO AMBIENT | Attuata | In corso | PPM CODE | Descrizione progetto | Speso al 31 Ott 2018 (€/000) | Speso dal 1° Nov 2018 al 31 Marzo 2022 (€/000) | Speso Totale al 31/03/2022 (€/000) | Speso Totale al 31/03/2022 - prescrizioni attuate durante gestione AMI-ADI (€/000) |
| TARANTO ENERGIA | AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata* | X (17/08/21) | | 131180 | 131180-322 NSD-552 ENGINEERING SERVICES FOR DE-NOX PROJECT - TARANTO ENERGIA | 0 | 205 | 205 | 205 |
| | AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata* | X (17/08/21) | | 139395 | 139395-340 NSD-563 DE-NOX @CET2 - AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 25.219 | 25.219 | 25.219 |
| | AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata* | X (17/08/21) | | 139592 | 139592-341 NSD-564 DE-NOX @CET3 - PHASE I (MOD 3) AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 2.159 | 2.159 | 2.159 |
| | AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata* | X (17/08/21) | | 144166 | 144166-432 NSD-620 DE-NOX @CET3 - PHASE II (MOD 1) AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
| | AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata* | X (17/08/21) | | 144717 | 144717-434 NSD-622 DE-NOX @CET3 - PHASE II (MOD 2) - AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 1.532 | 1.532 | 1.532 |
| | AIA TARANTO ENERGIA *Prescizione attuata* | X (17/08/21) | | 600007 | 600007 - 558 - Adeguamenti SME CET2 e CET3 - AIA TARANTO ENERGIA | 0 | 277 | 277 | 277 |
| DE-NOX TARANTO ENERGIA | | | | | | € - | € 30.421 | € 30.421 | € 30.421 |

## 3.Gestione del personale

## 3.1 Occupazione

La forza lavoro occupata in Taranto Energia al 31 marzo 2022 è di 12 dipendenti.

## 3.2 Ammortizzatori Sociali

Come conseguenza dell'accordo del 6 settembre 2018 e delle ragioni in esso sottese, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da ultimo con Decreto del 14 ottobre 2021 e sino al 31 ottobre 2022, il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10 ter L. 236/93, con pagamento diretto da parte dell'INPS, in favore di un numero massimo di 12 unità.
L'ammontare delle ore di sospensione in CIGS nel trimestre di riferimento è stato di 5186, corrispondenti al 94,6% delle ore lavorabili.

## 3.3 Progetti Risorse Umane

Anche al fine di dare esecuzione alle previsioni dell'accordo del 6 settembre 2018, in base al quale tutti i lavoratori che non avranno ricevuto una proposta assunzionale da parte di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. (già AM InvestCo Italy S.p.A.) o sue società affiliate, "*potranno essere*

*impiegati nelle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria… nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento ambientale*…", la Società ha avviato il progetto di bonifica delle c.d. Aree Escluse.
Dopo una fase di informazione / consultazione con le competenti OO.SS. Ilva ha comunicato che, per l'esecuzione delle attività di bonifica, in ausilio alle ditte specializzate, sarebbero stati impiegati dipendenti di Ilva e Taranto Energia sospesi in CIGS, a tal fine richiamati in servizio previo superamento delle visite mediche di idoneità.
Per individuare i lavoratori da richiamare in servizio l'Azienda ha stilato una graduatoria contenente tutti i dipendenti sospesi in CIGS, ordinandoli secondo criteri "oggettivi" condivisi con le parti sociali, ovvero: maggiori carichi di famiglia ed anzianità aziendale.
Nella graduatoria summenzionata sono incluse anche le risorse di Taranto Energia (che rientrano nella categoria degli impiegati) e , pertanto - a scorrimento della stessa – saranno richiamate per le bonifiche.

### 4.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

## Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

### Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

## Socova S.a.s. in A.S.

# 1. Attività della Procedura

## 1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Socova S.a.s. a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

## 1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° gennaio 2022 – 30 marzo 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza delle società in A.S. volta a volta interessate, le seguenti questioni:

- Gruppo Ilva: 20 gennaio 2022:
    1. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 giugno 2021 e relativi allegati;
    2. Schemi Mise Ilva in AS al 30 giugno 2021;
    3. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 settembre 2021 e relativi allegati;
    4. Schemi Mise Ilva in As al 30 settembre 2021;
    5. Non di competenza;
    6. Non di competenza;
    7. Non di competenza.

## 1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 30 settembre 2019, che si intendono qui integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si segnala che per Socova non sono state presentate opposizioni.

## 1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

# 2.Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento all'esecuzione del Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, secondo l'indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 2016, alla procedura competitiva espletata e alla esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia

Holding S.p.A.), si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo di Ilva (paragrafo 2, pg 12) e nelle precedenti relazioni trimestrali al 30 giugno 2021.

# Parte II - Attività corrente

## 1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Il ramo d'azienda afferente a Socova oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.), pertanto la gestione delle attività è passata interamente in capo all'affittuaria.

## 2.Gestione del personale

Il ramo d'azienda afferente a Socova, comprensivo dei dipendenti, è oggetto del contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto in data 28 giugno 2017 tra le società del gruppo Ilva e AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.). Socova, pertanto, non ha dipendenti.

## 3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

# Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

## Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

## Tillet S.a.s. in A.S.

# 1. Attività della Procedura

## 1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Tillet a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

## 1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° gennaio 2022 – 30 marzo 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza delle società in A.S. volta a volta interessate, le seguenti questioni:

- Gruppo Ilva: 20 gennaio 2022:
  1. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 giugno 2021 e relativi allegati;
  2. Schemi Mise Ilva in AS al 30 giugno 2021;
  3. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 settembre 2021 e relativi allegati;
  4. Schemi Mise Ilva in As al 30 settembre 2021;
  5. Non di competenza;
  6. Relazione ex art 75 Tillet e schemi Mise;
  7. Non di competenza.

- Tillet: 3 febbraio 2022:
  1. Relazione Tillet ex art 75 d. lgs 270/1999 e schemi Mise;
  2. Varie ed eventuali.

- Tillet: 7 marzo 2022:
  1. Relazione Tillet ex art 75 d. lgs 270/1999 e schemi Mise;
  2. Varie ed eventuali.

## 1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 30 settembre 2019, che si intendono qui integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, si segnala che per Tillet non sono state presentate opposizioni.

## 1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

## 2.Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria di Tillet, si segnala che, a seguito dell'integrale cessione dei complessi aziendali e della dichiarazione di cessazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 73 del d. lgs. 270/1999 di cui si è dato atto nella precedente relazione trimestrale, in data 14 marzo 2022 la Procedura ha presentato al MISE il bilancio finale con il conto della gestione, unitamente alla relazione del Comitato di Sorveglianza, ex artt. 44 e 75, D.Lgs. n. 270/1999. Si è in attesa dell'autorizzazione del MISE al deposito di detta documentazione presso la cancelleria del tribunale.

# Parte II – Attività corrente

## 1. Prosecuzione dell'attività d'impresa

Con riferimento alla prosecuzione dell'attività d'impresa si segnala che, con provvedimento del 22 dicembre 2021 il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa e che la procedura, con effetto dalla data del decreto, è considerata come procedura concorsuale liquidatoria.

## 2.Gestione del personale

Alla luce di quanto riportato al punto precedente, si segnala che Tillet non ha dipendenti.

## 3.Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

## Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo

### Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

## Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S.

# 1. Attività della Procedura

## 1.1 Perimetro del Gruppo Ilva: società del gruppo per cui è stata chiesta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Con riferimento alla procedura di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria della società Partecipazioni Industriali S.p.A. (già Riva Fire S.p.A. in liquidazione); a far data dal 30 settembre 2019 non vi sono aggiornamenti da segnalare, pertanto si richiama integralmente quanto riportato nell'analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999.

## 1.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° gennaio 2022 – 30 marzo 2022) il Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza delle società in A.S. volta a volta interessate, le seguenti questioni:

- Gruppo Ilva: 20 gennaio 2022:
  1. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 giugno 2021 e relativi allegati;
  2. Schemi Mise Ilva in AS al 30 giugno 2021;
  3. Relazione trim ex art 61 Ilva in AS al 30 settembre 2021 e relativi allegati;
  4. Schemi Mise Ilva in As al 30 settembre 2021;
  5. Non di competenza;
  6. Non di competenza;
  7. Non di competenza.

## 1.3 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo del Gruppo Ilva

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali *ex* art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 31 dicembre 2020, che si intendono qui integralmente richiamate.
Con riferimento ai giudizi di opposizione *ex* art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi ed eventuali ricorsi in Cassazione, per Partecipazioni Industriali sono pendenti n. 2 ricorsi in Cassazione.

## 1.4 Costi della procedura

Con riferimento ai Costi della Procedura, si richiama quanto riportato nel paragrafo "1.4 Costi della procedura" di Ilva e relativi allegati di dettaglio per società.

# 2.Aggiornamenti sul Programma

Con riferimento al programma di liquidazione di Partecipazioni Industriali non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

## Parte II - Attività corrente

### 1.Prosecuzione dell'attività d'impresa

Con riferimento alla prosecuzione dell'attività d'impresa non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

### 2. Gestione del personale

Partecipazioni Industriali non ha personale dipendente.

### 3. Accadimenti legali/giudiziari

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si precisa che, al fine velocizzare la conclusione dei contenziosi fiscali in essere, è stata presentata istanza congiunta di sollecitazione per la fissazione di udienza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

## Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 31 marzo 2022

(OMISSIS)

# Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria
