m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0088641.15-07-2022

Spett. le
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@PEC.mite.gov.it

p.c. Spett.li
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
gabinetto@pec.mise.gov.it

MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE
gabinetto.coesione@pec.governo.it

MINISTERO DELLA SALUTE
Dott. Pasqualino Rossi
p.rossi@sanita.it
Dott. Aldo Di Benedetto
a.dibenedetto@sanita.it

REGIONE PUGLIA
Ing. Paolo Francesco Garofoli
p.garofoli@regione.puglia.it
Ing. Daniela Antonella Battista
d.battista@regione.puglia.it

PREFETTURA DI TARANTO
Dott.ssa Maria Luisa Ruocco
marialuisa.ruocco@interno.it
Dott.ssa Rosa Anna Giulitto
rosaanna.giulitto@interno.it

PROVINCIA DI TARANTO
Francesco Dimichele
francesco.dimichele@provincia.ta.it

COMUNE DI TARANTO
Ing. Sabrina Imperio
s.imperio@comune.taranto.it
Ing. Anica Antonella Bertilaccio
a.bertilaccio@comune.taranto.it

COMUNE DI STATTE
Ing. Mauro De Molfetta
demolfetta@comune.statte.ta.it
Arch. Vincenzo La Gioia
vincenzo.lagioia@comune.statte.ta.it

ISPRA
Ing. Fabio Ferranti
fabio.ferranti@isprambiente.it
Dott. Francesco Astorri
francesco.astorri@isprambiente.it

ARPA PUGLIA
Ing. Vincenzo Campanaro
v.campanaro@arpa.puglia.it
Dott. Vittorio Esposito
v.esposito@arpa.puglia.it

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC
Dott. Antonio Fardelli
fardelli.antonio@mite.gov.it
Avv. David Roettgen
david.alexander.roettgen@gmail.com

Acciaierie d'Italia S.p.A.
ambiente@pec.acciaierieditalia.com
servizioprevenzione@pec.acciaierieditalia.com
adit@legalmail.it

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VA)
VA-UDG@mite.gov.it

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE (USSRI)
USSRI-UDG@mite.gov.it

CAPO DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL MINISTRO
segreteria.tecnica@mite.gov.it

CAPO DI GABINETTO
Cons. Roberto Cerreto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

CAPO DIPARTIMENTO ENERGIA
DiE@pec.mite.gov.it

Taranto, 15/07/2022

Oggetto: Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S) di Taranto.

Trasmissione documento di presentazione dell'aggiornamento relativo allo stato di attuazione degli interventi in capo ad ILVA S.p.A. in A.S, di cui all'articolo 12, comma 4, del DPCM del 29/9/2017.

Rif. - MiTE prot. 83739 del 05/07/2022 Convocazione riunione per il giorno 20 luglio 2022

Spett.li Amministrazioni,
in riscontro alla richiesta riportata nella nota del MiTE prot. 83739 del 05/07/2022, si trasmette il documento di presentazione, relativo all'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi in capo ad ILVA S.p.A. in A.S, di cui all'articolo 12, comma 4, del DPCM del 29/9/2017.

Distinti saluti.

Allegati:

- Allegato 1- Presentazione sullo stato di attuazione degli interventi del Piano Ambientale delle "Aree Escluse"

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
I Commissari Straordinari

Firmato digitalmente da
FRANCESCO ARDITO
CN = FRANCESCO ARDITO
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

Dott. Francesco Ardito

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO DANOVI
CN = ALESSANDRO DANOVI
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

Prof. Alessandro Danovi

Firmato digitalmente da
ANTONIO LUPO
CN = ANTONIO LUPO
O = ILVA SPA IN AMMINIST. STRAORDINARIA
C = IT

Avv. Antonio Lupo




ILVA in A.S.

Aggiornamento Piano Ambientale Aree Escluse Osservatorio luglio 2022

Taranto, 12 luglio 2022

18 Aree Escluse dal perimetro di cessione ad AdI classificate in 4 gruppi

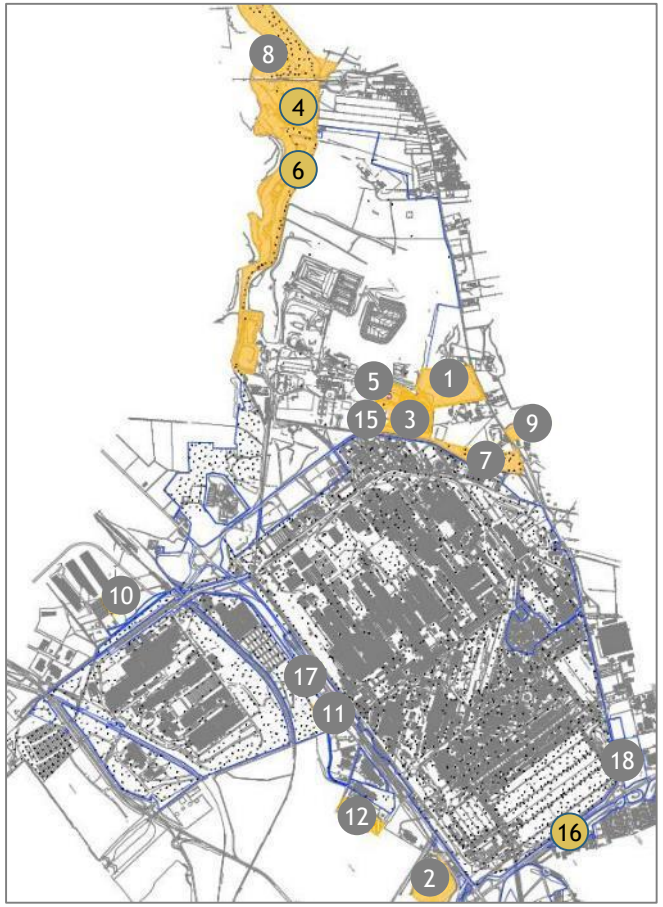

1 Discarica Ex Cava Due Mari

2 Discarica Ex Cava Cementir

3 Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC

4 Discarica NordOvest & Area Fintecna

5 Discarica Nuove Vasche

6 Gravina Leucaspide

7 Aree a verde lungo SP Statte lato ovest

8 Aree a verde NORD

9 Land A – Area a verde

10 Land C – Area a verde adiacente a stabilimento

11 Land D1 - Area a verde adiacente a stabilimento

12 Land E – Sito industriale non attivo ex Sidercomit

13 Land I – Area a verde adiacente ad Ospedale Nord

14 Land L - Cava L'Amastuola

15 Aree limitrofe stoccaggio fanghi

16 Collinette ecologiche Tamburi

17 Land D2 - Area a verde con chiesetta

18 Area Pozzo 25

Aree sottoposte a Sequestro con Interventi in corso

Aree con interventi in corso

Aree in manutenzione e con procedimento da definire

Aree cedibili e prive di pendenze

Area in Perimetro Sito Interesse Nazionale (SIN) di Taranto

Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN di Taranto

Nota: Non rappresentate aree non adiacenti allo stabilimento produttivo (Voce 13 – Land I e Voce 14 - Land L) con superficie complessiva di 128.4 ettari

Fonte: ILVA

Aggiornamento al 12.07.2022

Recap interventi in corso o pianificati (I/IV)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
1 Due Mari	UA5	Adeguamento copertura sommitale (d.lgs. 36/03) Copertura scarpata nord - Opere accessorie e impianti - Monitoraggi ex DL 1/2015 (fino al 28/08/2023)	10/01/2022	5.05	5.95 + 898 k€ vs budget	5.39 + 342 k€ vs budget	5.47 + 422 k€ vs budget	14.0	• Ricevuti Elenco elaborati progetto esecutivo e Relazione stato di avanzamento lavori da Ing. Basile • Inviata nota di tipo legale ad e-distribuzione • Richiesto PdC dal MISE per elettrodotto. Eseguito con tecnici Enel sopralluogo per analisi soluzioni.
2 Cementir	UA25	Adeguamento copertura sommitale - Rifacimento diaframma plastico perimetrale - Opere accessorie e impianti -Smaltimento percolato - Monitoraggi ex DL 1/2015 - Bonifica falda - Presentata al MITE variante di progetto con Fondo Allocato soggetto a revisione	08/02/2023	16.75	17.37 + 618 k€ vs budget	5.40	6.47	8.6	• Approvata variante di progetto il 15/02/2022 in Conferenza dei Servizi ed emesso ordine per variante di progetto • Formalizzata con Cemitaly la concessione nuove aree per esecuzione variante progetto. • Attività di smaltimento ferme per assenza di percolato. Ricerca di ulteriori punti di prelievo • Inviata nota di tipo legale ad e-distribuzione • Rinnovato noleggio gruppo elettrogeno
3 Fanghi AFO/ACC	UP3	Rimozione di circa 490.000 t fanghi AFO e fanghi ACC - Caratterizzazione ambientale - Monitoraggi falda - Bonifica suolo superficiale e ripristino ambientale	23/08/2023	75.03	69.18	7.89	9.19	7.0	• Presentato PdC. Il MiTE ha deciso di rimandare il suo esame al termine attività rimozione fanghi • Necessità di accelerare processo rimozione • Smaltimento fanghi operato da 3 società • Esteso il tempo operativo del cantiere a 2 turni al giorno • Registrato decremento dei viaggi da parte di PH Facility per ritiro fanghi dal 1/06/22
4 Nord Ovest ed Ex Area Fintecna	UP4-UP7	Copertura per superficie totale (ex UP4-UP7) - Indagini integrative - Monitoraggi ex DL 1/2015 (fino al 28/08/2023)	23/08/2023	12.00	0.10	0.03	0.05	12.9	• In corso indagini classificazione pericolosità rifiuti. • Pianificato ripristino di un piezometro di falda profonda • Emesso Ordine per aggiornamento progetto di messa in sicurezza permanente
5 Discarica Nuove Vasche	UP8	Gestione post-operativa e controlli (30 anni)	31/07/2048	3.00	1.35	0.87	0.95	3.6	• In esecuzione progetto potenziamento rete raccolta acque meteoriche • Rilievi effettuati consegnati dai sub-appaltatori all'Ing. Basile in data 29/06

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Aggiornamento al 12.07.2022

Recap interventi in corso o pianificati (II/IV)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
6 Gravina Leucaspide	-	Messa in sicurezza del rilevato (erosione)	*Da definire*	226.60	0.31	0.12	0.16	46.5	• Attività integrativa con georadar completata • Attività di indagini ambientali del piano Onofrio completate. Ricevuta documentazione finale (report e allegati) da fornitore. Inviata documentazione in data 24/05/2022 al MiTE e consegnata al GIP in data 25/05/2022 da parte dell'avv. Loreto • Indetta CdS decisoria dal MiTE in merito al PDC in data 15/07/22 • Piano indagini ambientali "Vecchie Vasche". Individuato esecutore speciale (impiego elicottero per accesso area)
		Indagini ambientali in zone con moderate difficoltà di accesso (Piano Onofrio)	28/02/2022						
		Indagini ambientali e geotecniche in zone attualmente non accessibili	31/12/2022						
		Monitoraggio in continuo del rilevato	31/12/2022						
		Eventuale intervento di bonifica/ messa in sicurezza permanente (dopo esecuzione piano delle indagini ambientali - Monitoraggio annuale falda 31/12/2022	*Da definire*						
7 Aree a verde lungo SP Statte lato ovest	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	4.88	0.17	0.09	0.13	6.9	• Analisi di rischio in corso. Ricevuta bozza da Engea. • Autorizzato inizio attività dalla Provincia • Eseguito esproprio porzione di area per metanodotto SNAM
8 Aree a verde NORD	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	18.40	0.80	0.29	0.34	26.7	• Indagini integrative di caratterizzazione in corso • A valle, esecuzione analisi di rischio
9 Land A	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	2.16	0.42	0.02	0.02	3.0	• Conclusa rimozione cumuli rifiuti • Ricevuta proposta di integrazione del PdC da parte di Engea • Sollecitata la ditta Sinnica, che ha rivendicato la necessità di rinegoziare il contratto in precedenza sottoscritto, ormai scaduto

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Aggiornamento al 12.07.2022

Recap interventi in corso o pianificati (III/IV)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
10 Land C	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale	31/12/2021 (In proroga)	1.29	0.07	0.04	0.04	1.8	• Indagini di caratterizzazione terminate • Analisi di rischio in corso. Ricevuta bozza da Engea. • Causa incendio sono andate distrutte 8 cassette su 12 dei sondaggi effettuati • Querela presentata in data 16/06
11 Land D1	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale	31/12/2021 (In proroga)	2.30	0.17	0.09	0.15	3.1	• Indagine di caratterizzazione in corso • Ritardo dovuto a definizione di 2 nuove posizioni di sondaggio, a causa di interferenza con sottoservizi del Consorzio ASI ed inerenti al canale di scarico AdI • Ricevuto riscontro da parte di ARPA sulla base del quale si pianificheranno con i fornitori gli interventi richiesti
12 Land E (Sidercomit)	-	Caratterizzazione suoli e falda, compresi controlli e prestazioni accessorie - Bonifica falda - MISP terreni (pavimentazione)	22/07/2022 (In proroga)	3.65	0.11	-	0.02	4.3	• In corso di esecuzione indagini di caratterizzazione integrativa. • Realizzazione sondaggi e piezometri terminati il 28/06 • Monitoraggio della falda pianificato con ARPA il 13/07
13 Land I	-	Gestione generale (verde, manutenzione, rifiuti, …)	23/08/2023	0.01	-	-	-	0.2	• Possibile cessione dell'area vista l'assenza di criticità ambientali.
14 Land L (cava L'Amastuola)	-	Chiusura cava - Caratterizzazione suolo, sottosuolo e falda - Ripristino ambientale	*Da definire*	3.35	<0.01	<0.01	<0.01	128.2	• In definizione Specifica Tecnica ed RdA per assegnazione incarico per studio di fattibilità discarica rifiuti non pericolosi; In fase la valutazione presenza rifiuti e loro caratteristiche

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Aggiornamento al 12.07.2022


Recap interventi in corso o pianificati (IV/IV)

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
15 Aree limitrofe a stoccaggio fanghi	-	Caratterizzazione suoli e falda, compresi controlli e prestazioni accessorie - Monitoraggi falda - Bonifica e ripristino suolo superficiale	23/08/2023	12.90	-	-	-	8.1	• Area utilizzata come base logistica per esecuzione rimozione fanghi • Nessuna attività in corso e in agenda • Al termine operazione fanghi si eseguirà PdC
16 Collinette ecologiche Tamburi (1)	-	Caratterizzazione e messa in sicurezza - Monitoraggi	*Da definire*	37.50	0.84	0.79	0.79	9.6	• In attesa autorizzazione ANAS per manutenzione verde lungo S.S.7 • In corso intervento per miglioramento stato vegetativo collinette • Eseguite indagini ambientali e analisi di rischio autorizzate da Autorità giudiziaria • Attività di AdI sulla barriera frangivento iniziate il 21/06 • Attività di campionamento dei piezometri effettuate il 21/06 e il 22/06 in contraddittorio con ARPA
17 Land D2 (chiesetta)	-	Gestione generale (verde, manutenzione, rifiuti)- Caratterizzazione suolo/sottosuolo compresi controlli e prestazioni accessorie Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo, ripristino condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	0.10	0.05	0.05	0.05	0.1	• Analisi di rischio in corso • Il 15/5/2022 svolto sopralluogo con Sovrintendenza Beni culturali • Emessa RdA per elaborazione progetto finalizzato al restauro strutturale e recupero architettonico.
18 Area Pozzo 25	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale - Ripristino impianto emungimento acqua per irrigazione «Collinette ecologiche»	09/09/2022 (In proroga)	0.39	0.15	<0.01	<0.01	0.5	• Ricevuta proroga da MiTE indagini caratterizzazione, fissata al 09/09/2022 (da Decreto) • Emesso ordine per impianto desalinizzazione per produzione di acqua a scopo irriguo.

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

5 Aree Escluse legate a Prescrizioni del DPCM 29/09/2017

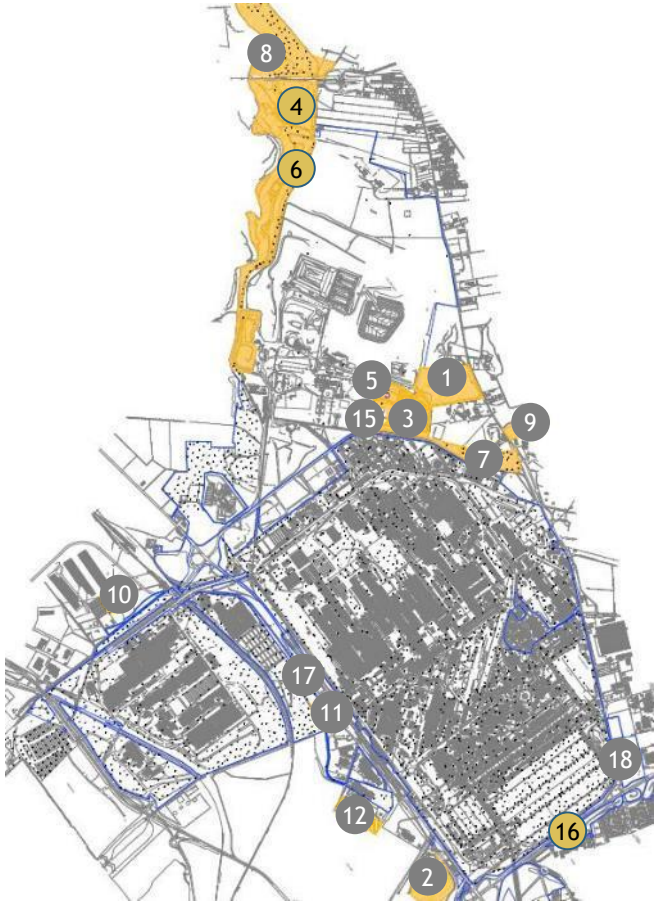

1 Discarica Ex Cava Due Mari (UA5)

2 Discarica Ex Cava Cementir (UA25)

3 Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC (UP3)

4 Discarica NordOvest & Area Fintecna (UP4 – UP7)

5 Discarica Nuove Vasche (UP8)

Aree sottoposte a Sequestro con Interventi in corso

Aree con interventi in corso

Aree in manutenzione e con procedimento da definire

Aree cedibili e prive di pendenze

Area in Perimetro Sito Interesse Nazionale (SIN) di Taranto

Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN di Taranto

Nota: Non rappresentate aree non adiacenti allo stabilimento produttivo (Voce 13 – Land I e Voce 14 - Land L) con superficie complessiva di 128.4 ettari

Fonte: ILVA

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Due Mari (I/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività completata

Caratteristiche intervento

Messa in sicurezza permanente (MISP) esplicata attraverso le seguenti fasi:

1. Scavo e sbancamento del terreno vegetale;
2. Regolarizzazione e messa in opera del nuovo capping con pacchetto RNP secondo D.Lgs. 36/03;
3. Copertura su argine Nord della discarica costituita da uno strato di materiale vegetale strutturato e da un rilevato in terra rinforzata integrata con stesura di tessuto sintetico geogriglia e biostuoia;
4. Realizzazione sistema di regimazione e captazione acque meteoriche superficiali mediante fossi di guardia e canalette in cls prefabbricate perimetrali;
5. Realizzazione di una vasca di sedimentazione, trincea drenante, sistema di vasche di accumulo con captazione delle acque verso impianto di irrigazione;
6. Realizzazione di viabilità di accesso sommità capping e piantumazione di specie arboree.

Attività 1



Sbancamento terreno vegetale

Attività 2



Stratigrafia capping

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Due Mari (II/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4


Attività completata

Attività 3



Copertura scarpata Nord

Attività 4

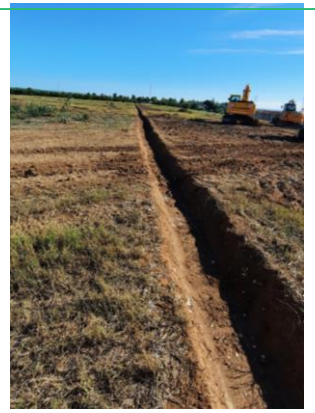

Fossi di guardia



Canalette perimetrali in cls prefabbriacato

Attività 5



Vasca di sedimentazione

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Due Mari (III/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività completata



4 vasche di accumulo attrezzate con elettropompe



Sistema di irrigazione

Attività 6



Viabilità di accesso al capping

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Due Mari (IV/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività completata

Attività eseguite o in corso

RDA 2482/21 - Monitoraggio falda 2022
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordine n.8/22 in data 20/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi. Ricevuto elaborato progetto esecutivo e Relazione stato di avanzamento lavori da Ing. Basile richiesti da ARPA (con nota prot. 27631 del 21/04/2021); Nota di risposta inviata a Studio Fraccastoro per visione, approvazione e predisposizione documento finale
- Previsione fine attività: 31/12/2022

RDA 579/22 - Monitoraggio acque meteoriche (semestrale)
- Data emissione: 29/03/2022; Emesso ordine n.102/22 in data 29/03/2022
- Note: da eseguirsi ogni 6 mesi, emesso ordine n.102/22. Ricevuto certificato collaudo vasca sedimentazione
- Attività completata il 12/04/2022

Attività in agenda

Esecuzione basette per rilievo topografico
- Note: specifica tecnica in fase di definizione (elaborata prima bozza)
- Data ultima per esecuzione attività: 21/12/2022

Criticità

- **In attesa di e-distribuzione** per la fornitura di energia elettrica per uso cantiere, ORD. 504/20. Risposta inviata, da parte dell'ente, in data 24/11/2021 tramite PEC. Inoltrata da ILVA in as ulteriore PEC di sollecito in data 23/03/2022. Ricevuta risposta il 16/04/2022. Predisposta ed inviata ulteriore nota, questa volta di carattere legale, nei riguardi del fornitore. Preparata per Area Legale e Area Acquisti, cartella con documenti di decreti di approvazione MISP della discarica ex Cementir e della discarica ex Cava Due Mari. È stato richiesto dal MITE ad e-distribuzione il Piano di Caratterizzazione ai fini dell'installazione dell'elettrodotto. Eseguito in data 06/07 sopralluogo presso Ex Cava Due Mari con tecnici di Enel.

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Due Mari (V/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4


Attività completata

Cronoprogramma intervento

Attività completata: redatta relazione di fine lavori da parte del progettista/direttore lavori

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (I/XI)

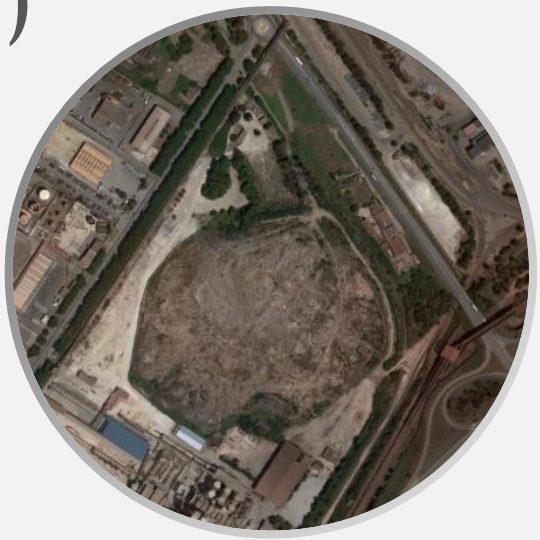

Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Caratteristiche intervento

Messa in sicurezza permanente[1] **(MISP):** messa in opera di capping RNP e sistema definitivo di estrazione percolato; Completo rifacimento del diaframma perimetrale. Monitoraggio periodico falda.
Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE): emungimento percolato da n. 4 pozzi.

Attività eseguite o in corso (I/IV)

Capping e diaframma plastico discarica ex Area Cementir (RDA 1655/19, 982/20, 1047/20, 851/21, 1861/21)

- Data emissione: 15/10/2019
- Note: Approvata variante di progetto il 15/02 in Conferenza dei Servizi, ricevuto decreto da parte del Ministero il 28/03/2022, emesso ordine per variante di progetto a favore della sociatà Riccoboni. Il 15/04/2022 emesso ordine di servizio da parte del Direttore dei Lavori, per la ripresa totale delle lavorazioni secondo variante di progetto. Formalizzata, tramite verbale, dopo sopralluogo effettuato in data 22/04/2022, la concessione delle nuove aree per la realizzazione del progetto di variante. È al 91% la realizzazione del diaframma plastico ed al 70% la posa di argilla sul *capping*. La Direzione Lavori ha autorizzato telo HDPE e materassino drenante
- Previsione fine attività: 08/02/2023


RDA 918/22 - nr. 3 indagini stratigrafiche diaframma plastico

- Data emissione: 25/05/2022
- Note: Da sopralluogo effettuato in data 24/05/2022, si è preso atto della formazione di una depressione di circa 60-70 cm dal piano campagna e della conseguente deformazione della correa ubicata sul versante ENI. Considerata la presenza della ditta Toma Abele presso il cantiere ex cava Cementir nelle nuove aree concesse da Cemitaly, è stata emessa una RDA come integrazione all'ordine per eseguire un numero massimo di 3 sondaggi geologici nella zona interessata dal problema, con il fine di acquisire ulteriori informazioni sulla stratigrafia del sottosuolo, sia per verificare la tenuta del diaframma già realizzato che per valutare se porre in essere specifiche misure per i pannelli di prossima posa. In attesa dei risultati dei sondaggi realizzati.

1. Progetto approvato con Legge 20/2015. Variante approvata con D. M. del 19.10.2018

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (I/III)

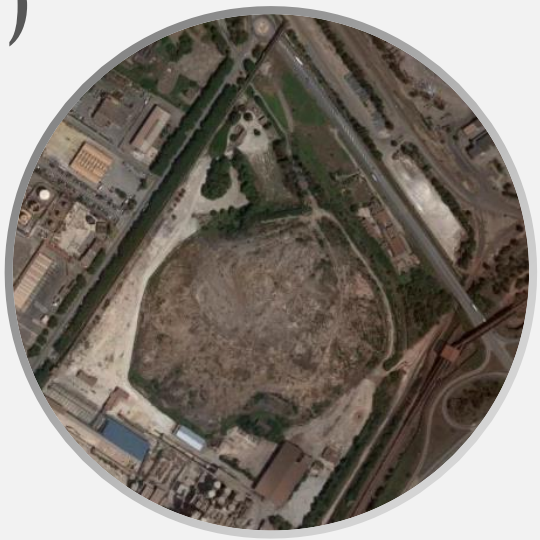


Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018


Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Planimetria di stato avanzamento del diaframma plastico come da progetto di Variante 2021

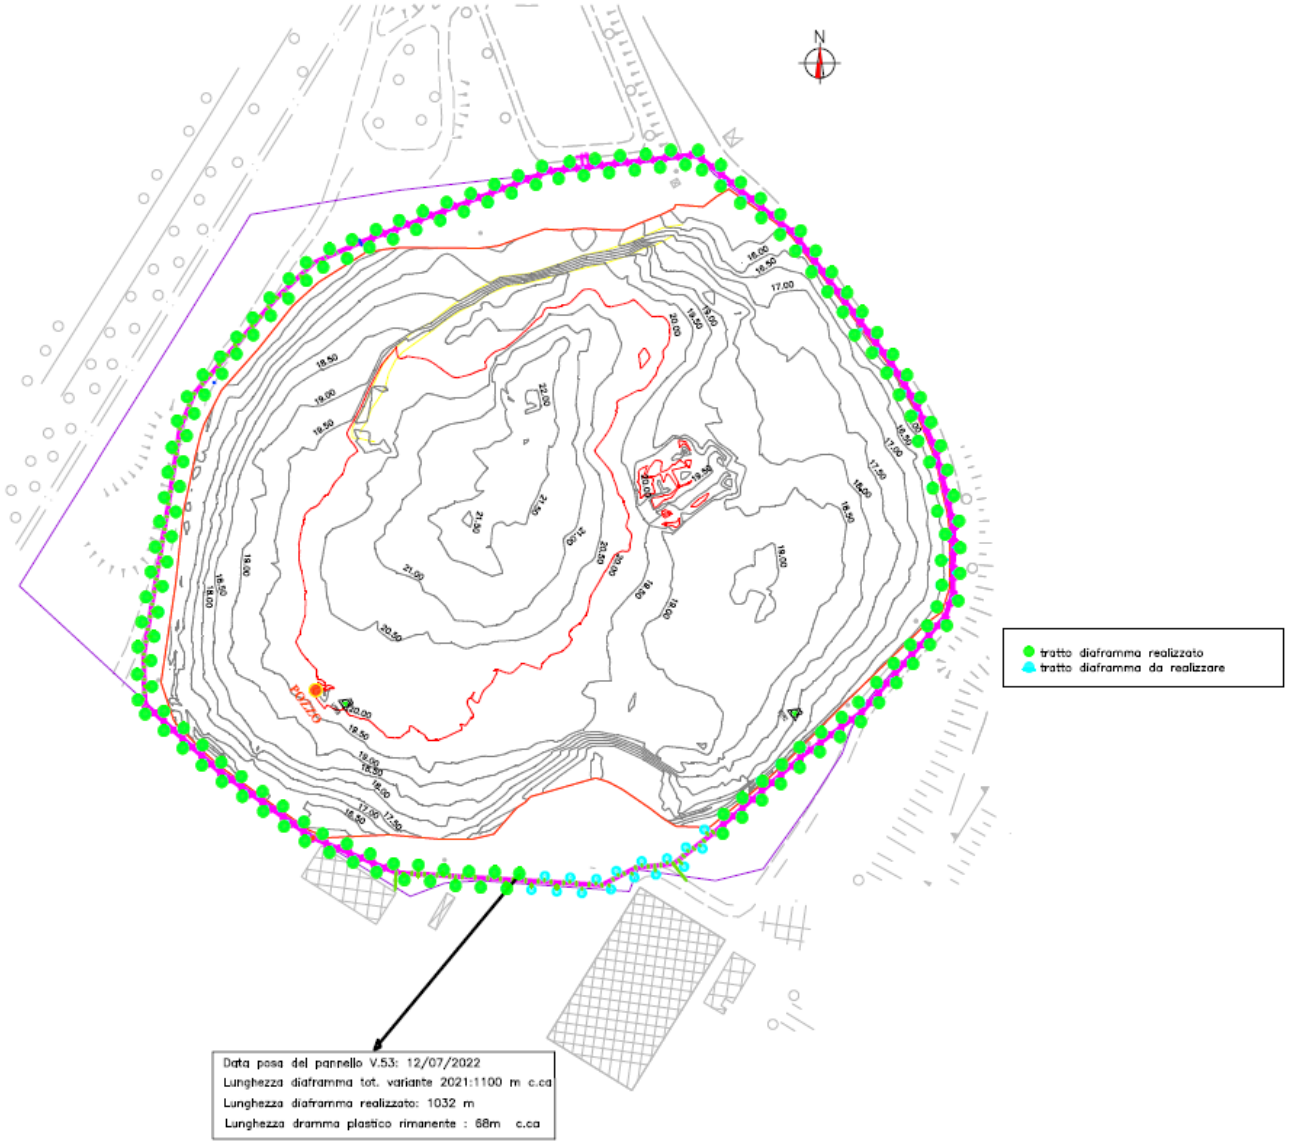

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (III/XI)

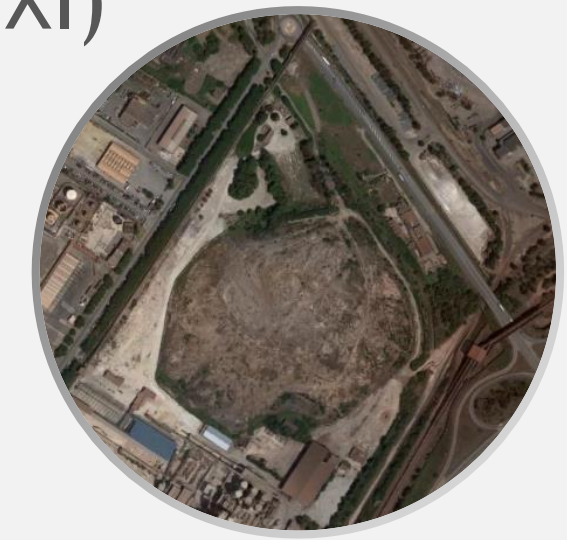


Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4


Presenti variazioni rispetto aggiornamento precedente

Planimetria di progetto con indicazione pannelli diaframma plastico - variante 2021

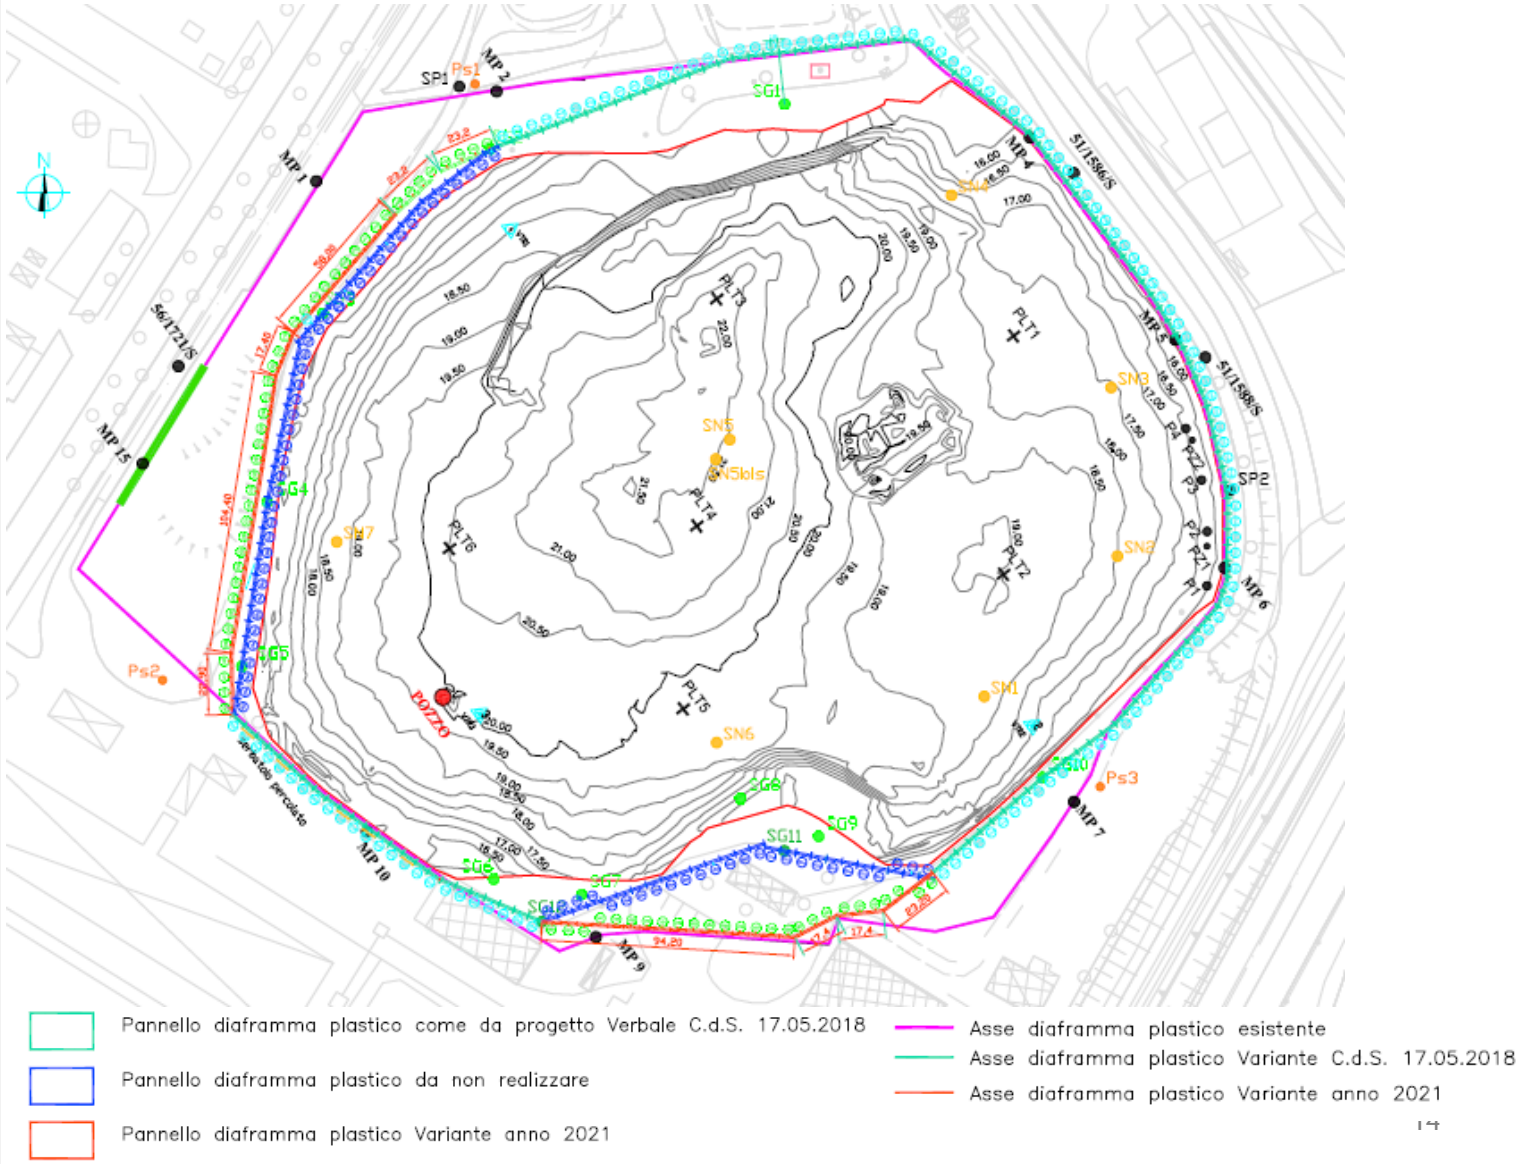

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (IV/XI)

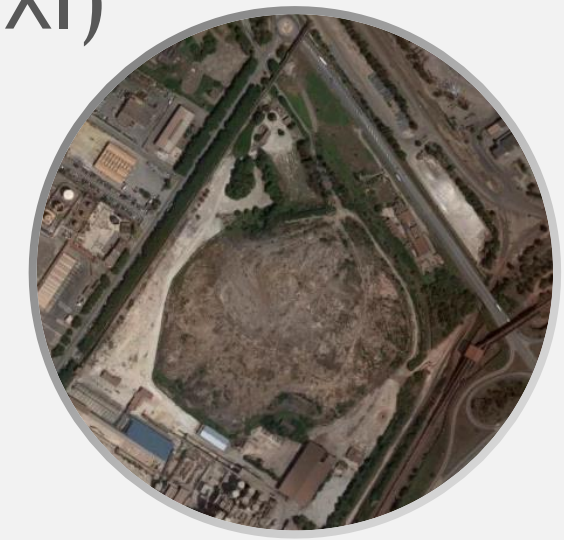

Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018


Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Presenti variazioni rispetto aggiornamento precedente

Rifacimento diaframma plastico perimetrale



Posa strato di regolarizzazione su tutta la superficie del corpo di discarica

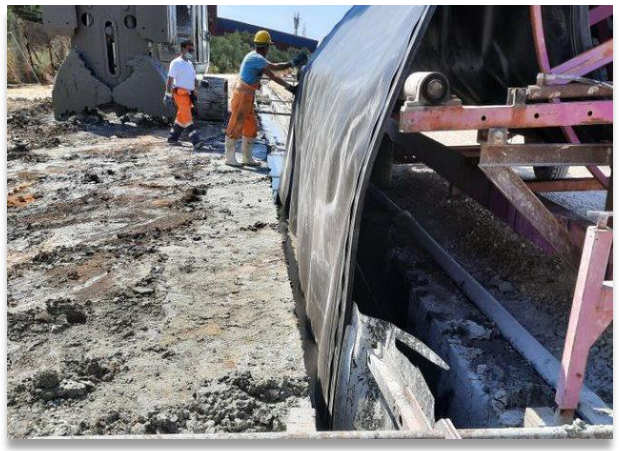


Esempio posa pannello HDPE per diaframma plastico



Canalette perimetrali in calcestruzzo prefabbricato

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (V/XI)

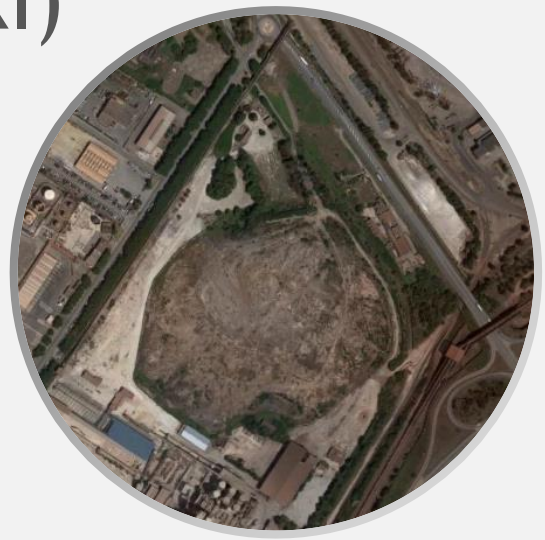


Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018


Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Planimetria di progetto Copertura Definitiva - variante 2021

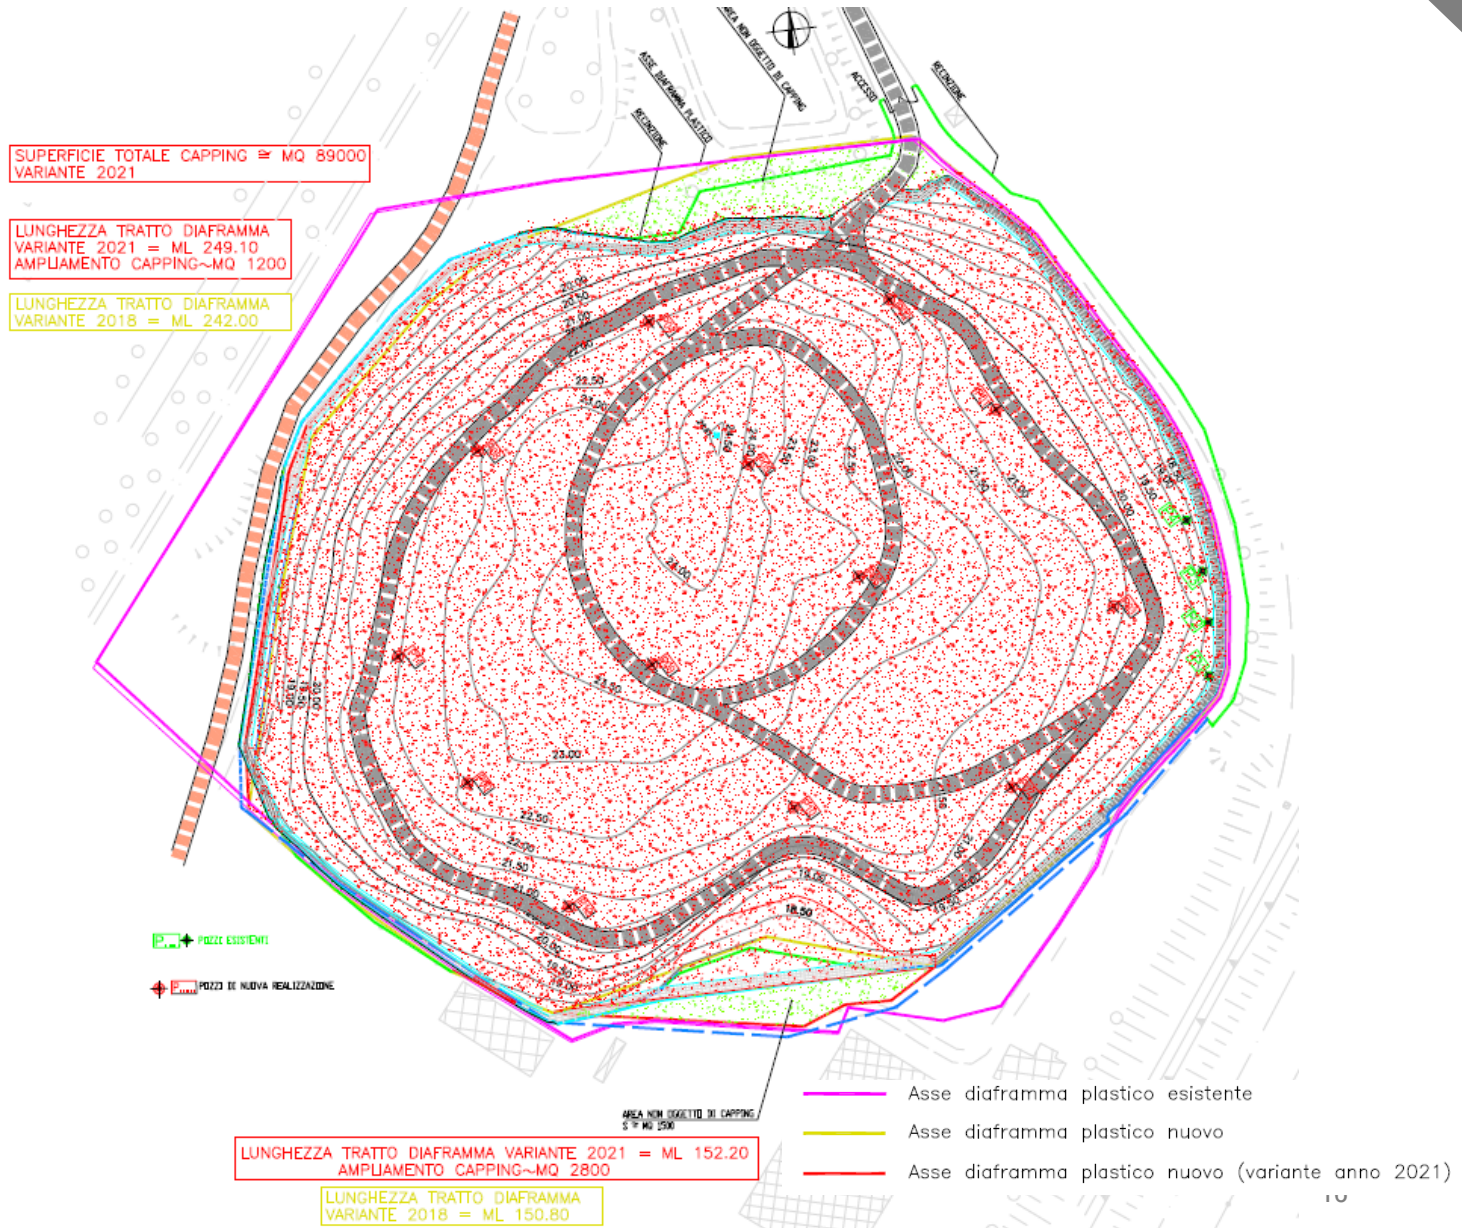

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (VI/XI)

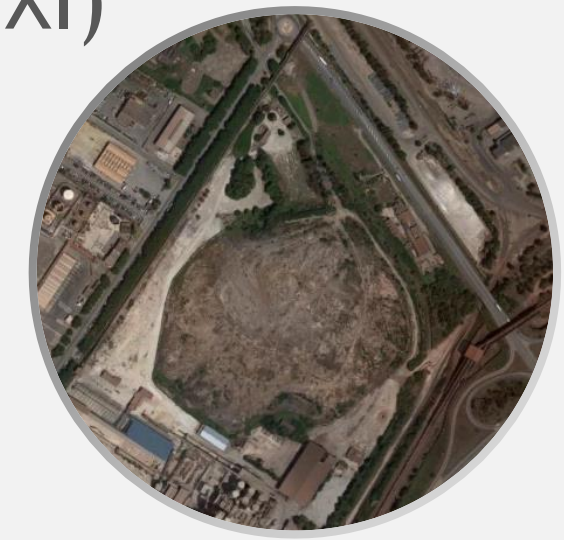


Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Presenti variazioni rispetto aggiornamento precedente

Planimetria della rete idraulica impianto di estrazione del percolato - variante 2021

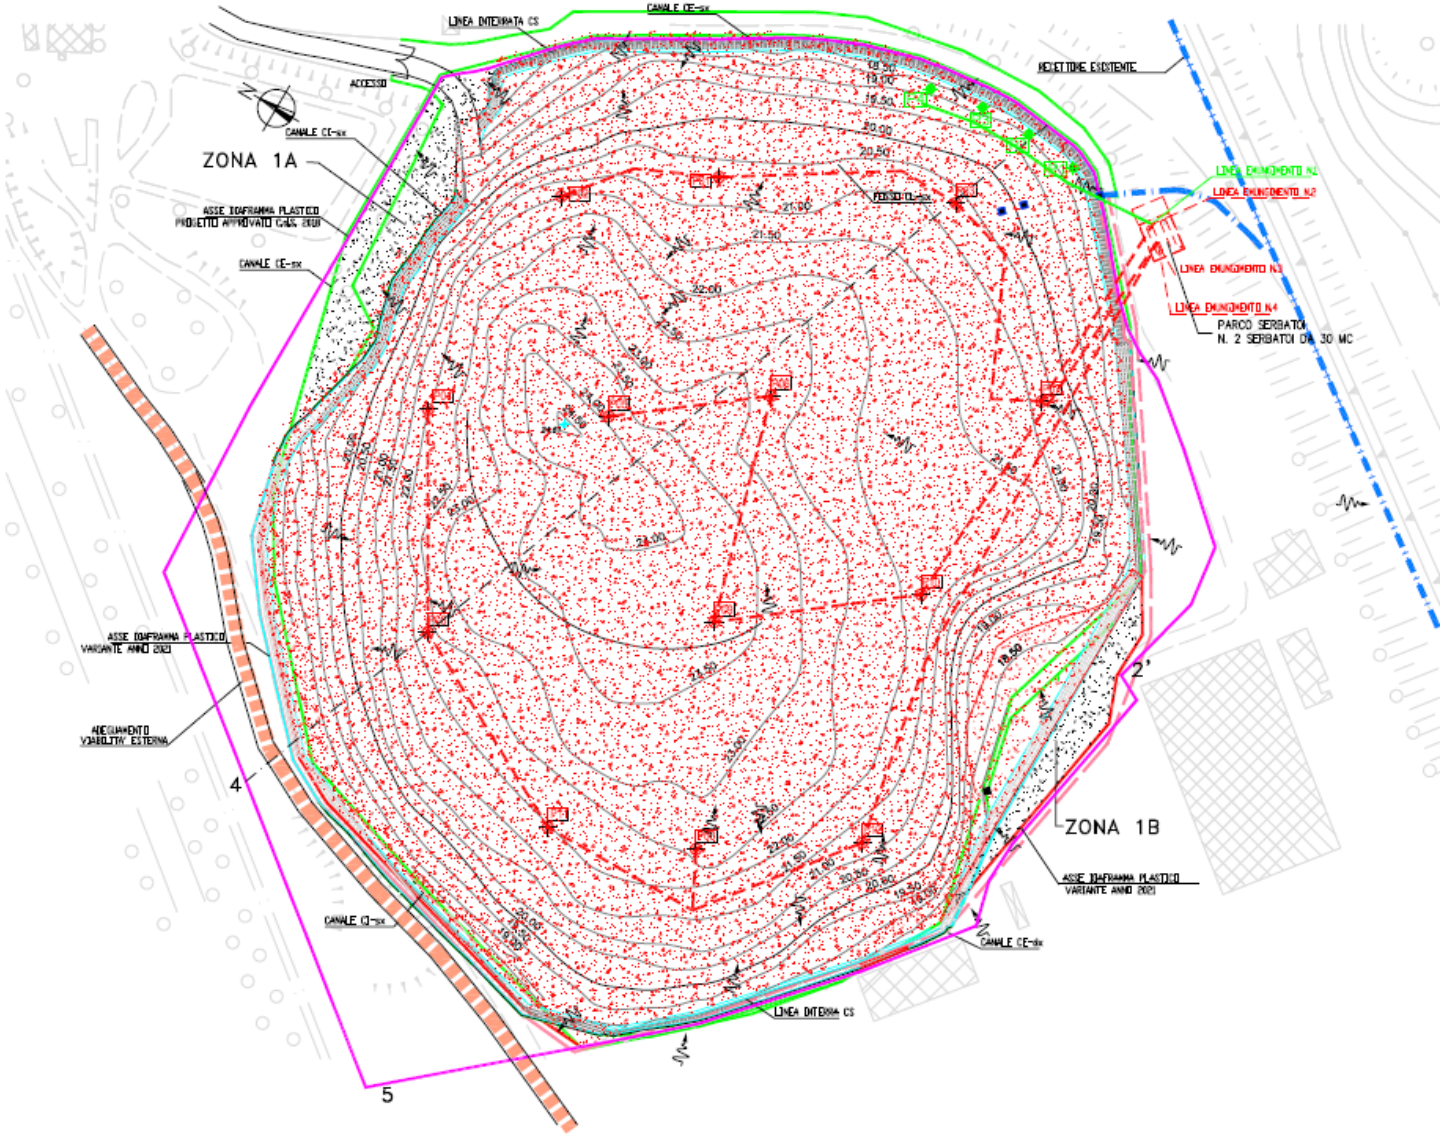

Aggiornamento al12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (VII/XI)



Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso (II/IV)

RDA 2128/21 - nr. 11 indagini stratigrafiche diaframma plastico
- Data emissione: 03/11/2021
- Attività completata in data 25/05/2022. Sono stati ricevuti i risultati delle indagini stratigrafiche dalla società Toma Abele.


RDA 537/22 e RDA 372/22 - Messa in sicurezza acqua falda ex Cementir
- Data emissione: 25/02/2022; Emesso ordine n.95/22 in data 29/03/2022
- Note: 1° intervento effettuato il 07/04/2022, 2° intervento effettuato il 13/04/2022, 3° intervento effettuato il 21/04/2022. Si valuterà la velocità di ricarica dei singoli piezometri. 4° intervento effettuato per il 28/04/2022. Ricevuta relazione Engea sui risultati raggiunti e sulle attività da eseguire successivamente con indicazione delle misure della fase 2 della MISE.
- Preparata la specifica tecnica per la fase 2 della MISE in relazione alla falda freatica. La relativa RDA è in corso di emissione.

RDA 2487/21 - Monitoraggio falda, acque meteoriche, percolato 2022
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordini n.11/22 in data 20/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi
- Previsione fine attività: 31/12/2022

1. Progetto approvato con Legge 20/2015. Variante approvata con D. M. del 19.10.2018

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (VIII/XI)

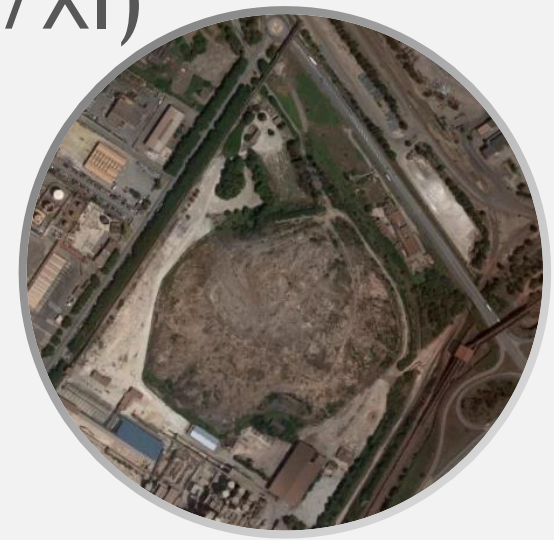

Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso (III/IV)

RDA 267/22 - Noleggio pompa sommersa e gruppo elettrogeno
- Data emissione: 15/02/2022; Emesso ordine n.102/22 Rev 1 in data 23/02/2022
- Note: L'attività non è eseguibile con l'attuale fornitore poiché è cambiato il codice CER del percolato

RDA 2483/21, RDA 2487/21 - Monitoraggio falda e Monitoraggio campionamento ed analisi percolato
- Data emissione: 16/12/2021; Emessi ordini n.9-10/22 in data 20/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 3 mesi; Ultima attività eseguita a gennaio
- Previsione fine attività: 31/12/2022

RDA 597/22 - Attività aggiuntive per variante capping
- Data emissione: 05/04/2022
- Note: Emesso ordine 703/19 variante 7 per attività aggiuntive in corso d'opera


RDA 614/22- Analisi agguntive percolato Cementir extra 1
- Data emissione: 07/04/2022; Assegnato ordine 106/22
- Note: Campionamento effettuato il 11/04/2022. Richiesta analisi in contraddittorio a 2° laboratorio per conferma valore PH che determina pericolosità percolato

RDA 633/22 - Analisi agguntive percolato Cementir extra 2
- Data emissione: 07/04/2022; Assegnato ordine 107/22
- Note: Campionamento effettuato il 11/04/2022. Richiesta analisi in contraddittorio a 2° laboratorio per conferma valore PH che determina pericolosità percolato

RDA 667/21 - ORD 102/21 - Attività di prelievo, trasporto e smaltimento percolato presso la discarica Ex Cava Cementir
- Data emissione: 20/04/2021
- Note: Consuntivo anno 2021: 9252 t. Progressivo anno 2022: 3438 t (+65 t vs monitoraggio precedente), 2 viaggi da 30 t al giorno. Ricevuti risultati che confermano la pericolosità del percolato, immediatamente è stata emessa una nuova RDA per smaltimento del percolato come rifiuto pericoloso.

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (IX/XI)

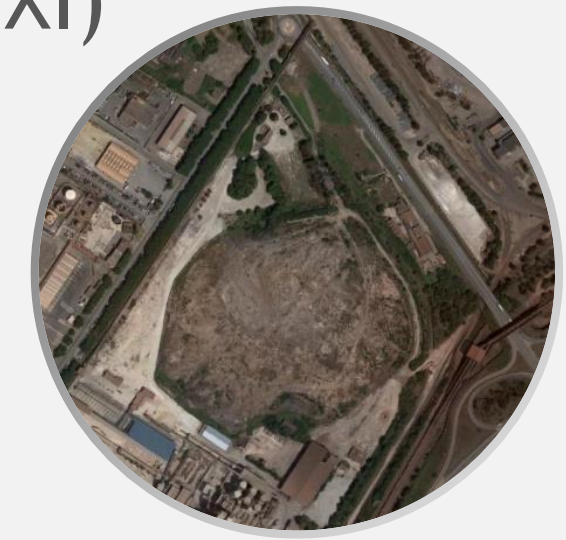

Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso (IV/IV)

RDA 635/22 – Smaltimento percolato extra per 600 ton
- Data emissione: 07/04/2022; Assegnato ordine n. 110/22
- Note: Attività di prelievo e smaltimento percolato, come rifiuto pericoloso, iniziata il 13/04/2022 con quantitativo di prelievo giornaliero pari a circa 60 ton/giorno (4 viaggi da 15 ton). Attività conclusa il 28/04/2022

RDA 720/22 – Smaltimento percolato fino a febbraio 2023
- Data emissione: 26/04/2022
- Note: Emessa ed approvata RDA per lo smaltimento percolato che coprirà il periodo maggio 2022 - febbraio 2023. Identificato ulteriore punto di emungimento in corrispondenza del pozzo P00. L'inizio dell'attività è previsto per l'18/07/22.
- Previsione fine attività: 08/02/2023


RDA 476/22 – Indagini aggiuntive analisi del percolato
- Data emissione: 25/02/2022; Emesso ordine n.90/22 in data 24/03/2022
- Note: Emessa RDA per indagini aggiuntive sulle analisi del percolato alla luce delle modifiche da apportare al progetto di variante del capping, per discarica di rifiuti pericolosi.
- Previsione fine attività: Attività completata, ricevuti risultati di analisi che attestano pericolosità percolato

RDA 831/22 – Smaltimento percolato extra per 900 ton, integrazione ordine 110/22
- Data emissione: 11/05/2022;
- Note: Inizio attività il 16/05/2022. Inizialmente sono stati programmati ed eseguiti smaltimenti di percolato per 60 ton/g, i quali sono stati successivamente riprogrammati a 30 ton/g per notevole riduzione di percolato in discarica. Attualmente non vi è presenza di percolato da emungere dai consueti punti di prelievo.

RDA 1005/22 – Rinnovo noleggio gruppo elettrogeno Riccoboni
- Data emissione: 13/06/2022; Emesso ordine n. 703/19 variante 8 il 20/06/2022
- Note: E' stato richiesto il rinnovo del noleggio del gruppo elettrogeno fino al 28/02/2023, in attesa che e-distribuzione fornisca energia elettrica.

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (X/XI)

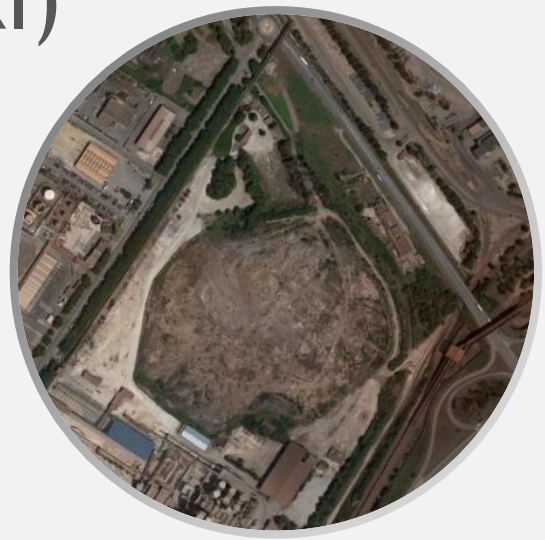

Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività in agenda


- In fase di elaborazione piano di monitoraggio come da decreto 116 per l'approvazione della variante Ex Cementir

Criticità

- **In attesa di e-distribuzione** per la fornitura di energia elettrica per uso cantiere, ORD. 577/20. Risposta è stata inviata da parte dell'ente in data 24/11/2021 tramite PEC. Inoltrata PEC di sollecito da parte di ILVA in as il 23/03/2022. Ricevuta risposta tramite PEC il 16/04/2022. Predisposta ed inviata ulteriore nota, questa volta di carattere legale, nei riguardi del fornitore. E' stato richiesto dal MITE ad e-distribuzione il Piano di Caratterizzazione ai fini dell'installazione dell'elettrodotto.

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Ex Cava Cementir (XI/XI)

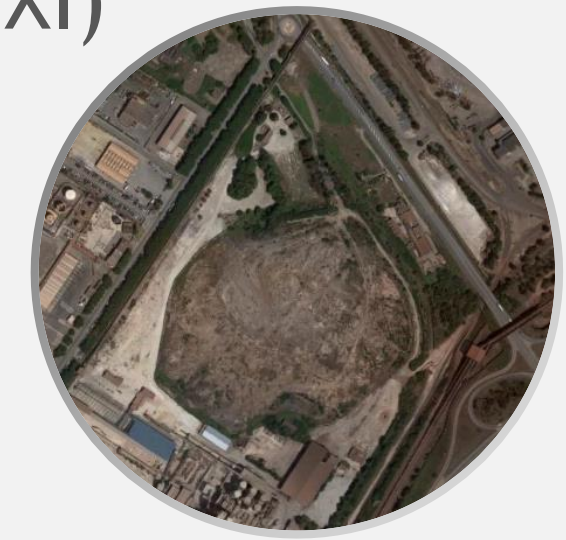


Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,6 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Cronoprogramma intervento

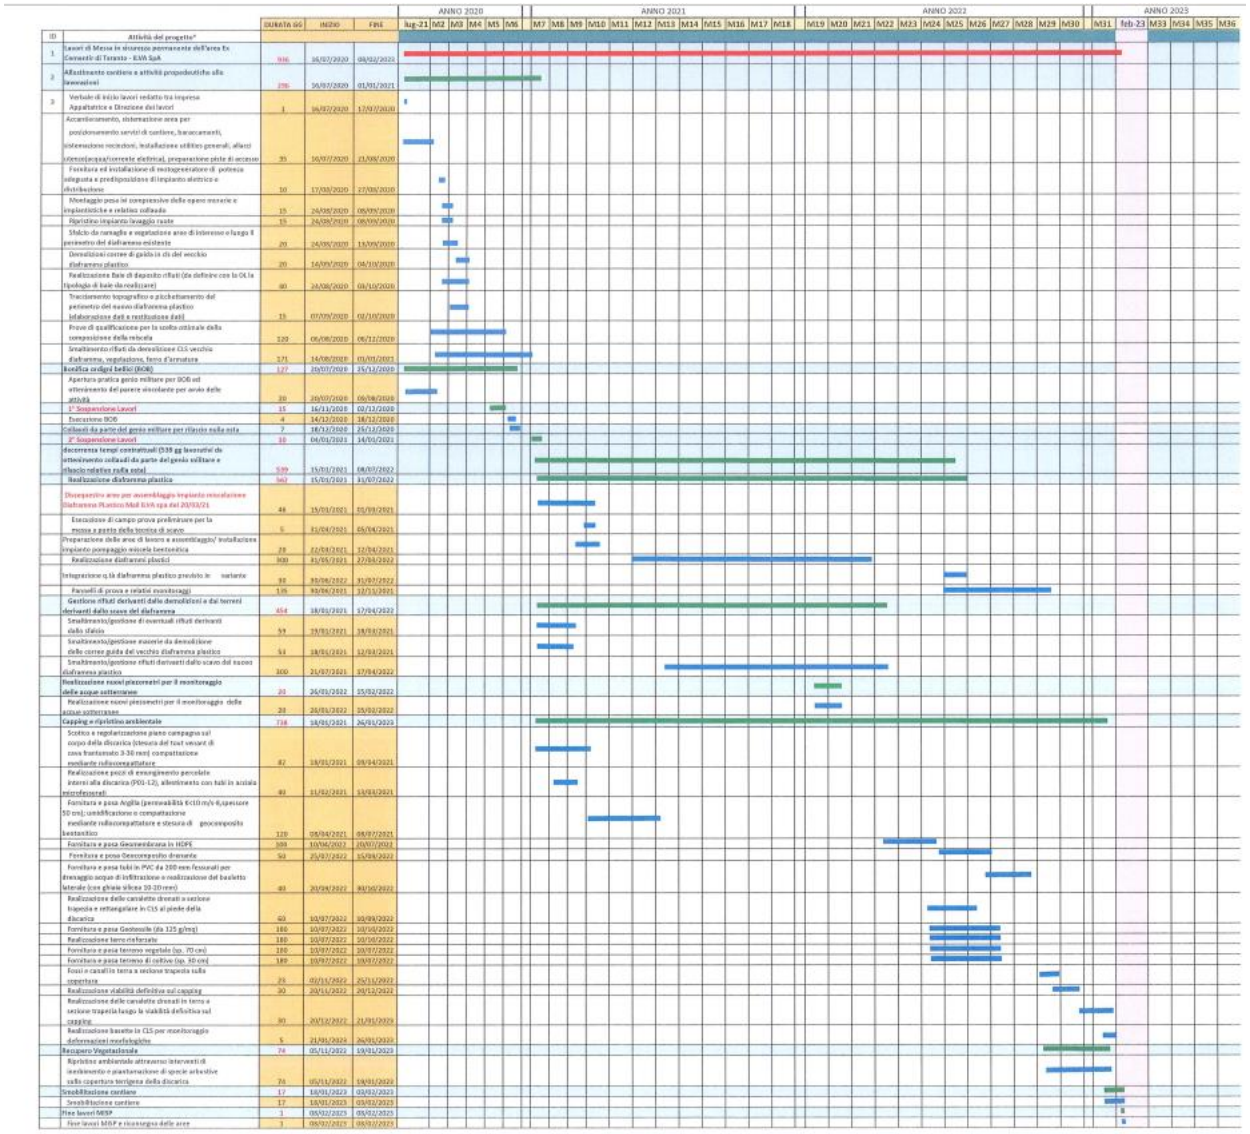

Aggiornamento al 12.07.2022

Stoccaggio fanghi AFO – Fanghi ACC (I/III)



Fondi Allocati	75,03 M€
Estensione	7,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Caratteristiche intervento

Prevista rimozione di 490.000 t[1] di cumuli fanghi con trasporto transfrontaliero (via nave) o nazionale (via camion, intermodale o nave).
Caratterizzazione area a valle della rimozione e smaltimento fanghi, notificata chiusura del procedimento da parte del MITE

Attività eseguite o in corso

RDA 1839/19, 1838/19 - Attività di prelievo, trasporto e invio a recupero / smaltimento dei fanghi AFO e ACC stoccati presso la zona 1 - Codice EER 10.02.14

- Data emissione: 25/06/2019
- Note: Ordine da completare. Attualmente sono state ritirate: 29.821 t AFO – ordini n.564/20 e n. 111/21 Ecologica, 33.964 t ACC – ordine n.114/21 PH Facility e 22.218 t ACC – ordine n.40/22 Geocycle, per un totale di fanghi evacuati pari a 86.003 t. Presentato piano di caratterizzazione (Ministero ha richiesto nuova presentazione piano a fine rimozione fanghi). Si è in attesa di inizio attività di trasporto da parte della società Eco Cis S.r.l (ordine n. 107/21 Eco Cis)
- Previsione fine attività: 30/06/2023 (AFO); 02/05/2023 (ACC)

RDA 942/22 – Richiesta campionamento ed analisi annuale ACC e AFO

- Data emissione: 30/05/2022; Emesso ordine 142/22 in data 07/06/2022
- Note: Prelevati i campioni di Fanghi AFO e ACC in data 14/06. I risultati sono pervenuti in data 22/06/22.

Aggiornamento al 12.07.2022

Stoccaggio fanghi AFO – Fanghi ACC (II/III)



Fondi Allocati	75,03 M€
Estensione	7,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività in agenda

- Considerato l'aumento significativo dei viaggi, la struttura operativa ha adottato le due seguenti misure per il superamento delle problematiche legate alla congestione del traffico dei mezzi: 1. adozione di stampante per bilicisti; 2. Incremento della forza lavoro con l'introduzione del 2° turno per il personale adibito al trasporto fanghi, a partire dal 1/06/22. Dopo incontro con CSE, si è deciso che le ditte forniranno entro il giovedì pomeriggio, i programmi di arrivo dei mezzi per la settimana successiva, indicando anche le destinazioni, in modo da programmare al meglio gli ingressi. È stato stabilito che, in presenza di nave adibita a trasporto transfrontaliero, i mezzi di Ecologica avranno l'esclusiva per l'ingresso in cantiere, in modo da completare il carico in tre giorni lavorativi. Il primo carico per trasporto transfrontaliero è stato completato nei giorni 11 e 12 luglio.
- E' in corso di valutazione la realizzazione di un deposito preliminare, che risulti funzionale alla ricollocazione dei fanghi AFO e ACC nell'ipotesi che questi ultimi non risultino ancora rimossi alla data del 23/08/2023 dall'area nella quale sono attualmente ubicati.
- A seguito dell'incremento del numero dei viaggi, sono state adottate immediatamente misure di mitigazione ambientale (bagnature strade e piste più utilizzo fog cannon) e ottimizzazione degli ingressi in cantiere distribuite equamente nell'arco delle ore lavorative.

Aggiornamento al 12.07.2022

Stoccaggio fanghi AFO – Fanghi ACC (III/III)



Fondi Allocati	75,03 M€
Estensione	7,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Rimozione di circa 490.000 t di fanghi AFO e ACC



ACC



ACC



AFO

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (I/VIII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Caratteristiche intervento

Nell'ambito del Piano di Caratterizzazione dello stabilimento ILVA nel suo complesso (ERM, 2003) e sua attuazione, l'area in questione era stata suddivisa in tre aree distinte:

- cd. "discarica Nord-Ovest", identificata nel piano di caratterizzazione come area originariamente adibita a discarica;
- cd. "area ex Fintecna", non identificata nel PdC come area di discarica, ma laddove i sondaggi eseguiti in sede di caratterizzazione (2004-2006) evidenziarono la presenza di rifiuti;
- aree adiacenti alla "ex Fintecna", non identificata nel PdC come area di discarica e risultata come terreni conformi in base ai sondaggi eseguiti per la caratterizzazione (2004-2006).

L'interpretazione risultante dal Piano di Caratterizzazione e dall'esito delle indagini, debitamente validate dagli enti di controllo, è stata poi mantenuta negli atti e documenti successivi, dando luogo alle prescrizioni di cui al DPCM 14.03.2014 e DL 1/2015 (cd. Piano Rifiuti).

Il DL 1/2015 individuava due aree, oggetto di prescrizioni[1] distinte: «Discarica Nord Ovest» (ex prescrizione UP4); «Aree ex-Fintecna» (ex prescrizione UP7). Revisione del Progetto, inclusiva di entrambe le aree, comunicata al Ministero dell'Ambiente con DIR 429 del 18/07/2017.

A seguito dei maggiori approfondimenti documentali condotti nel 2017, venne compreso che le aree di cui trattasi facevano invece originariamente parte di un'unica area in passato adibita a discarica.

1. ILVA in AS non è più soggetta ad AIA e, pertanto, sono decaduti i termini prescrittivi. I codici AIA (DL 1/2015) sono qui riportati per mero riferimento ai pregressi procedimenti.

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (II/VIII)



Fondi Allocati	12.00 M€
Estensione	12.9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Studio di fattibilità

Redatto ad agosto 2018 per definire, in estrema sintesi, l'estensione dell'intervento di messa in sicurezza permanente già previsto per la Discarica Nord – Ovest a tutte e tre le aree di cui sopra.
Tale studio proponeva tre approcci:

- accertare le caratteristiche di non pericolosità dei rifiuti presenti nell'area ex-Fintecna e, in tal caso, estendere a tutto il nuovo perimetro l'intervento autorizzato per il vecchio perimetro della discarica Nord-Ovest (ex prescrizione UP4), il quale consiste in un capping standard per discariche di rifiuti non pericolosi
- in assenza di analisi di caratterizzazione dei rifiuti, integrare cautelativamente il pacchetto di copertura con un telo impermeabile, realizzando sostanzialmente un capping per discariche di rifiuti pericolosi:
  - solo in corrispondenza dell'area ex-Fintecna;
  - oppure, tutta la discarica risultante dalla nuova perimetrazione.

Indagini integrative

Ilva in AS ha ritenuto preferibile effettuare le indagini integrative volte ad accertare le caratteristiche dei rifiuti presenti nell'area ex- Fintecna.
Di seguito le principali tappe:

- 26.11.2020 – Autorizzazione GIP per l'esecuzione di indagini integrative
- 20.02.2021 – ILVA in AS informa ARPA Puglia della programmazione delle attività, con avvio sondaggi previsto per il 01.03.2021
- 25.02.2021 – ARPA Puglia chiede che le attività siano sospese e che ILVA in AS trasmetta preventivamente alcuni documenti ed informazioni per espressione di parere
- 01.03.2021 – ILVA in AS trasmette i documenti richiesti 05.05.2021 – Il MiTE trasmette ad ILVA in AS il parere ARPA-ISPRA
- 25.05.2021 – ILVA in AS trasmette le proprie osservazioni, evidenziando che il parere è stato espresso in termini di piano di caratterizzazione, mentre le attività in esame non hanno né la tipologia né le finalità di un piano di caratterizzazione, il quale è stato peraltro presentato da ILVA in AS ad aprile 2021 per le relative valutazioni. ILVA in AS propone, pertanto, una modalità per accogliere le prescrizioni pertinenti alla caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna, rimandando quelle attinenti al piano di caratterizzazione al relativo procedimento.

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (III/VIII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Indagini integrative

- 01.07.2021 – Il MiTE trasmette riscontro alla nota ILVA in AS, chiedendo di dare avvio alle attività e di fornire relativo cronoprogramma
- 07.07.2021 – ILVA in AS chiede di esprimersi circa la propria nota/proposta del 25.05.2021
- 20.07.2021 – Il MiTE precisa che eventuali chiarimenti devono essere richiesti agli Enti estensori dei pareri
- 23.07.2021 – ILVA in AS trasmette il Piano Operativo ad ARPA ed ISPRA con relativo cronoprogramma, ricordando le differenti finalità tra la caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna e le indagini di caratterizzazione delle matrici ambientali, demandate ad un altro procedimento amministrativo
- 29.07.2021 – ARPA Puglia esprime nulla osta e comunica la propria presenza per le verifiche in campo 29-30-31.07.2021 – Esecuzione dei sondaggi
- 28.10.2021 – Report di fine lavori della caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna dal quale si evince che tutti i campioni sono classificabili come non pericolosi, in accordo con la classificazione storica della discarica.

Attività eseguite o in corso

RDA 1761/20 - Indagini di caratterizzazione su aree limitrofe rispetto all'area oggetto di MISP

- Data emissione: 27/08/2020
- Ordine 640 del 02/10/2020
- Note:

12.04.2021 - Trasmissione Piano di Caratterizzazione agli Enti competenti
05.05.2021 - Poiché parte dell'area ricade all'esterno del SIN, il MiTE propone alla Regione Puglia di avviare un'istruttoria condivisa
10.09.2021 - Il MiTE trasmette le osservazioni di ARPA Puglia, chiedendo ad ILVA in AS di integrare quanto indicato, e sollecita un riscontro da parte della Regione Puglia circa la condivisione dell'iter amministrativo
20/01/2022 - Trasmissione delle integrazioni/osservazioni, con Nota Pec Ilva, in riscontro alla richiesta del MiTE

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (IV/VIII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018 (Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

RDA 1761/20 - Indagini di caratterizzazione su aree limitrofe rispetto all'area oggetto di MISP

28/02/2022 Trasmissione Nota a Regione Puglia con richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi per le aree non ricadenti nel SIN Taranto, in applicazione del procedimento ex art 252.

- 08/03/2022 Nulla Osta della Regione Puglia, in applicazione del procedimento ex art 252, per la convocazione di una Conferenza di Servizi.
- Inviata all'autorità competente, in data 07/07/2022, una revisione del piano di caratterizzazione ai fini della relativa approvazione nell'ambito della suddetta CdS.
- Previsione fine attività: entro 6 mesi dall'emissione del Decreto di approvazione (non ancora pervenuto).

Attività in agenda

RDA 472/22 - Aggiornamento progetto messa in sicurezza permanente

- Data di emissione: 11/03/2022; assegnato ordine 151/22 in data 23/06/2022
- Note: Ordine da assegnare dopo i risultati relativi all'ordine 694/20 (indagini ambientali). Il report di fine lavori relativo all'ordine 694/20 è stato trasmesso a MITE, ARPA, ISPRA ed Autorità Giudiziaria, mentre l'Avv. Loreto ha depositato il report in Procura. Al fine di reperire ulteriori informazioni in merito alla documentazione delle indagini pregresse (2003-2005), è stato eseguito un accesso in stabilimento AdI, in data 08/04/2022, a seguito del quale sono state reperite le stratigrafie ed il relativo stralcio planimetrico delle caratterizzazioni aggiornate all'anno 2006. Elaborate specifica tecnica ed RDA per l'aggiornamento del progetto di MISP. Effettuati tutti i 6 sopralluoghi previsti. Analizzate le offerte tecniche ricevute dai fornitori e dato benestare da parte di ATO in data 25/05/2022. ATO eseguirà una riunione di coordinamento dopo il 18/07/22.
- Data ultima per esecuzione attività: *n.d.*

RDA 1022/21 - Realizzazione di piezometro in falda profonda

- Note: L'intervento è parte del monitoraggio annuale dei piezometri. Assegnato Ordine 188/21 alla ditta Trivelsonda Srl. Inviata richiesta di conferma di validità del parere Vinca alla Provincia in data 14/10/2022, ricevuta risposta in data 03/02/2022. Si sta procedendo a pianificare l'intervento, per il quale è stato nominato il DL/CSE (vedi RDA 656/22 – ordine 138/22 del 25/05/22). E' stata preparata una nuova specifica tecnica e la RDA è in fase di approvazione per l'affidamento di un nuovo ordine al fine di completare l'attività.

Aggiornamento al12.07.2022

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (V/VIII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività in agenda

RDA 656/22 - Incarico DL CSE per ordini 188/21 e 79/22

- Data emissione RDA: 11/04/2022. Data emissione ordine 25/05/22.
- Note: Eseguiti sopralluoghi con i professionisti contattati, in data 13/05. Ricevute proposte tecniche ed economiche da parte dei fornitori, è stato emesso ordine n. 138/22 in data 25/05/2022. Predisposto PSC per successiva trasmissione alla nuova ditta di prossima identificazione.

Monitoraggio acque di falda

La ex-prescrizione UP4 include il monitoraggio falda da avviare contestualmente all'intervento di MISP.
Nelle more dell'avvio di tale intervento, ILVA in AS sta proseguendo il monitoraggio annuale, già in precedenza effettuato in attuazione del PMC 2016 dell'AIA, sebbene non sia più soggetto obbligato.
Tale monitoraggio in autocontrollo è stato eseguito congiuntamente all'area delle Colline e vecchie vasche.
Fino al 2019, il monitoraggio è stato effettuato adottando il set analitico definito nell'ambito del PMC.
Dal monitoraggio 2020 è stato adottato il set di monitoraggio prescritto da ARPA Puglia nell'ambito delle osservazioni al "Piano Onofrio". Una sintesi dei risultati, comprensiva degli anni pregressi, è stata trasmessa agli Enti competenti ed alla Procura di Taranto a giugno 2021.
Nel 2020, il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito dell'ordine affidato per l'esecuzione delle indagini del cd. "Piano Onofrio".
Il monitoraggio riferito all'anno 2021 è stato eseguito nel periodo 20-30.12.2021 in contraddittorio con i tecnici di Arpa Puglia.
Con nota prot. 74210 del 28/10/2021 Arpa Puglia ha validato i risultati analitici relativi alle acque sotterranee della campagna di monitoraggio. Nella stessa nota l'Agenzia ha richiesto di eseguire le future campagne di monitoraggio della falda in contraddittorio in un periodo di scarsa alimentazione dell'acquifero (agosto-settembre).

- Data ultima per assegnazione ordine: 31/07/2022
- Data ultima per esecuzione attività: 30/09/2022

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (VI/VIII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Altre attività

I piezometri afferenti alla discarica Nord-Ovest sono attrezzati con pompe fisse. La presenza di tali attrezzature precludeva la possibilità di misurare la soggiacenza della falda.
Per risolvere tale problematica, ILVA in AS a gennaio 2021, nell'ambito dell'ordine 597/20 affidato alla ditta EcoTrend S.r.l., ha fatto installare, su ciascun piezometro, un tubo guida in modo da permettere l'inserimento di un sondino piezometrico.
Tale operazione ha richiesto l'estrazione delle pompe con gru ed il successivo riallestimento delle stesse.
A seguito dell'estrazione delle pompe, due di esse mostravano segni di deterioramento. Dopo verifiche da parte di ditta specializzata, è emersa la necessità di sostituire una delle due pompe mentre l'altra è stata ripristinata tramite pulizia e manutenzione.
In presenza di ARPA Puglia, sono state effettuate le videoispezioni dei pozzi relativi alle pompe che avevano mostrato i segni di deterioramento.
Dalle videoispezioni il piezometro 6/90/I/FP è risultato parzialmente intasato nella parte terminale, apparentemente per attrezzature (cavi o altro) caduti nel pozzo durante attività precedenti, in merito alle quali non si hanno informazioni.
Conseguentemente, ILVA in AS ha emesso una specifica tecnica ed affidato un ordine supplementare per la terebrazione di un nuovo pozzo in adiacenza e sostituzione di quello esistente, che non risulta avere più caratteristiche idonee al monitoraggio.
Per l'esecuzione delle attività integrative (videoispezioni, manutenzione pompe e fornitura nuova pompa), è stata emessa in data 02.02.2021 una variante all'ordine 597/20 (EcoTrend S.r.l.).

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (VII/VIII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Indagini di classificazione di pericolosità dei rifiuti presenti nel corpo di discarica



Sondaggio



Indagini radiometriche



Cassetta catalogatrice sondaggio

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nuove Vasche (I/IV)



Fondi Allocati	3,00 M€
Estensione	3,6 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Caratteristiche intervento

Gestione post-operativa della discarica secondo il Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con Determinazione del Dirigente n. 39 del 06.03.2008 e integrato dalle prescrizioni ISPRA (verbale 18.06.2018)

Le attività comprendono:

- Manutenzione conservativa di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti elettrici di messa a terra, i presidi antincendio (estintori, idranti) che saranno soggetti alle verifiche periodiche di legge.al fine di garantirne l'efficienza.
- Mantenimento dell'integrità e delle funzionalità della recinzione e dei presidi di accesso alla discarica e mantenimento dell'integrità e pulizia della viabilità interna ed esterna.
- Ispezioni visive secondo le periodicità prescritte dal Piano di Sorveglianza e Controllo.
- Mantenimento dell'integrità, della pulizia e della funzionalità della rete di raccolta e collettamento e stoccaggio nella vasca di accumulo delle acque meteoriche.
- Mantenimento dell'integrità e della funzionalità: del sistema di estrazione della rete di raccolta, stoccaggio intermedio, collettamento e rilancio del percolato; dei pozzi a presidio delle acque sotterranee P6, P7 ed MF3; della rete di monitoraggio delle emissioni diffuse.
- Prosecuzione dell'attuazione delle procedure di monitoraggio con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
    1. Acque sotterranee: prelievo ed analisi, con frequenza semestrale, dai piezometri di controllo denominati P6, MF3, P7, ubicati rispettivamente il primo a monte e i restanti due a valle della discarica;
    2. Percolato: controllo dei volumi e della composizione con frequenza semestrale;
    3. Emissioni diffuse: campionamento ambientale delle polveri totali, con frequenza semestrale, in due punti di prelievo localizzati lungo la direttrice principale del vento a monte e a valle della discarica;
    4. Fibre di amianto: prelievo con campionatori ambientali, con frequenza semestrale, per verificarne l'eventuale presenza.
    5. Monitoraggio morfologico: rilievi plano-altimetrici eseguiti con frequenza annuale al fine di verificare la sussistenza di fenomeni di assestamento e/o cedimento della massa di rifiuti ed in particolare del sistema di ricopertura finale.
    6. Monitoraggio meteoclimatico: allo stato attuale Ilva riceve giornalmente le osservazioni meteorologiche dall'Osservatorio «Luigi Ferraiolo» di Talsano

Durata pari a 30 anni dall'inizio della gestione post-operativa (2048).

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nuove Vasche (II/IV)



Fondi Allocati	3,00 M€
Estensione	3,6 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso

RDA 2490/21 - Monitoraggio falda, acque meteoriche, percolato 2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi
- Previsione fine attività: 31/12/2022

RDA 2491/21 - Campionamento ambientale polveri
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordine n. 12/22 in data 20/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi; Attività eseguita il 27/04/2022
- Previsione fine attività: 31/12/2022

RDA 2492/21 - Campionamento fibre aerodisperse
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordine n. 13/22 in data 20/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi; Attività eseguita il 27/04/2022
- Previsione fine attività: 31/12/2022

RDA 2493/21 - Rilievo topografico
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordine n. 22/22 in data 27/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi. Ultimo rilievo effettuato il 15/03/2022
- Previsione fine attività: 31/12/2022

Attività in agenda

RDA 1770/21 - Prog. Op. potenziamento rete raccolta acque meteoriche
- Note: Emessi RDA di integrazione ed ordine n. 65/22 in data 24/02/2022. Effettuato rilievo plano-altimetrico con drone il 20/04/2022. Il progettista ha fatto realizzare un sondaggio geotecnico propedeutico alla progettazione e sta predisponendo gli elaborati grafici. I rilievi topografici, i rilievi effettuati con il drone e la relazione idrogeologica sono stati consegnati dai subappaltatori al progettista, Ing. Basile, in data 29/06.
- Previsione fine attività: 30/07/2022

Criticità

- Nessuna criticità evidenziata

Aggiornamento al 12.07.2022

Discarica Nuove Vasche (III/IV)



Fondi Allocati	3,00 M€
Estensione	3,6 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Gestione post-operativa e controlli



Sfalcio vegetazione




Prelievo campione percolato



Vasca prima pioggia

…e le restanti 13 Aree Escluse

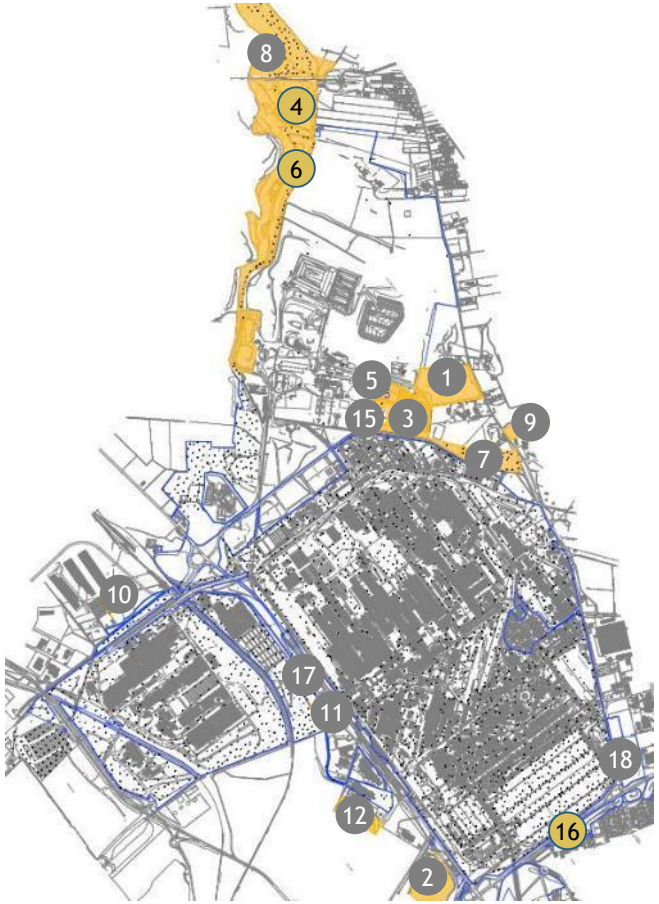

- 6 Gravina Leucaspide
- 7 Aree a verde lungo SP Statte lato ovest
- 8 Aree a verde NORD
- 9 Land A – Area a verde adiacente a stabilimento
- 10 Land C – Area a verde adiacente a stabilimento
- 11 Land D1 - Area a verde adiacente a stabilimento
- 12 Land E – Sito industriale non attivo ex Sidercomit
- 13 Land I – Area a verde adiacente ad Ospedale Nord
- 14 Land L - Cava L'Amastuola
- 15 Aree limitrofe stoccaggio fanghi
- 16 Collinette ecologiche Tamburi
- 17 Land D2 - Area a verde con chiesetta
- 18 Area Pozzo 25

Aree sottoposte a Sequestro con Interventi in corso

Aree con interventi in corso

Aree in manutenzione e con procedimento da definire

Aree cedibili e prive di pendenze

Area in Perimetro Sito Interesse Nazionale (SIN) di Taranto


Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN di Taranto

Nota: Non rappresentate aree non adiacenti allo stabilimento produttivo (Voce 13 – Land I e Voce 14 - Land L) con superficie complessiva di 128.4 ettari

Fonte: ILVA

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (I/XII)

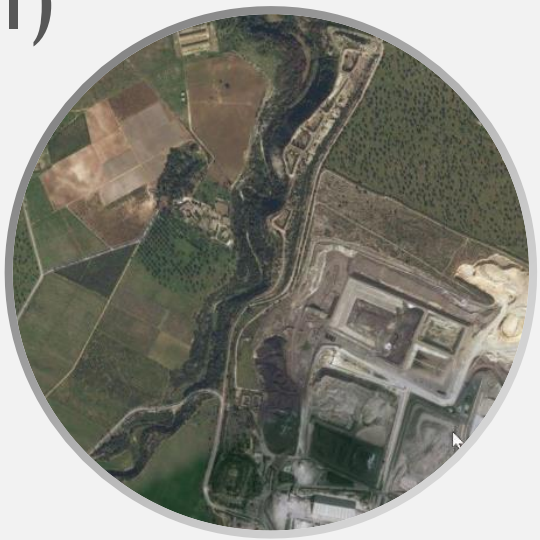

Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente


Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Caratteristiche intervento

Rilevati costituiti da materiali di riporto (terreni di sbancamento e residui di produzione), con sovrastanti vasche in terrapieno, denominate «colline». Area sommitale adibita a n. 7 vasche per sedimentazione ed ispessimento di residui oleosi, prima del trasferimento degli stessi agli impianti di conferimento finale. Attività proseguita fino alla metà degli anni '80, quando fu interrotta, in relazione alle nuove regolamentazioni in materia di gestione rifiuti.
Area interessata dal rilevato (cd. «colline») e le relative vasche 1-7

Area sottoposta a caratterizzazione SIN nel 2006

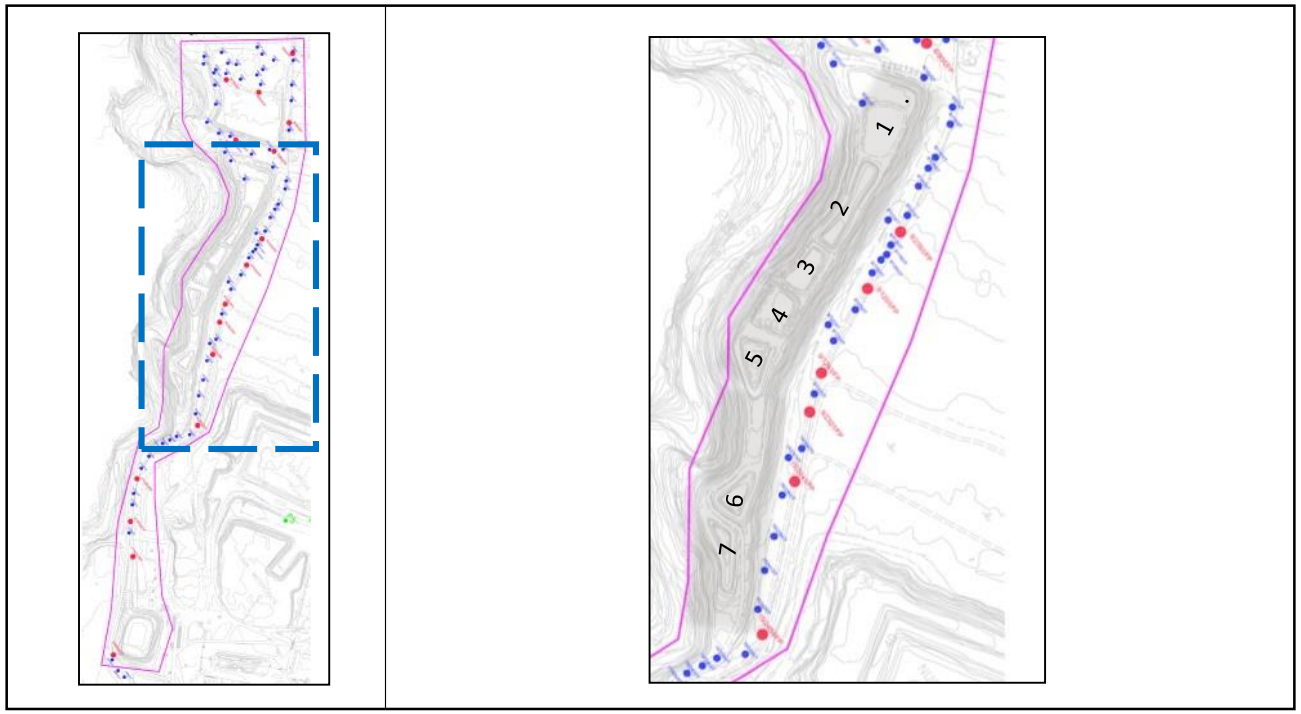

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (II/XII)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente


Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Caratteristiche intervento


La cosiddetta discarica Sud-Ovest, e relativa vasca 8, è fisicamente separata dalle «collinette». La vasca per la decantazione fanghi è stata realizzata in depressione sulla sommità della discarica.
Stante la cessazione totale delle attività di decantazione fanghi più o meno contestuale al periodo in cui veniva realizzata la vasca, non è attualmente noto se la struttura sia mai stata messa in servizio oppure se il progetto sia stato di fatto abbandonato prima della sua realizzazione.

Area sottoposta a caratterizzazione SIN nel 2006

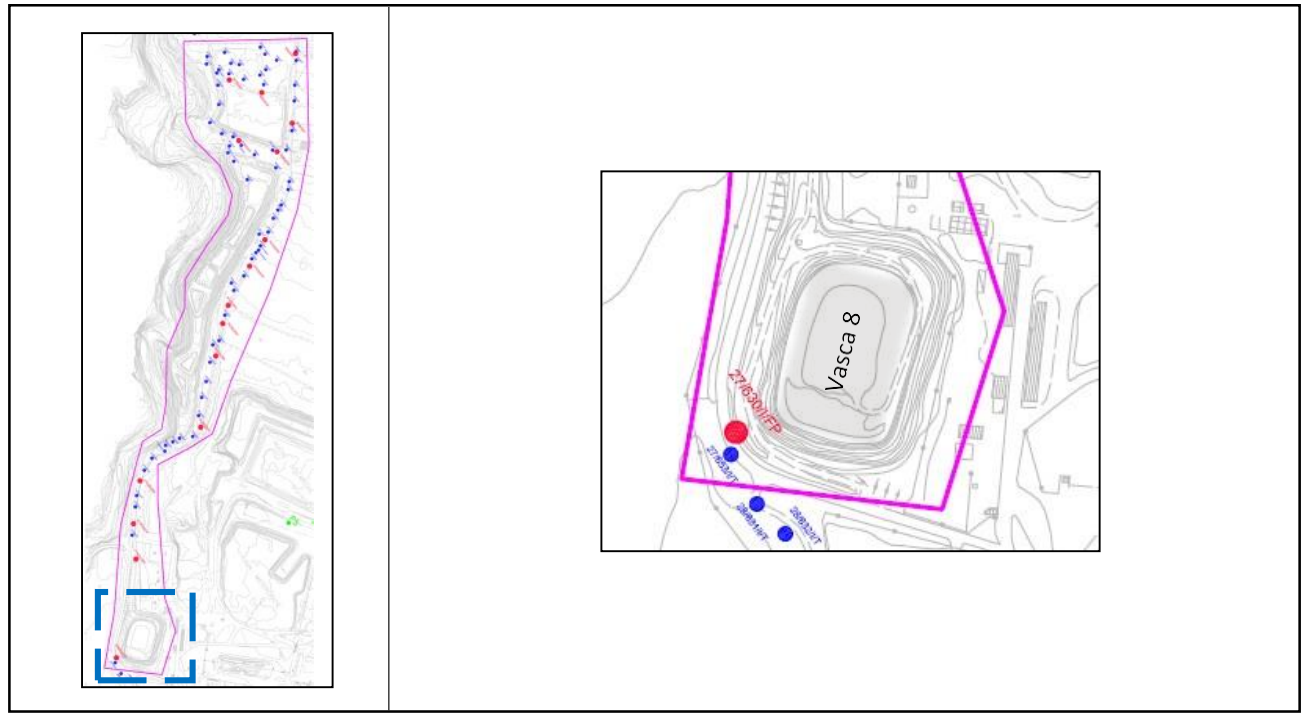

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (III/XII)

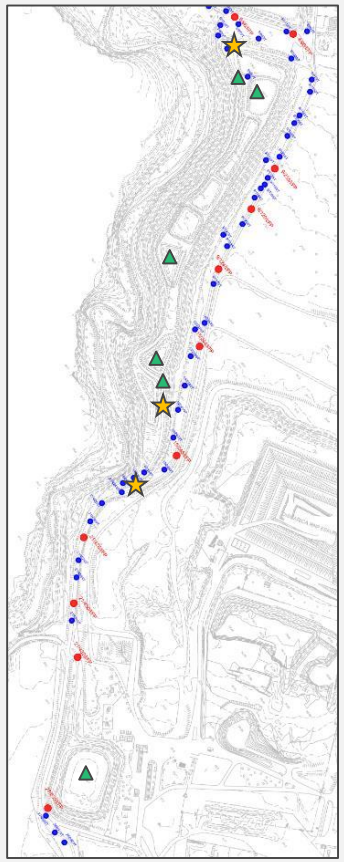

- Punti di indagine della caratterizzazione SIN (● sondaggi; ● piezometri)
- Indagini Piano Onofrio ▲
- Indagini integrative ARPA ★

Indagini ambientali – Zone accessibili o parzialmente accessibili

Caratterizzazione nell'ambito del procedimento SIN - Zone accessibili

- Eseguita nel 2004-2006 (Relazione finale 2007)
- Piano di caratterizzazione integrativa, trasmesso il 12/04/2021 ad Enti competenti per approvazione. Con nota n.47547 del 05/05/2021, il MITE trasmette alla Regione Puglia una richiesta di condivisione del procedimento amministrativo in quanto l'area ricade parzialmente fuori SIN.
- In data 09/09/2021 il MATTM ha richiesto l'integrazione del PdC a seguito di osservazioni di ARPA Puglia.
- Inviate integrazioni ed osservazioni richieste da MITE il 10/09/21 su osservazioni di ARPA. In attesa del riscontro del MiTE.
- Indetta CdS decisoria dal MiTE in merito al PdC in data 15/07/2022. In data 07/07/2022 è stata inviata all'autorità competente una versione revisionata del documento PdC, che annullava e sostituiva la precedente versione di gennaio 2022, recependo alcune correzioni rispetto alla versione sostituita.


Indagini richieste dall'Autorità Giudiziaria per integrare le indagini con sondaggi sulla sommità dei rilevati ed all'interno delle vasche - Ordine 597/2020 (Eco Trend s.r.l.) concluso.

Stato di avanzamento

- Eseguito monitoraggio falda 2020;
- Presentate istanze presso Enti locali per autorizzazione attività (novembre 2020). Presentati solleciti con opportuno supporto legale. Ricevute autorizzazioni dagli enti competenti, ultima pervenuta in data 24/06/2021.
- Ripresa lavori programmata per il 06.09.2021, sospesa dal CSE in data 03.09.2021 per assenza di sufficienti condizioni di sicurezza dei luoghi e conseguente necessità di ulteriori approfondimenti in merito.
- Condivisione con Procura di Taranto delle questioni emerse in merito alla sicurezza.
- Eseguite indagini indirette prescritte dal CSE, attualmente in corso di elaborazione, che hanno evidenziato la stabilità del rilevato e la necessità di attivare un sistema di monitoraggio del rilevato (RDA 25/22).
- Eseguite indagini del piano «Onofrio», il report di fine lavori e delle analisi è stato depositato in Procura e trasmesso a MiTE, ARPA ed ISPRA.

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (IV/XII)

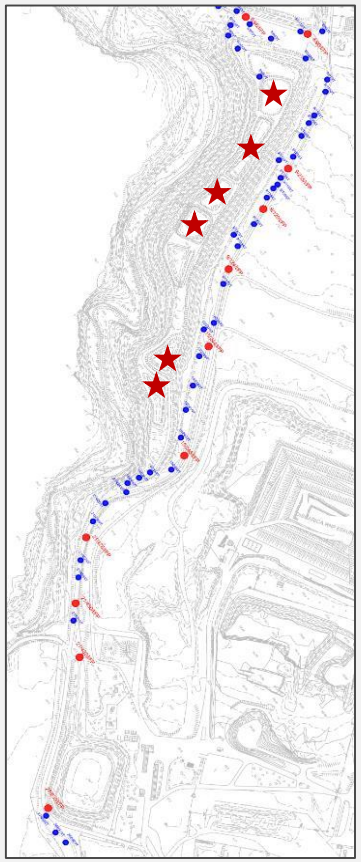

- Punti di indagine della caratterizzazione SIN (● sondaggi; ● piezometri)
- Indagini integrative ambientali chieste da ARPA in zone attualmente non accessibili ★

Indagini ambientali – Zone attualmente inaccessibili

- ARPA Puglia ha chiesto di effettuare un'indagine di mercato per verificare le migliori tecniche disponibili per accedere con le attrezzature di perforazione all'interno delle vasche, in zone attualmente non accessibili
- ILVA in AS ha deciso di integrare le attività di indagine ambientale con indagini di tipo geotecnico ai fini della progettazione delle opere di messa in sicurezza del rilevato.


Modalità d'azione

Ricerca fornitori ed individuazione delle modalità tecniche per gli accessi (completata):

- Emessa RDA 779/2020 (marzo 2020) per individuazione da parte delle potenziali ditte esecutrici delle modalità e/o opere necessarie a consentire l'accesso ed il posizionamento delle sonde all'interno delle vasche
- Dicembre 2020 – Estensione delle attività con introduzione di indagini geotecniche
- Valutate le proposte tecniche, individuati n. 3 potenziali fornitori: accessi con gru o elicottero.
- Emessa nuova RDA n. 105/22 in sostituzione della RDA 779/20
- Individuato il fornitore per i sondaggi ambientali; l'Ufficio Acquisti è attualmente in fase di contrattazione con la ditta individuata per assegnare l'ordine. La ditta individuata ha proposto l'utilizzo di elicotteri come modalità di accesso alle vasche. In tal senso, considerando la difficoltà logistica e gli oneri dovuti per la fase esecutiva, è stato proposto ad ARPA Puglia un cronoprogramma dei lavori, per la condivisione del periodo di attività con l'Agenzia, al fine definire il periodo nell'Ordine con la ditta Appaltatrice.
- In corso di assegnazione incarichi per DL/CSO/CSE/RL per le attività in programma

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (V/XII)

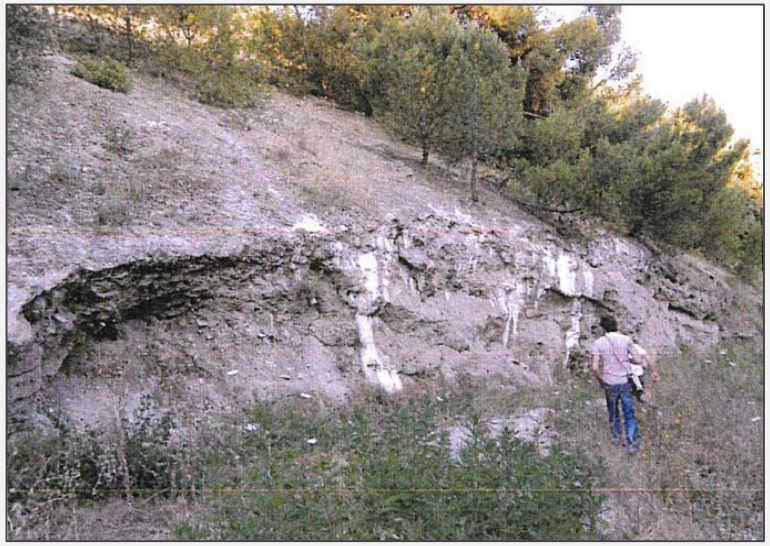

EROSIONE AL PIEDE DEL RILEVATO

Ipotesi preliminari di intervento: gabbioni tipo Maccaferri

Misure anti erosione

Effettuata analisi di stabilità del rilevato (2016 - Techgea) – Esiti:

- Corpo del rilevato stabile
- Erosione al piede
- Erosione ai fianchi con limitata rivegetazione

Previsti approfondimenti geotecnici tramite indagini dirette per confermare e/o integrare le opere da eseguire (slide precedente)

Progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza.

Assegnazione a valle degli esiti delle indagini geotecniche.

Area soggetta a plurimi vincoli: da acquisire le relative autorizzazioni.

EROSIONE SUI VERSANTI

Ipotesi preliminari di intervento: geostuoie con idrosemina di specie selezionate per climi aridi



Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (VI/XII)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018 (Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

RDA 1761/20 - Indagini di caratterizzazione

- Data emissione: 27/08/2020
- Piano di Caratterizzazione trasmesso in data 12/04/2021.
- Note: Inviate integrazioni ed osservazioni richieste da MITE il 10/09/21 su osservazioni di ARPA. Richiesta da MITE documentazione, non acquisita precedentemente, in formato DVD, successivamente trasmessa. Inviato sollecito a Regione Puglia per indire una Conferenza dei Servizi, nell'ambito del procedimento di approvazione del PdC, relativo alle aree non rientranti nella perimetrazione SIN. In riscontro a tale richiesta, la Provincia condivide l'iter procedurale.
- Indetta CdS decisoria dal MiTE in merito al PdC in data 15/07/2022
- In data 7/07 è stata inviata all'autorità competente una revisione del piano di caratterizzazione ai fini della relativa approvazione nell'ambito della suddetta CdS.
- Previsione fine attività: entro 6 mesi dall'emissione Decreto di approvazione (non ancora pervenuto)

RDA 778/20 - Ordine 597/20 Ecotrend Piano «Onofrio» (Zone accessibili o parzialmente accessibili)

- Data emissione: 14/04/2020
- Esecuzione delle Indagini ambientali in zone ad accessibilità limitata (cd. "Piano Onofrio") consistente in n. 9 sondaggi ambientali, di cui n. 4 all'interno delle «Vecchie Vasche».
- Iter autorizzativo per l'esecuzione delle attività (produzione istanze a EE.PP., integrazioni varie, solleciti ecc.) è stato avviato a settembre 2020 ed è terminato a giugno 2021 con l'ottenimento dell'ultima autorizzazione.
- Fase preparatoria di decespugliamento e di predisposizione delle aree di lavoro eseguita nel periodo compreso tra luglio ed agosto 2021.
- A seguito di valutazioni supplementari sulla sicurezza dei luoghi di lavoro il CSE ha sospeso l'avvio delle attività (previsto per il 06/09/2021) e disposto indagini supplettive, eseguite a novembre 2021, i cui esiti hanno confermato la fattibilità delle lavorazioni in sicurezza, tuttavia attenzionando una situazione da monitorare nella parte sommitale agli argini del corpo del rilevato.
- I sondaggi sono stati eseguiti nel periodo compreso tra il 24/01/2022 ed il 21/02/2022
- Inviata documentazione mezzo corriere in data 24/05/2022 al MITE e consegnata al GIP in data 25/05/2022 da parte dell'Avv. Loreto.
- Nel complesso, nel corso di tutta l'attività, sono stati carotati circa 237 m del corpo rilevato, dai quali sono stati prelevati n. 51 campioni di matrice terreno, di cui n. 41 anche per il Test di Cessione, in conformità con l'attuale normativa. Sono, inoltre, stati prelevati n. 3 campioni di "Materiale Inatteso", il cui Set Analitico è stato richiesto e definito con i tecnici di ARPA Puglia

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (VII/XII)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018 (Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

- Gli esiti analitici dei campioni di materiale di riporto, confrontati con le "Concentrazioni Soglia di Contaminazione" (CSC) previste per i siti a destinazione d'uso commerciale e industriale (Tabella 1B, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006) hanno evidenziato la non conformità per:
- Idrocarburi C>12 in n. 3 campioni ed IPA in n. 2 campioni, prelevati in corrispondenza del sondaggio S7;
- Idrocarburi C>12 in n. 2 campioni prelevati in corrispondenza del sondaggio obliquo S1';
- Vanadio in n. 3 campioni prelevati nel sondaggio S2', in n. 4 campioni prelevati nel sondaggio S5, in n. 1 campione prelevato nei sondaggi S8 e S9;
- IPA in n.1 campione prelevato in corrispondenza del sondaggio S2'.
- Tutti i campioni prelevati in corrispondenza del terreno naturale di substrato, ossia il suolo naturale su cui poggia il rilevato, hanno evidenziato la conformità alle CSC di riferimento normativo.
- Relativamente ai campioni sottoposti al Test di Cessione, gli esiti analitici, confrontati con le CSC previste per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006) hanno riscontrato alcuni superamenti per metalli e altri parametri inorganici.

RDA 692/22 - Analisi contradditorio ARPA

- Data emissione: 19/04/2022; assegnato ordine 115/22 in data 2/05/2022
- Note: Emessa richiesta di pagamento in favore di Arpa Puglia, relativamente ai campionamenti effettuati in contradditorio durante le indagini ambientali previste dal piano «Onofrio».

RDA 596/22 - Integrazione ordine 597/20 Ecotrend Piano «Onofrio» per attività aggiuntive

- Data emissione: 05/04/2022
- Nel corso dell'esecuzione delle attività ambientali è emersa la necessità di eseguire attività integrative quali: indagini Georadar per escludere l'interferenza di tubazioni afferenti alla condotta «Sinni» e analisi integrative, richieste da ARPA Puglia, relativamente a materiale definito «inatteso» rinvenuto in fase di perforazione ed integrazioni del computo metrico per quantitativi aggiuntivi ai valori stimati.

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (VIII/XII)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Indagini ambientali, in zone con moderate difficoltà di accesso, previste nel piano redatto dall'Ing. Maurizio Onofrio e relative integrazioni ARPA PUGLIA.



Cantierizzazione



Discesa trivella elettrica



Posa trivella sondaggio inclinato

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (IX/XII)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018 (Sequestro Leucaspide)

Indagini ambientali, in zone con moderate difficoltà di accesso, previste nel piano redatto dall'Ing. Maurizio Onofrio e relative integrazioni ARPA PUGLIA.



Discesa rocciatori



Indagini geoelettriche



Strumentazione per indagini

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (X/XII)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività in agenda

RDA 25/22 - Sistema monitoraggio stabilità del rilevato

Per l'esecuzione delle indagini ambientali del «Piano Onofrio», al fine di verificare la sicurezza dei luoghi di lavoro per l'aggiornamento del PSC, sono state eseguite delle indagini indirette condotte sul corpo del rilevato; dagli esiti delle indagini si è appreso che la struttura dell'intero rilevato risulta essere fortemente disomogenea, sia per la natura dei materiali che lo compongono sia per grado di addensamento e compattazione dei materiali stessi. Infatti, gli esiti dello studio hanno evidenziato che le scarpate risulterebbero piuttosto stabili mentre la parte sommitale, per uno spessore medio di circa cinque metri e giacitura concordante con il versante, sarebbe costituita da una coltre sabbioso-ghiaioso, per lo più degradata e mobilizzata, su cui si rinvengono fessure beanti e crepe sul ciglio. Tali evidenze hanno suggerito l'installazione del sistema di monitoraggio.

- Emesso ordine n. 79/22 il 11/03/2022.

Note: Ricevute offerte economiche da 5 società. E' stato nominato il DL/CSE (vedi RDA 656/22 – ordine 138/22 del 25/05/22). In data 05/07/22 l'attività è stata avviata ed è terminata in data 08/07/22, in conformità al cronoprogramma trasmesso alla PG. In corso di pianificazione rilievo topografico di dettaglio, compreso nell'ordine.

Messa in sicurezza del rilevato

ILVA in AS aveva commissionato un'analisi di stabilità del rilevato alla società Techgea s.r.l. La relazione tecnica stilata nel 2016 riportava le seguenti valutazioni:
Stabilità del corpo del rilevato
Erosione al piede
Erosione ai fianchi con limitata ri-vegetazione
ILVA in AS ha pertanto deciso di mandare in affidamento la progettazione definitiva delle opere di messa in sicurezza del rilevato, come individuate nell'ambito dello studio effettuato da Techgea. A seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente con le ditte invitate alla gara, è emersa la necessità di disporre di adeguati dati geotecnici del corpo del rilevato, ai fini di poter effettuare verifiche più analitiche circa la stabilità complessiva e l'estensione e modalità di applicazione degli interventi di messa in sicurezza. Tali indagini riguarderebbero anche zone non direttamente accessibili.
Essendo già in corso una gara per la ricerca di soluzioni per poter effettuare le indagini ambientali in zone attualmente non accessibili, ILVA in AS ha ritenuto opportuno integrare in questo ambito anche le indagini geotecniche, emettendo una specifica tecnica integrativa. L'incarico di progettazione sarà affidato a seguito dei risultati delle indagini geotecniche perviste dall'RDA 105/22.

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (XI/XII)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018 (Sequestro Leucaspide)

Attività in agenda

RDA 105/22 - Sondaggi ambientali Leucaspide

- Note: Valutate offerte tecniche ricevute da 3 società ed individuato il fornitore. Ufficio Acquisti in fase di contrattazione sulle riserve presentate. La ditta individuata ha proposto l'utilizzo di elicotteri come modalità di accesso alle vasche. In tal senso, considerando la difficoltà logistica e gli oneri dovuti per la fase esecutiva, è stato proposto ad ARPA Puglia un cronoprogramma dei lavori, per la condivisione del periodo di attività, al fine definire il periodo nell'ordine con la ditta Appaltatrice. Prima della sottoscrizione dell'ordine, infatti, è stata richiesta la conferma del cronoprogramma dei lavori e la data di avvio, considerata la necessità di acquisire autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti preposti.

RDA 582/22 - Monitoraggio acque di falda

- Viene eseguito congiuntamente alla discarica Nord-Ovest.
- Fino al 2019 il monitoraggio è stato effettuato adottando il set analitico definito nell'ambito del PMC.
- Dal monitoraggio 2020, è stato adottato il set di monitoraggio prescritto da ARPA Puglia nell'ambito delle osservazioni al "Piano Onofrio".
- Nel 2020 il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito dell'ordine affidato per l'esecuzione delle indagini del cd. "Piano Onofrio".
- Una sintesi dei risultati, comprensiva degli anni pregressi, è stata trasmessa agli Enti competenti ed alla Procura di Taranto a giugno 2021.
- Per una migliore comparabilità dei dati, il monitoraggio viene effettuato circa nello stesso periodo dell'anno, ossia nell'ultimo trimestre.
- Il monitoraggio per l'anno 2022 (RdA 582/22) è stato pianificato per fine agosto/inizio settembre, su richiesta di ARPA Puglia.
- Data emissione: 29/03/2022
- Note: Emesso ordine 105/22 in data 07/04/2022. Attività pianificata per fine agosto/ inizio settembre, su richiesta di ARPA Puglia
- Previsione fine attività: 30/09/2022

Aggiornamento al 12.07.2022

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (XII/XII)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività in agenda

RDA 843/22 - Richiesta incarico RL DL CSE CSP per i sondaggi ambientali

- Data emissione: 12/05/2022
- L'attività avrà inizio nel momento in cui saranno esecutive le attività previste dalla RDA 105/22. Effettuati 3 sopralluoghi in data 24/05/22. Ricevute offerte tecniche ed economiche.

Aggiornamento al 12.07.2022

Area ad ovest SP Statte ID07 (I/III)



Fondi Allocati	4,88 M€
Estensione	6,9 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive. Sottoposta a caratterizzazione nel 2006. Aggiornamento della caratterizzazione ai fini dello svincolo

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura


Attività eseguite o in corso

RDA 2353/21 - Analisi di rischio

- Data emissione: attività assegnata a società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19/01/2022
- Note: Da PUG l'area ricade per la parte ovest in colonna A e per la parte est in colonna B. Engea sta predisponendo l'ADR con tale scenario, utilizzando come layout il format indicato nelle linee guide ISPRA. Ricevuta prima bozza da parte di Engea il 14/06/22, che ATO sta esaminando per successiva trasmissione da parte dei Commissari agli enti preposti. Trasmissione prevista entro 01/08/22.

Aggiornamento al 12.07.2022

Area ad ovest SP Statte ID07 (II/III)

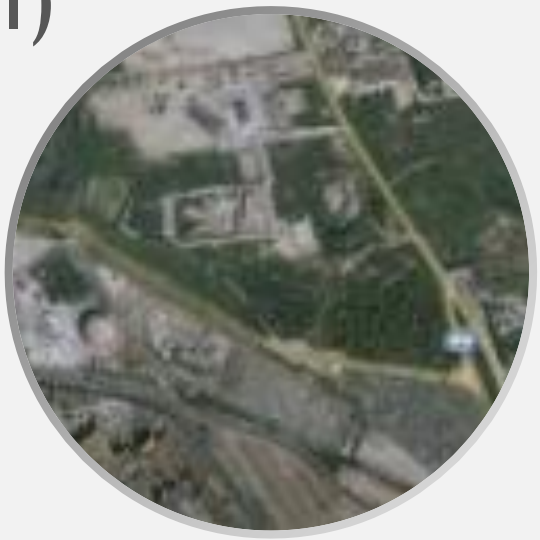

Fondi Allocati	4,88 M€
Estensione	6,9 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Attività in agenda

RDA 2105/20 - Recinzione perimetrale; Noleggio a caldo mini escavatore per esecuzione lavori


- Data emissione: 14/10/2020; Assegnato ordine 672 a professionista esterno
- Note: la Provincia, a seguito di stipula di polizza fideiussoria per attività di recinzione dell'area da effettuarsi con dipendenti ILVA in AS, ha autorizzato l'inizio delle attività. Sollecitata la ditta Sinnica a fornire il POS al DL nei giorni 15/06 e 06/07. In data 24/06/22 è stato nuovamente sollecitato il DL/CSE per quanto concerne l'emissione del POS e l'inizio della relativa attività. In data 1/07/22 la ditta Sinnica ha rivendicato la necessità di rinegoziare il contratto in precedenza sottoscritto, in quanto ormai scaduto, anche alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime dell'ultimo periodo. Si è in attesa di aggiornamenti in merito alla rinegoziazione del contratto.
- Data previsione fine attività: 30/09/2022

Criticità

- **Esproprio porzione di area** per metanodotto SNAM

Aggiornamento al 12.07.2022

Area ad ovest SP Statte ID07 (III/III)

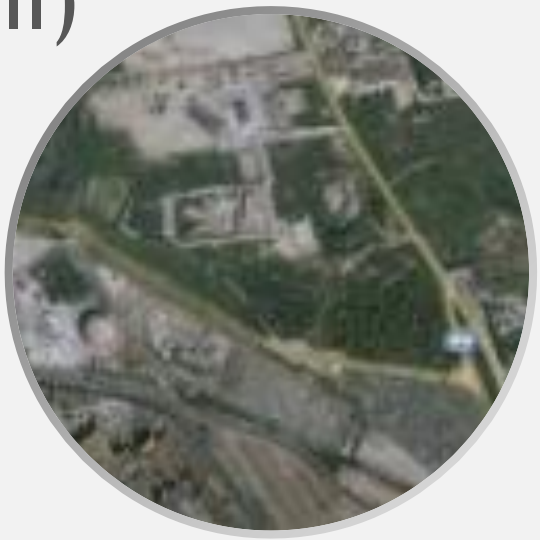

Fondi Allocati	4,88 M€
Estensione	6,9 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Indagini di caratterizzazione per suolo, sottosuolo e falda



Piezometro



Sondaggio



Sondaggio

Aggiornamento al 12.07.2022

Area a Verde NORD ID08 (I/II)



Fondi Allocati	18,40 M€
Estensione	26,7 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive. Sottoposta a caratterizzazione nel 2006 Aggiornamento della caratterizzazione ai fini dello svincolo

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività eseguite o in corso

RDA 512/21 - Indagini di caratterizzazione integrativa

- Data emissione: 05/03/2021; Ordine 90/21 del 14/04/2021
- Note: Attività di caratterizzazione matrice terreno completata; Realizzati n. 2 nuovi piezometri profondi. Attività quasi completata. Rimane da eseguire il campionamento falda previsto per settembre/ottobre 2022 su richiesta di ARPA Puglia in verbale sottoscritto il 22/03/2022. Ricevuti tutti i risultati. Ricevute integrazioni dettagliate da EcoTrend relativamente all'analisi di rischio, a seguito di sollecito effettuato il 18 maggio 2022.
- Previsione fine attività: 31/10/2022

Attività in agenda

RDA 2353/21 - Analisi di rischio

- Data emissione: Attività assegnata a società di consulenza esterna (Engea) con ordine n. 7/22 del 19/01/2022
- Note: Da CDU, l'area ricade in zona con numerosi vincoli ambientali. Pertanto l'analisi di rischio sarà elaborata secondo la colonna A di confronto per i terreni. L'elaborazione dell'Analisi di Rischio sarà avviata al termine della caratterizzazione della falda, prevista per la II decade di settembre, in conformità alla richiesta formulata da ARPA Puglia.
- Previsione fine attività: 30/09/2022, poiché Engea sta preparando l'analisi di rischio per le aree Land C, Area Verde Ovest e PdC per Collinette Tamburi.

Aggiornamento al 12.07.2022

Area a Verde
NORD ID08 (II/II)



Fondi Allocati	18,40 M€
Estensione	26,7 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Rimozione cumuli rifiuti abbandonati



Cumulo rifiuti



Rimozione rifiuti



Rifiuti rimossi

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land A ID09 (I/II)



Fondi Allocati	2,16 M€
Estensione	3,0 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Area interessata dalla estesa presenza di rifiuti abbandonati; le indagini di caratterizzazione potranno iniziare solo a valle della rimozione degli stessi

Attività eseguite o in corso

RDA 455/22, 80/21, 1840/21 - Rimozione rifiuti

- Data emissione: 14/03/2022; 15/01/2021; 15/09/2021. Ordine 249/21.
- Note: L'attività di rimozione dei rifiuti in cumuli fuori terra è stata completata.

RDA 492/21 - Indagini di caratterizzazione

- Data emissione: 24/02/2021; Ordine 92/21 del 13/04/2021
- Note: Ricevuta in data 07/06/2022, da parte di Engea, la proposta di integrazione al piano di caratterizzazione (che include la gestione dei rifiuti compattati). ATO ha elaborato nota di trasmissione dei Commissari Straordinari agli enti competenti, a corredo del documento integrativo del PdC. La suddetta documentazione è stata inviata in data 07/07/22.
- Previsione fine attività: 07/07/22

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land A ID09 (II/II)



Fondi Allocati	2,16 M€
Estensione	3,0 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Presenti variazioni rispetto aggiornamento precedente

Attività in agenda

RDA 2107/20 - Recinzione perimetrale; Noleggio a caldo mini escavatore per esecuzione lavori

- Data emissione: 14/10/2020
- Note: la Provincia, a seguito di stipula di polizza fideiussoria per attività di recinzione dell'area da effettuarsi con dipendenti ILVA in AS, ha autorizzato l'inizio delle attività. Sollecitata la ditta Sinnica a fornire il POS al DL nei giorni 15/06 e 06/07. In data 24/06/22 è stato nuovamente sollecitato il DL/CSE per quanto concerne l'emissione del POS e l'inizio della relativa attività. In data 1/07/22 la ditta Sinnica ha rivendicato la necessità di rinegoziare il contratto in precedenza sottoscritto, in quanto ormai scaduto, anche alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime dell'ultimo periodo. Si è in attesa di aggiornamenti in merito alla rinegoziazione del contratto.
- Data previsione fine attività: 30/09/2022

Criticità

- **Rinvenimento rifiuti compattati** in una porzione di area

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land C ID10 (I/II)



Fondi Allocati	1,29 M€
Estensione	1,8 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive. Sottoposta a caratterizzazione nel 2006. Aggiornamento della caratterizzazione ai fini dello svincolo.

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività eseguite o in corso

Nessuna attività evidenziata

Attività in agenda

RDA 2353/21 - Analisi di rischio

- Data emissione: Attività assegnata a società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19/01/2022

Note: Da CDU l'area ricade in parte in colonna A e in parte in colonna B per cui la ditta Engea redigerà l'ADR con tale scenario. Ad aprile 2022 l'intera area è stata interessata da un incendio, a seguito del quale sono andate distrutte 8 cassette su 12 dei sondaggi effettuati. La querela è stata presentata all'Autorità giudiziaria il 16/06/22. La relativa nota di segnalazione al MiTE è stata trasmessa in data 07/07/22.

In data 22/06/22 è stata ricevuta una prima bozza di analisi di rischio da parte di Engea. ATO sta esaminando quest'ultimo documento con la previsione di trasmetterlo agli enti competenti, corredato dalla relativa nota di trasmissione a firma dei Commissari Straordinari entro il 25/07/22.

Data previsione fine attività: 15/07/2022

Criticità

L'intera area è stata interessata da un incendio, a seguito del quale sono andate distrutte 8 cassette su 12 dei sondaggi effettuati.

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land C ID10 (II/II)



Fondi Allocati	1,29 M€
Estensione	1,8 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Indagini di caratterizzazione per suolo, sottosuolo e falda



Spurgo piezometro



Deposito temporaneo



Cassetta sondaggio

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land D1 ID11 (I/III)



Fondi Allocati	2,30 M€
Estensione	3,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive. Sottoposta a caratterizzazione nel 2006. Aggiornamento della caratterizzazione ai fini dello svincolo

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività eseguite o in corso

RDA 514/21 - Indagini di caratterizzazione integrativa

- Data emissione: 25/02/2021; Ordine 94/21 del 13/04/2021
- Note: Ricevuto Computo Metrico dal CSE in data 19/10/2021 con stima costi attività integrative. In attesa di variante d'Ordine. Ricevute sezioni storiche del 1° Canale di Scarico ILVA con profondità di posa a circa 10 m da p.c da Direttore ASI, in data 15/10/2021. L'offerta economico di Eco-Trend per le attività integrative risulta eccedente l'RdA. Attività riprese il 18/11/2021 dopo sospensione per rischio interferenze di sottoservizi e strutture interrate non note. Definite posizioni degli ultimi 2 punti di sondaggio. Engea ha trasmesso relazione tecnica sulle modalità di esecuzione del sondaggio S12 e sulla gestione dei rifiuti compattati. La relazione accompagnata da nota esplicativa sullo slittamento delle attività è stata trasmessa agli enti dopo avere ricevuto specifico riscontro dal Consorzio ASI sulla possibile interferenza del collettore del canale di scarico principale dello stabilimento. La suddetta comunicazione è stata trasmessa al MITE, ISPRA ed ARPA in data 06/06/2022. E' stato ricevuto il riscontro da parte di ARPA con relative prescrizioni, sulle base delle quali si pianificheranno gli interventi richiesti con i fornitori. Si sta valutando con l'Ufficio Acquisti la conduzione dell'ordine con la ditta appaltatrice a seguito delle citate prescrizioni.

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land D1 ID11 (II/III)



Fondi Allocati	2,30 M€
Estensione	3,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Attività in agenda

RDA 2353/21 - Analisi rischio

- Data emissione: Attività assegnata a società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19/01/2022
- Note: a valle della conclusione delle indagini di caratterizzazione, per le quali è stato recentemente ricevuto riscontro da parte di ARPA Puglia alla modifica delle modalità esecutive su due punti d'indagine, verrà eseguita l'Analisi di Rischio in funzione dei dati analitici ottenuti.

Criticità

- **RDA 514/21** – Definizione punti di sondaggio in area su cui insiste una struttura interrata (canale di scarico stabilimento siderurgico) con conseguente ritardo nella definizione cronoprogramma; **Rinvenimento rifiuti compattati** in una porzione di area

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land D1 ID11 (III/III)



Fondi Allocati	2,30 M€
Estensione	3,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Indagini di caratterizzazione per suolo, sottosuolo e falda



Videoispezioni piezometro



Cumulo rifiuti



Rimozione rifiuti

Aggiornamento al 12.07.2022

Land E – Ex area Sidercomit (I/III)



Fondi Allocati	3,65 M€
Estensione	4,3 ha
SIN Taranto	Si

Caratteristiche intervento

Attività produttiva dismessa. Area industriale da avviare a cessione e/o provvisorio utilizzo da parte del personale ILVA in AS impiegato nella gestione delle aree escluse.

Esecuzione di caratterizzazione ambientale (procedimento SIN).

Attività eseguite o in corso

RDA 2392/21 – Indagini di caratterizzazione

- Data emissione: 09/12/2021; Ordine 80/22 del 10/03/2022
- Note: Ordine n.80/22 assegnato a società ENGEA CONSULTING S.R.L. in data 10/03/2022. Eseguiti predisposizione verbale di coordinamento per inizio attività, emissione PSC/POS, verifica ottenimento istanze autorizzative necessarie per inizio attività. Emessa RDA 674/22 ed assegnato ordine per smaltimento amianto rinvenuto in una porzione perimetrale dell'area; la relativa attività è stata eseguita. Trasmesso Piano operativo ad Arpa in data 18/05/22. Ricevuta risposta ufficiale da parte di Arpa per inizio attività in data 09/06/22. l' attività è iniziata il 9/06, come da cronoprogramma, ed ha previsto lo svolgimento delle indagini in contraddittorio con Arpa che, in data 23/06, ha indicato il 13/07 come data per il campionamento della falda. I sondaggi e i piezometri sono stati terminati in data 28/06. Il monitoraggio di falda è stato previsto per il 13/07, in riscontro al parere ARPA. Dovrà essere definita una nota di richiesta di proroga di 60 giorni al MiTE.

Aggiornamento al 12.07.2022

Land E – Ex area Sidercomit (II/III)



Fondi Allocati	3,65 M€
Estensione	4,3 ha
SIN Taranto	Si

Attività in agenda

RDA 647/22 – Rimozione e smaltimento vecchio serbatoio

- Data emissione: 11/04/2022; Emesso ordine 146/22 in data 13/06/2022
- Note: Individuato serbatoio da rimuovere e smaltire, predisposta ed approvata RDA. Effettuati quattro sopralluoghi. In data 29/06 il CSE ha comunicato di aver ricevuto tutta la documentazione dalla Serveco. Le attività hanno avuto inizio in data 04/07/22, con termine per il 05/07/22.

RDA 2353/21 – Analisi di rischio

- Scadenza: 22/07/2022 da prorogare per quanto evidenziato nella pagina precedente.

Aggiornamento al 12.07.2022

Land E – Ex area Sidercomit (III/III)



Fondi Allocati	3,65 M€
Estensione	4,3 ha
SIN Taranto	Si

Messa In Sicurezza di Emergenza della viabilità



Area pre intervento



Area post intervento



Area post intervento

Aggiornamento al 12.07.2022

Land I - Area a verde
vicino a Ospedale Nord (I/I)



Fondi Allocati	0,01 M€
Estensione	0,2 ha
SIN Taranto	No

Caratteristiche intervento

Area a verde non utilizzata per usi produttivi, lontana dalla zona industriale.

Ipotesi di cessione dell'area nell'attuale stato di fatto.

Attività eseguite o in corso

- Nessuna attività evidenziata

Attività in agenda

- Nessuna attività evidenziata

Criticità

- Nessuna criticità evidenziata

Aggiornamento al 12.07.2022

Land L – Cava L'Amastuola (I/I)



Fondi Allocati	3,35 M€
Estensione	128,2 ha
SIN Taranto	No
Destinazione	Cava di Calcare attiva

Sito sottoposto a specifica normativa di settore

Caratteristiche intervento

Sarà effettuato un piano di indagini ambientali preliminari ed a valle della definizione della destinazione d'uso e del progetto di recupero finale.

Il sito è interessato dalla presenza di una discarica di 2° categoria degli anni '80

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività eseguite o in corso

RDA 42/21 - Incarico direttore cava

- Data emissione: 11/01/2022; Ordine 3/22 del 18/01/2022
- Note: Ordine assegnato a professionista esterno; validità 1 anno
- Previsione fine attività: 31/12/2022

Attività in agenda

- Valutazione presenza rifiuti
- In fase di preparazione Specifica Tecnica ed RDA per incarico a professionista per studio di fattibilità per una discarica per rifiuti non pericolosi (Fanghi AFO e ACC), realizzata per un numero limitato di metri cubi (massimo 500.000) e per soddisfare solo ed esclusivamente le esigenze e le finalità di bonifica di Ilva. Lo studio di fattibilità deve prevedere la valutazione sulla presumibile presenza di rifiuti nella porzione di area così come si evince dalla documentazione pregressa trasmessa ad Arpa. E' in fase di finalizzazione la specifica tecnica per successiva richiesta della RDA.

Criticità

- Nessuna criticità evidenziata

Aggiornamento al 12.07.2022

Aree limitrofe a stoccaggio fanghi (I/I)



Fondi Allocati	12,90 M€
Estensione	4.1 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Caratteristiche intervento

Aree limitrofe all'area di stoccaggio fanghi AFO-ACC, dove attualmente insistono n. 4 vasche di raccolta acque meteoriche ed un’area pavimentata precedentemente attrezzata come deposito temporaneo.

L'area è attualmente utilizzata come base logistica per intervento rimozione fanghi.

Attività eseguite o in corso

- Nessuna attività evidenziata

Attività in agenda


- Nessuna attività evidenziata

Criticità

- Nessuna criticità evidenziata

Aggiornamento al 12.07.2022

Collinette ecologiche Tamburi (I/IV)

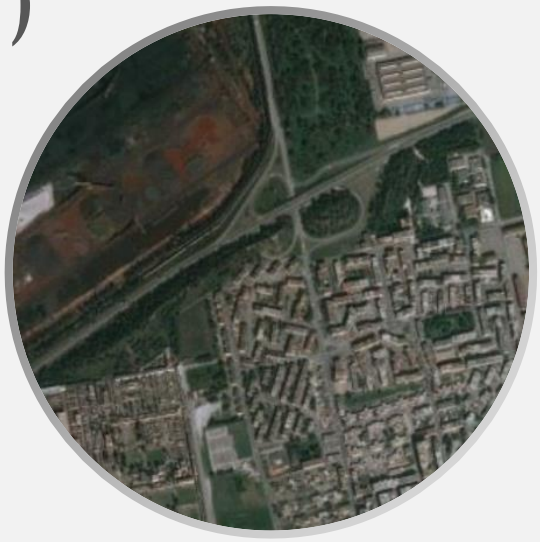

Fondi Allocati	37,50 M€
Estensione	9,6 ha
SIN Taranto	No

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Giudiziario da Febbraio 2019

Caratteristiche intervento

Intervento misure di precauzione per evitare spolverio alla collinetta n.3 (agosto 2019)
Indagini ambientali secondo il piano elaborato da ARPA (maggio 2019). Manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde delle tre collinette. Ripristino dell'impianto di irrigazione delle 3 collinette (cfr. Area Pozzo 25)

Attività eseguite o in corso

RDA 1588/21 - Rimozione e potatura alberi
- Data emissione: 23/07/21; Ordine 193/21 del 06/08/2021
- Note: Attività in corso, emessi 2 SAL, inviate 3 PEC di sollecito ad ANAS per ultimare i lavori sulla strada statale 7; Attualmente in attesa di risposta. Inviata PEC a Polizia Giudiziaria (Carabinieri del NOE), con breve aggiornamento della problematica dovuta al mancato riscontro dell'ANAS alle PEC ed ai solleciti. Sono in corso di valutazione misure ad hoc per superare la situazione di stallo.

RDA 2353/21 - Piano di caratterizzazione
- Data emissione: 01/12/2021. Ordine 7/22 emesso in data 19/01/2022
- Note: Elaborazione del documento in corso, prevista consegna entro il 20/07/2022

RDA 2448/21 - Ripristino tubo piezometrico collinetta 1
- Data emissione: 15/12/21; Ordine 96/22 del 31/03/2022
- Note: Ottenuta autorizzazione dal G.I.P. il 16/03/2022. Emesso ordine n.96/22.
- Attività eseguita il 22/04/2022

RDA 445/22 - Intervento miglioramento stato vegetativo collinette, sfalcio, concimazione, piantumazione nuovi alberi
- Emesso ordine 137 in data 23/05/22
- Note: Effettuati sopralluoghi in data 28/04/2022. Le attività sono in corso di esecuzione sulle Collinette 2 e 3.

Aggiornamento al 12.07.2022

Collinette ecologiche Tamburi (II/IV)



Fondi Allocati	37,50 M€
Estensione	9,6 ha
SIN Taranto	No

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Giudiziario
da Febbraio 2019

Attività in agenda

RDA 1515/21 - Campionamento ed analisi acqua di falda n.7 piezometri

- Data emissione: 14/07/21; Ordine 190/21 del 03/08/2021
- Note: Ricevuta autorizzazione da parte del PM, ricevuta notifica da parte della PG. Attività non eseguibile per Collinetta 1 fino al termine dell'attività di manutenzione su struttura rete frangivento che sta eseguendo ADI alla quale è stato richiesto il ripristino del pannello crollato e la verifica dell'intera struttura metallica. Le attività sulla collinetta 1 sono interdette per motivi di sicurezza, legati alla preventiva verifica strutturale dell'impianto "barriera frangivento" da parte di AdI. Tali lavori di messa in sicurezza sono iniziati in data 21/06 con previsione di 30 giorni lavorativi per la loro conclusione. Le attività di campionamento dei piezometri, per motivi di sicurezza, sono state effettuate nei giorni 21/06/22 e 22/06/22 in contraddittorio con ARPA, unicamente per quanto riguarda le Collinette 2 e 3. Nel corso della sua ispezione, ARPA ha eseguito una valutazione dello stato della vegetazione arborea ed erbacea delle Collinette 2 e 3, nonché una verifica dell'integrità della rete in fibre di cocco realizzata presso la Collinetta 3.
- Previsione fine attività: 30/09/2022

Criticità

- **RDA 1588/21** - In attesa di ANAS per ultimare i lavori sulla strada statale 7, inviate 3 PEC in data 26/11/2021, 15/12/2021 e 21/01/2022. Inviata il 26/04/2022 da ILVA in A.S. PEC a Polizia Giudiziaria (Carabinieri del NOE), con comunicazione del mancato riscontro da parte di ANAS.

Aggiornamento al 12.07.2022

Collinette ecologiche Tamburi (III/IV)



Fondi Allocati	37,50 M€
Estensione	9,6 ha
SIN Taranto	No

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Giudiziario
da Febbraio 2019

Indagini ambientali e interventi per miglioramento stato vegetativo



Carotatrice per indagini ambientali



Cassetta sondaggio



Rifacimento impianto di irrigazione

Aggiornamento al 12.07.2022

Collinette ecologiche Tamburi (IV/IV)



LEGENDA:
cc-sondaggi a carotaggio continuo; PZ-piezometri; TS-Top Soil;
Prefisso (s-) = spostato

Caratteristiche intervento

- Aprile 2019 - Indagini del top soil effettuate da ARPA (in attesa risultati completi ARPA)
- Luglio 2019 – Completate indagini del top soil da parte di ILVA (su piano ARPA)
- Agosto 2019 – Completato intervento per attuazione misure di precauzione - Collinetta 3
- Febbraio 2020 - Completata manutenzione straordinaria del verde
- Maggio 2020 – Formalizzata retrocessione «Collinette ecologiche» e «Area pozzo 25»
- Luglio 2020 - Completate indagini ambientali ed esiti trasmessi a Procura ed ARPA
- Aprile 2021 – ARPA chiede integrazioni documentali, trasmesse a giugno 2021
- Giugno 2021 – Deposito Analisi di Rischio sanitario-ambientale presso la Procura di Taranto
- Settembre 2021 Marzo 2022 - Esecuzione manutenzione straordinaria del verde (In attesa risposta Anas per chiusura carreggiata della SS7)

Sintesi risultati indagini 2020:

- Generale conformità di top soil e terreni alle CSC per aree ad uso industriale.
- Diffuse non conformità ai valori di riferimento al test di cessione per i riporti.
- Alcuni superamenti delle CSC in falda, con sostanziale assenza di correlazione ai parametri non conformi al test di cessione.

Sintesi risultati analisi di rischio 2021:

- Assenza di rischio sanitario ed ambientale correlato ai materiali che costituiscono i rilevati;
- Assenza di rischio sanitario sia per i soggetti esposti all'interno delle aree (lavoratori) sia per la popolazione residente all'esterno delle aree stesse (adulti e bambini)

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land D2 ID17 (I/II)



Fondi Allocati	0,10 M€
Estensione	0,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive

Presenza di una chiesetta – Ipotesi di cessione ad Enti culturali o religiosi.

Attività eseguite o in corso

RDA 2353/21 - Analisi di rischio

- Attività assegnata a società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19/01/2022.
- Note: Consegnata bozza dell'elaborato da parte del fornitore. Attualmente in fase di finalizzazione per trasmissione agli enti. Da CDU per vincoli culturali l'area ricade in colonna A per l'analisi di rischio. Consegnata da parte di Engea in data 8/06/22 per successiva trasmissione da parte dei Commissari agli enti preposti insieme al cronoprogramma di restituzione degli elaborati delle altre AdR, in riscontro alla richiesta del MITE del 30/12/2021. Invio del documento previsto entro il 20/07/22.

Attività in agenda

Recupero architettonico chiesetta

- Valutazione in corso sulla possibilità di un restauro della chiesetta presente sull'area. Avvenuto incontro con la Sovrintendenza ai Beni Culturali il 22/04/2022. Consegnata presso gli uffici della Sovrintendenza la documentazione "Strumenti urbanistici Land D2". Avvenuto incontro di sopralluogo con architetto della Sovrintendenza il 11/05/2022.

RDA 855/22 - Progetto di messa in sicurezza strutturale, restauro e recupero conservativo del fabbricato

- Data emissione: 17/05/2022
- Note: Emessa ed approvata RDA di incarico a professionista per la realizzazione di un progetto architettonico mirato al recupero strutturale.

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Land D2 ID17 (II/II)



Fondi Allocati	0,10 M€
Estensione	0,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Indagini di caratterizzazione per suolo, sottosuolo e falda



Carotatrice per indagini ambientali



Cassetta sondaggio

Area Pozzo 25 (I/III)



Fondi Allocati	0,39 M€
Estensione	0,5 ha
SIN Taranto	Si

Caratteristiche intervento

Area a verde nella quale è ubicato il Pozzo 25, con il relativo impianto di sollevamento di acqua di falda, destinato ad uso irriguo ed antincendio per le "Collinette ecologiche Tamburi". Area NON sottoposta a sequestro, ma funzionalmente collegata a area sequestrata "Collinette ecologiche Tamburi". Le due aree sono disgiunte e distanti circa 300 m. Attività richieste:

- Ripristino funzionalità Pozzo 25 e connessi impianti di sollevamento ed adduzione, compresa sezione di distribuzione presso le collinette (completato in Giugno 2021)
- Caratterizzazione ambientale (procedimento SIN)

Attività eseguite o in corso (I/II)

Rinnovo concessione emungimento acque sotterranee Pozzo 25

- Note: Procedura avviata, Pagamento arretrati effettuata. *E*messa specifica tecnica per impianto ad osmosi inversa per produzione di acqua di alta qualità a scopo irriguo. Emessa richiesta di pagamento (RDP) n. 2353/21 riguardo canoni arretrati relativi ad anni 2018-2021 per concessione 396/2017, relativa ad utilizzo acque sotterranee. Emessa RDP n. 2356-2357-2358 per il rinnovo concessione 396/2017, relativa a utilizzo acque sotterranee attraverso Pozzo 25 per gli anni 2022-2026. Versamenti effettuati. Istanza inviata telematicamente il 6/6/2022 al SIT Puglia a alla Provincia di Taranto. Da quella data si è in attesa di riscontro da parte della Provincia.

RDA 444/22 - Installazione impianto ad osmosi inversa

- Data emissione: 17/03/2022. Emesso ordine 118/22 in data 04/05/2022
- Note: In corso interlocuzioni con Provincia e Consorzio ASI per autorizzazione scarico acque reflue impianto. Richiesto ufficialmente un incontro presso sede Provincia Taranto con Dirigente di riferimento. In data 26/05/22, tramite PEC, Provincia e ASI sono state invitate a partecipare ad un incontro. Inviato nuovo sollecito in data 22/06. In corso di valutazione nuove misure di sensibilizzazione dell'ente competente.
- Previsione fine attività: *n.d*

Criticità

Riguardo la gestione dei reflui dell'impianto di osmosi, si è in attesa di incontro con il responsabile della Direzione Ambiente della Provincia di Taranto, al fine di avviare l'iter autorizzativo. Si fa presente che più volte ILVA in as ha sollecitato a mezzo PEC l'Ente in esame senza ricevere ad oggi alcuna risposta. La definizione di tale autorizzazione è fondamentale per poter alimentare l'impianto di irrigazione del verde delle collinette ecologiche.

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Pozzo 25 (II/III)



Fondi Allocati	0,39 M€
Estensione	0,5 ha
SIN Taranto	Si

Attività eseguite o in corso (II/II)

RDA 581/22 - Campionamento acqua di falda

- Data ultima emissione: 29/03/2022
- Nota: Emesso ordine n.103/22. Attività prevista il 12/04/2022, non eseguita causa mancanza elettricità al quadro della pompa del Pozzo 25. Attività eseguita in data 14 giugno. In data 1/07/22 sono stati ricevuti gli esiti analitici. E' stata inviata la comunicazione alla Provincia relativa agli esiti e ai volumi emunti

RDA 493/22 - Incarico per Progettazione, DL, CSE per impianto osmosi e indagini di caratterizzazione

- Data emissione: 16/03/2022.
- Note: Approvata RDA. In attesa dell'offerta economica da parte del fornitore, già individuato. In data 27/06 è stata inviata una nuova offerta, che attualmente è in fase di valutazione.

Attività in agenda

RDA 543/22 - Indagini di caratterizzazione

- Data emissione: 24/03/2022; Ordine assegnato ad Engea in data 20/06/2022
- Note: In data 13/05/22 è stata richiesta ad Adl documentazione integrativa. Ricevuto riscontro in data 30/05/2022 con cui Adl ha comunicato di non aver rinvenuto alcun documento. In corso di approvazione RDA integrativa per incarico di DL/CSP/CSE/RL da RDA 493/22.
- Scadenza: 09/09/2022

Aggiornamento al 12.07.2022

Area Pozzo 25 (III/III)



Fondi Allocati	0,39 M€
Estensione	0,5 ha
SIN Taranto	Si

Ripristino impianto di emungimento dell'acqua utilizzata per irrigazione delle Collinette Ecologiche



Ripristino pompa di emungimento


ILVA in A.S.
