

ILVA in A.S.

Aggiornamento Piano Ambientale Aree Escluse
Osservatorio del 29.03.2023

22 Marzo 2023

Monitoraggio Aree Escluse

Introduzione & Contesto

Cruscotto riassuntivo avanzamento interventi sulle Aree Escluse


Dettaglio avanzamento interventi sulle Aree Escluse

Monitoraggio Aree Escluse

- Introduzione & Contesto
- Cruscotto riassuntivo avanzamento interventi sulle Aree Escluse
- Dettaglio avanzamento interventi sulle Aree Escluse

467 M€ di fondi di Patrimonio Destinato allocati ad interventi di bonifica delle Aree Escluse

Allocazione fondi Patrimonio Destinato (M€)

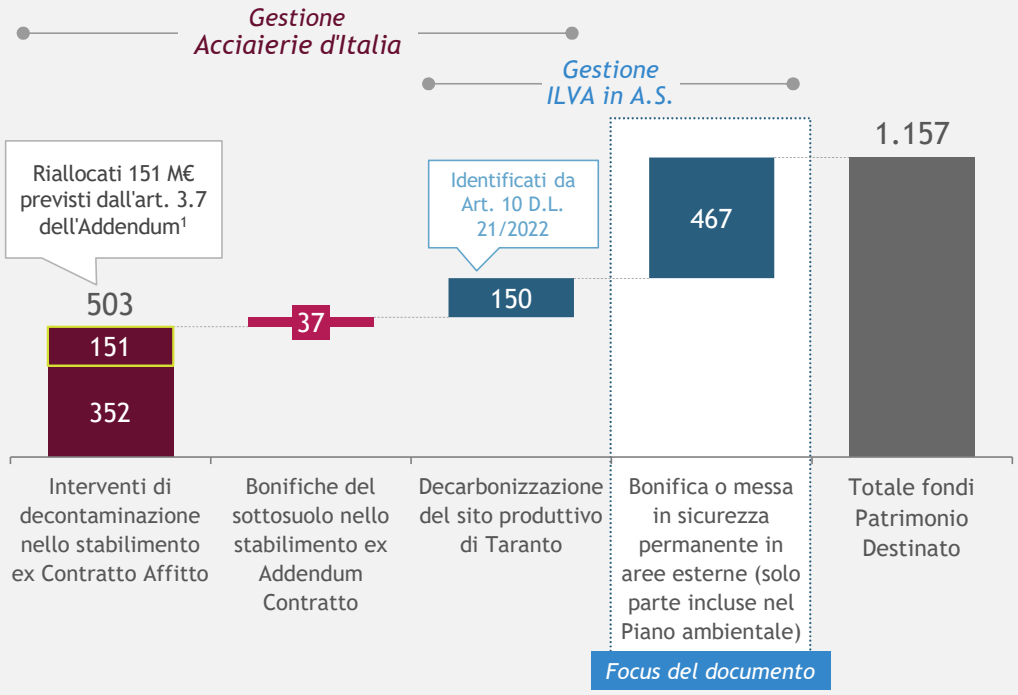

Aggiornamento al 28.02.2023


Sulla base dell'art.3 DL 1/2015, gli interventi finanziati con il Patrimonio Destinato sono **oggetto di apposite "Relazione", "Rendicontazione" e "Informativa"** che i Commissari Straordinari trasmettono periodicamente alle Camere, al MiTE, al MiSE e alle Autorità giudiziarie di Taranto e Milano

Con l'art.10 del DL 21/2022 sono stati destinati **150 M€** del Patrimonio Destinato **ad interventi di decarbonizzazione** per il sito produttivo di Taranto

Il **monitoraggio** degli interventi sulle Aree Escluse con l'introduzione di un **report dedicato da condividere bi-settimanalmente** con i responsabili di Direzione ILVA SpA in AS

1. Ammontare originariamente previsto per bonifiche del sottosuolo nello stabilimento

Allocati Fondi per 443 M€, di cui 434 M€ per Taranto

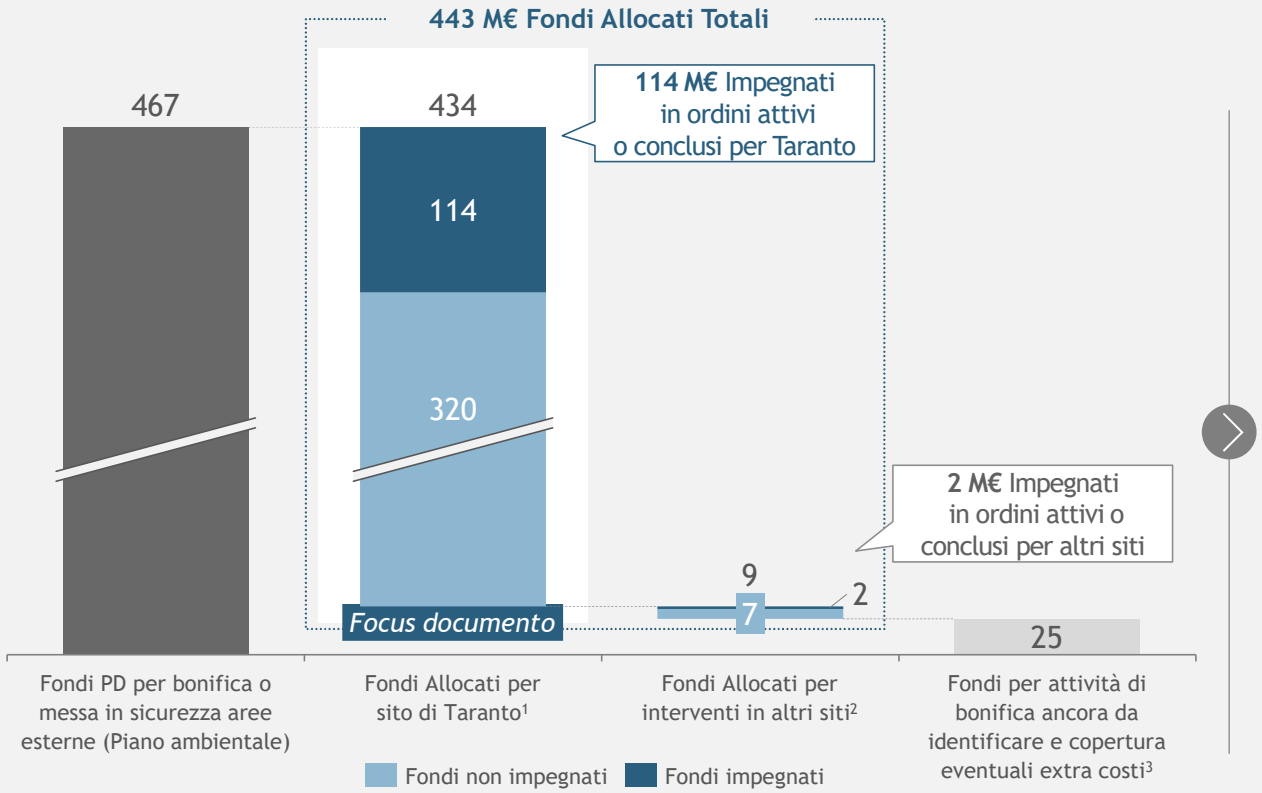


Aggiornamento al 28.02.2023

467 M€ di Fondi PD in gestione ad ILVA in A.S., di cui:

- 443 M€ allocati come segue:
  - 434 M€ per interventi nei pressi di Taranto (di cui 114 M€ impegnati, di cui 60 M€ Pagati e 54 M€ allocati ad ordini confermati non pagati)
  - 9 M€ per interventi in altre aree[2]
- 25 M€ da allocare

1. Include i comuni di Taranto, Statte e Crispiano 2. Include i siti di Patrica, Varzi e Torino 3. Ad esempio per attività che possono emergere dopo caratterizzazione (es. Area Fanghi)
Nota: I numeri potrebbero non sommare perfettamente a causa degli arrotondamenti

18 Aree Escluse dal perimetro di cessione ad AdI classificate in 4 gruppi

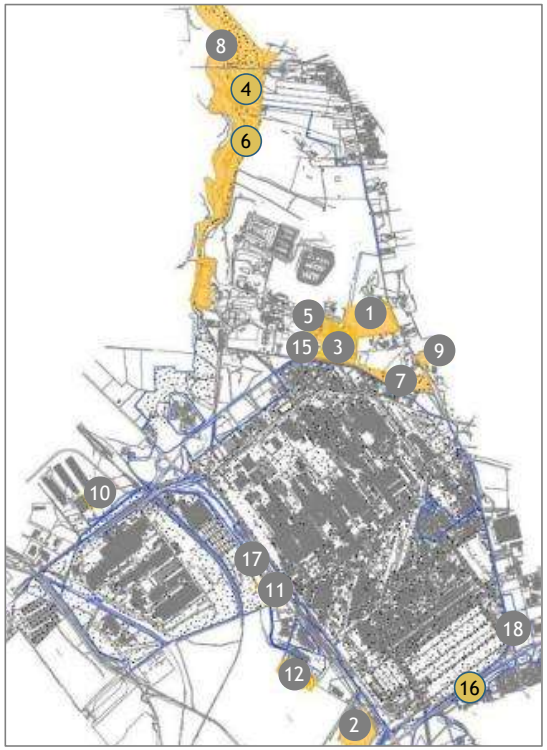

1 Discarica Ex Cava Due Mari
2 Discarica Ex Cava Cementir
3 Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC
4 Discarica NordOvest & Area Fintecna
5 Discarica Nuove Vasche
6 Gravina Leucaspide
7 Aree a verde lungo SP Statte lato ovest
8 Aree a verde NORD
9 Land A – Area a verde
10 Land C – Area a verde adiacente a stabilimento
11 Land D1 - Area a verde adiacente a stabilimento
12 Land E – Sito industriale non attivo ex Sidercomit
13 Land I – Area a verde adiacente ad Ospedale Nord
14 Land L - Cava L'Amastuola
15 Aree limitrofe stoccaggio fanghi
16 Collinette ecologiche Tamburi
17 Land D2 - Area a verde con chiesetta
18 Area Pozzo 25


Aree sottoposte a Sequestro con Interventi in corso
Aree con interventi in corso
Aree in manutenzione e con procedimento da definire
Aree cedibili e prive di pendenze

Area in Perimetro Sito Interesse Nazionale (SIN) di Taranto
Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN di Taranto

Nota: Non rappresentate aree non adiacenti allo stabilimento produttivo (Voce 13 – Land I e Voce 14 - Land L) con superficie complessiva di 128.4 ettari

Fonte: ILVA

5 Aree Escluse legate a Prescrizioni del DPCM 29/09/2017

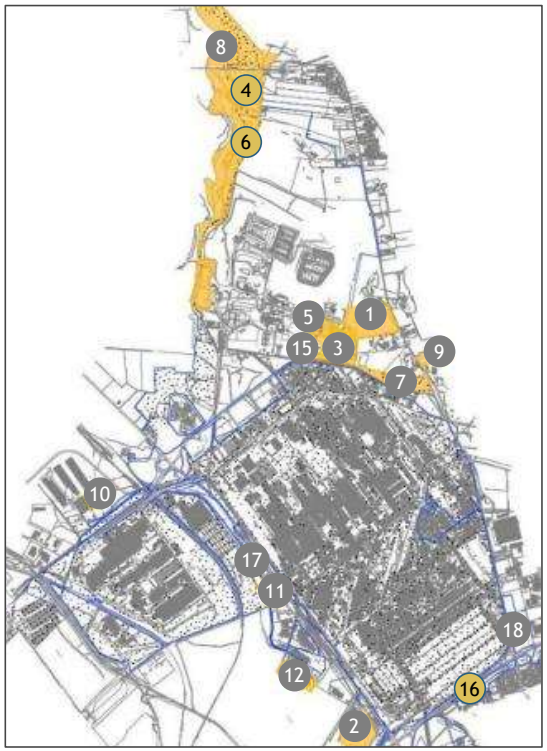

1 Discarica Ex Cava Due Mari (UA5)

2 Discarica Ex Cava Cementir (UA25)

3 Stoccaggio Fanghi AFO ed ACC (UP3)

4 Discarica NordOvest & Area Fintecna (UP4 – UP7)

5 Discarica Nuove Vasche (UP8)

Aree sottoposte a Sequestro con Interventi in corso

Aree con interventi in corso

Aree in manutenzione e con procedimento da definire

Aree cedibili e prive di pendenze

Area in Perimetro Sito Interesse Nazionale (SIN) di Taranto

Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN di Taranto

Nota: Non rappresentate aree non adiacenti allo stabilimento produttivo (Voce 13 – Land I e Voce 14 - Land L) con superficie complessiva di 128.4 ettari

Fonte: ILVA

Monitoraggio Aree Escluse

Introduzione & Contesto

Cruscotto riassuntivo avanzamento interventi sulle Aree Escluse

Dettaglio avanzamento interventi sulle Aree Escluse

Monitoraggio Aree Escluse

Introduzione & Contesto

Cruscotto riassuntivo avanzamento interventi sulle Aree Escluse

Dettaglio avanzamento interventi sulle Aree Escluse

Aggiornamento al 22.03.2023

Recap interventi in corso o pianificati (I/V)

Aggiornamento dati finanziari al 28 febbraio 2023

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
1 Due Mari	UA5	Adeguamento copertura sommitale (d.lgs. 36/03) Copertura scarpata nord - Opere accessorie e impianti - Monitoraggi ex DL 1/2015 (fino al 28/08/2023)	10/01/2022	5.05	6.20 +1.15 M€ vs budget	5.63 + 585 k€ vs budget	5.70 + 655 k€ vs budget	14.0	• Piano di indagini ditta incaricata da e-distribuzione: in attesa dei risultati definitivi entro il 31/03/23 • Caratterizzazione e smaltimento rifiuto deposito temporaneo: ricevute analisi definitive del campionamento in data 24/02/23
2 Cementir	UA25	Adeguamento copertura sommitale – Rifacimento diaframma plastico perimetrale - Opere accessorie e impianti -Smaltimento percolato - Monitoraggi ex DL 1/2015 - Bonifica falda – Presentata al MITE variante di progetto con Fondo Allocato soggetto a revisione	08/02/2023	16.75	17.61 + 839 k€ vs budget	13.58	15.14	8.9	• Progetto MISP: Capping concluso • Opere accessorie residuali: Consegna progetto Riccoboni per il 30/03/23, posa biostuoia e piantumazione nel periodo aprile-maggio • Impianto energia elettrica: assegnato ordine fornitura, in attesa di allaccio entro il 31/03/2023 • Trasmessi report MISE II ed esiti Indagini integrative stratigrafiche agli Enti • PM&C riscontrato da ARPA, con richiesta di estensione a tutte le Aree Escluse. Trasmesso PM&C della falda per tutte le Aree Escluse e riscontro al PM&C ex Cava Cementir
3 Fanghi AFO/ACC	UP3	Rimozione di circa 490.000 t fanghi AFO e fanghi ACC - Caratterizzazione ambientale - Monitoraggi falda - Bonifica suolo superficiale e ripristino ambientale	23/08/2023	75.03	80.12 +5.09 M€ vs budget	25.22	27.87	7.0	• In corso smaltimento fanghi operato da 3 società • Messa in riserva R13: iniziata attività di realizzazione area impermeabilizzata in data 07/03/23 - trasmessa istanza di differimento termine di presentazione di garanzia finanziaria in data 15/03/2023 • Spostamento fanghi in R13: in fase di assegnazione ordine

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Aggiornamento al 22.03.2023

Recap interventi in corso o pianificati (II/V)

Aggiornamento dati finanziari al 28 febbraio 2023

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
4 Nord Ovest ed Ex Area Fintecna	UP4-UP7	Copertura per superficie totale (ex UP4-UP7) - Indagini integrative - Monitoraggi ex DL 1/2015 (fino al 28/08/2023)	23/08/2023	12.00	0.40	0.03	0.07	12.9	• Aggiornamento MISP: trasmesse istanze agli Enti per indagini preliminari alla progettazione il 03/02/23 e il piano operativo ad ARPA il 10/02/23. Si resta in attesa del parere di VINCA. • Piezometro 6/90/I/FP: terminata la realizzazione in data 06/03/2023. Prelevati campioni in contraddittorio con ARPA Puglia in data 11/02/2023.
5 Discarica Nuove Vasche	UP8	Gestione post-operativa e controlli (30 anni)	31/07/2048	3.00	2.79	1.69	2.08	3.6	• Progetto Op. di potenziamento rete raccolta acqua meteoriche: ricevuta documentazione progettuale in data 03/03/2023. • Campionamento percolato: ricevuti esiti analitici in data 24/02/2023
6 Gravina Leucaspide	-	Messa in sicurezza del rilevato (erosione)	*Da definire*	226.60	1.21	0.23	0.31	46.5	• Sondaggi ambientali: eseguiti tutti i 13 sondaggi geotecnici previsti sugli argini. Campionamento ambientale in contraddittorio con ARPA in SG6 in data 31/01/2023 e SG13 in data 16/03/2023. Eseguiti 3 sondaggi ambientali su 7 nelle vasche (vasca 1-2) in contraddittorio con ARPA su SA2 in data 09/03/2023 e SA3 in data 16/03/2023. • PdC: in fase di deposito alla Procura presso il Tribunale di Taranto dell'istanza di autorizzazione all'accesso all'area sottoposta a sequestro preventivo per effettuare i sopralluoghi
		Indagini ambientali in zone con moderate difficoltà di accesso (Piano Onofrio)	28/02/2022						
		Indagini ambientali e geotecniche in zone attualmente non accessibili	31/12/2022						
		Monitoraggio in continuo del rilevato	31/12/2022						
		Eventuale intervento di bonifica/ messa in sicurezza permanente (dopo esecuzione piano delle indagini ambientali - Monitoraggio annuale falda 31/12/2022	*Da definire*						

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Aggiornamento al 22.03.2023

Recap interventi in corso o pianificati (III/V)

Aggiornamento dati finanziari al 28 febbraio 2023

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
7 Aree a verde lungo SP Statte lato ovest	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	4.88	0.21	0.13	0.13	6.9	• AdR: trasmessa in data 01/03/23 • Recinzione: valutazione positiva CILA dal comune di Statte. Verifica del DL delle prescrizioni SNAM per metanodotto • Segnalato il rinvenimento di rifiuti abbandonati al Comune di Statte nell'area limitrofa. ILVA sta provvedendo alla rimozione dei rifiuti rinvenuti nell'area di sua proprietà.
8 Aree a verde NORD	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	18.40	0.80	0.53	0.59	26.7	• AdR in fase di trasmissione
9 Land A	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino delle condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	2.16	0.50	0.30	0.30	3.0	• Recinzione: SCIA approvata dal Comune di Taranto • PIP: concluse attività operative in data 09/03/23. In attesa degli esiti analitici
10 Land C	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale	31/12/2021 (In proroga)	1.29	0.07	0.06	0.06	1.8	• Indagini di caratterizzazione: distrutte 8 cassette su 12 dei sondaggi effettuati, causa incendio e presentata querela in data 16/06/22 • AdR: comunicazione MASE del 27/02/23 dei motivi ostativi alla conclusione del procedimento. Riscontro ILVA del 09/03/23 con conferma di prosecuzione del procedimento con implementazione della rete piezometrica • ILVA presenterà istanza di conclusione del procedimento di bonifica per la matrice terreno

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Aggiornamento al 22.03.2023

Recap interventi in corso o pianificati (IV/V)

Aggiornamento dati finanziari al 28 febbraio 2023

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
11 Land D1	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale	31/12/2021 (In proroga)	2.30	0.17	0.15	0.15	3.1	• Riattivazione PdC con attività integrative a seguito di rinvenimento di rifiuti compattati • Verifiche di stabilità strada: effettuati sopralluoghi con le ditte in data 08/03/23 per assegnazione ordine
12 Land E (Sidercomit)	-	Caratterizzazione suoli e falda, compresi controlli e prestazioni accessorie - Bonifica falda - MISP terreni (pavimentazione)	22/07/2022 (In proroga)	3.65	0.11	0.10	0.11	4.3	• Validazione indagini PdC: ricevuta da ARPA richiesta RDP mancante, in fase di trasmissione RdP mancante
13 Land I	-	Gestione generale	-	0.01	-	-	-	0.2	• Assenza di criticità ambientali, possibile cessione dell'area
14 Land L (cava L'Amastuola)	-	Chiusura cava - Caratterizzazione suolo, sottosuolo e falda - Ripristino ambientale	*Da definire*	3.35	0.14	0.01	0.01	128.2	• PdC: trasmesso in data 27/01/23. In attesa indizione CdS regionale.

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Aggiornamento al 22.03.2023

Recap interventi in corso o pianificati (V/V)

Aggiornamento dati finanziari al 28 febbraio 2023

Area	Prescr.	Intervento	Termine	Fondi (M€) Allocati	Impegnati[1]	Pagato	Fatturato	Dimensione (ettari)	Principali evidenze/Criticità
15 Aree limitrofe a stoccaggio fanghi	-	Caratterizzazione suoli e falda, compresi controlli e prestazioni accessorie - Monitoraggi falda - Bonifica e ripristino suolo superficiale	23/08/2023	12.90	-	-	-	4.1	• Area impiegata come base logistica per esecuzione rimozione fanghi • Nessuna attività in corso e in agenda • Previsto PdC al termine operazione fanghi
16 Collinette ecologiche Tamburi (1)	-	Caratterizzazione e messa in sicurezza - Monitoraggi	*Da definire*	37.50	0.99	0.79	0.80	9.6	• PdC: indetta CDS asincrona per la quale dovranno pervenire i pareri di tutti gli EE.PP. entro il 07/04/23 • Monitoraggio falda: pianificati nuovi campionamenti per il 21-22-23/03/23 (campionamento previsto per il 21/03/23 non eseguite per condizioni meteo avverse)
17 Land D2 (chiesetta)	-	Gestione generale (verde, manutenzione, rifiuti)- Caratterizzazione suolo/sottosuolo compresi controlli e prestazioni accessorie Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo, ripristino condizioni ambientali	31/12/2021 (In proroga)	0.10	0.06	0.05	0.05	0.1	• AdR: eseguita attività di rilievo freatimetrico in data 28/02/23 relativa al primo trimestre
18 Area Pozzo 25	-	Caratterizzazione suolo e sottosuolo, compresi controlli e prestazioni accessorie - Caratterizzazione falda - Bonifica soprassuolo e ripristino ambientale - Ripristino impianto emungimento acqua per irrigazione «Collinette ecologiche»	09/09/2022 (In proroga)	0.39	0.24	0.07	0.07	0.5	• Impianto di osmosi: conclusa fase tecnico-progettuale. I progettisti devo presentare richiesta di SCIA al comune di Taranto. Inoltre, presenteranno AUA al SUAP per l'autorizzazione scarico parziale nel canale ASI • Validazione indagini PdC: inviati Rdp in data 25/11/23, in attesa di riscontro ARPA • Analisi acque concessione emungimento pozzo: RdP da trasmettere alla Provincia entro il 22/03/23 • ILVA presenterà istanza di conclusione del procedimento di bonifica per la matrice terreno

(x) Aree cedibili e prive di pendenze — (x) Aree con interventi in corso — (x) Aree in manutenzione e con procedimento da definire — (x) Aree sottoposte a Sequestro con interventi in corso — Area in Perimetro SIN[2] di Taranto — Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN[2] di Taranto

1. Fondi impegnati in ordini in corso o conclusi 2. Sito di Interesse Nazionale

Monitoraggio Aree Escluse

Introduzione & Contesto

Cruscotto riassuntivo avanzamento interventi sulle Aree Escluse

Dettaglio avanzamento interventi sulle Aree Escluse

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Due Mari (I/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività completata

Caratteristiche intervento

Messa in sicurezza permanente (MISP) esplicata attraverso le seguenti fasi:

1. Scavo e sbancamento del terreno vegetale;
2. Regolarizzazione e messa in opera del nuovo capping con pacchetto RNP secondo D.Lgs. 36/03;
3. Copertura su argine Nord della discarica costituita da uno strato di materiale vegetale strutturato e da un rilevato in terra rinforzata integrata con stesura di tessuto sintetico geogriglia e biostuoia;
4. Realizzazione sistema di regimazione e captazione acque meteoriche superficiali mediante fossi di guardia e canalette in cls prefabbricate perimetrali;
5. Realizzazione di una vasca di sedimentazione, trincea drenante, sistema di vasche di accumulo con captazione delle acque verso impianto di irrigazione;
6. Realizzazione di viabilità di accesso sommità capping e piantumazione di specie arboree.

Attività 1



Sbancamento terreno vegetale

Attività 2



Stratigrafia capping

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Due Mari (II/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività completata

Attività 3



Copertura scarpata Nord

Attività 4



Fossi di guardia



Canalette perimetrali in cls prefabbriacato

Attività 5



Vasca di sedimentazione

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Due Mari (III/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività completata



4 vasche di accumulo attrezzate con elettropompe



Sistema di irrigazione

Attività 6



Viabilità di accesso al capping

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Due Mari (IV/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività completata

Attività eseguite o in corso

RDA 2482/21 - Monitoraggio falda 2022
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordine n.8/22 in data 20/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi. Ricevuto elaborato progetto esecutivo e Relazione stato di avanzamento lavori da Ing. Basile richiesti da ARPA (con nota prot. 27631 del 21/04/2021);
- Previsione fine attività: 31/12/2022

RDA 629/20 - Fornitura energia elettrica per uso cantiere
- Data emissione: 04/03/2020
- Note: emesso ORD. 504/20 per la fornitura di energia elettrica per uso cantiere, È stato richiesto dal MITE ad e-distribuzione il Piano di Caratterizzazione ai fini dell'installazione dell'elettrodotto.
- ILVA in AS è in attesa di ricevere documentazione relativa alla sottoscrizione della servitù per dare la possibilità ad e-distribuzione di installare un palo all'interno dell'area di proprietà di ILVA in AS. In data 15 febbraio 2023 effettuato il piano di indagini da parte di ditta incaricata da e-distribuzione, si attendono i risultati definitivi entro il 31 marzo 2023.

RDA 82/23 - Campionamento ed analisi rifiuto deposito temporaneo
- Data emissione: 16/01/2023
- Note: In data 16 gennaio 2023 è stata predisposta la specifica tecnica ed inviata la relativa RDA, assegnato ordine in data 10/02/2023. Effettuato il campionamento in data 14 febbraio 2023, analisi definitive ricevute in data 24 febbraio 2023, specifica tecnica relativa allo smaltimento in fase di elaborazione

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Due Mari (V/V)



Fondi Allocati	5,05 M€
Estensione	14,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività completata

Attività in agenda

Esecuzione basette per rilievo topografico
- Note: Specifica tecnica in fase di elaborazione
- Data ultima per esecuzione attività: 21/12/2022

Cronoprogramma intervento

Attività completata: redatta relazione di fine lavori da parte del progettista/direttore lavori

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (I/XII)



Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Caratteristiche intervento

Messa in sicurezza permanente[1] **(MISP):** messa in opera di capping RNP e sistema definitivo di estrazione percolato; Completo rifacimento del diaframma perimetrale. Monitoraggio periodico falda. **Messa in Sicurezza di** Emergenza (MISE): emungimento percolato da n. 4 pozzi.

Piano di monitoraggio: Trasmesso in data 28 settembre 2022 piano di monitoraggio e controllo come da decreto 116/22. In data 16 dicembre 2022 è stato trasmesso il report di MISE a tutti gli enti competenti. Il MASE ha sollecitato ARPA ed ISPRA ad esprimere parere in riferimento al piano di monitoraggio, inoltre nella stessa nota MASE ha sollecitato ILVA in AS a presentare un piano di monitoraggio della falda complessivo di tutte le aree escluse in gestione. Ilva provvederà a trasmettere una relazione sugli esiti dei monitoraggi eseguiti in autocontrollo per le aree escluse specificando quanto già trasmesso precedentemente. Intanto il MASE ha invitato gli enti, ARPA Puglia e Provincia di TA ad esprimersi sulla correttezza delle misure adottate nel PMC. Ricevuto in data 2 marzo 2023 parere da parte di ARPA ed ISPRA, relativo al piano di monitoraggio e controllo, il parere evidenzia che il piano di monitoraggio e controllo di ILVA non contempla tutte le aree escluse e che quindi non risponde a quanto richiesto dagli enti competenti. ATO sta predisponendo riscontro al suddetto parere. ATO ha predisposto ed inviato documentazione tecnica di riscontro alla richiesta del MASE Relazione tecnico legale: Elaborata relazione tecnico-legale, sul progetto di MISP, in risposta alle obiezioni ricevute dalla commissione parlamentare d'inchesta e da ARPA, nel corso della loro visita ispettiva del 14 luglio 2022. Inviata il 10/02/2023 nota di approfondimento a valle dei sondaggi geognostici eseguiti nelle intercapedini dei diaframmi Cotecchia-Basile volti ad acclarare la natura del materiale presente.

Attività eseguite o in corso (I/V)

Capping e diaframma plastico discarica ex Area Cementir (RDA 1655/19, 982/20, 1047/20, 851/21, 1861/21, 703/19_var.) (I/II)

- Data emissione: 15/10/2019
- Note: Approvata variante di progetto il 15/02/2022 in Conferenza dei Servizi, ricevuto decreto da parte del Ministero il 28/03/2022, emesso ordine per variante di progetto a favore della sociatà Riccoboni. Il 15/04/2022 emesso ordine di servizio da parte del Direttore dei Lavori, per la ripresa totale delle lavorazioni secondo variante di progetto. Formalizzata, tramite verbale, dopo sopralluogo effettuato in data 22/04/2022, la concessione delle nuove aree per la realizzazione del progetto di variante. Stato di avanzamento:
  - Realizzazione del diaframma plastico: 100%,
  - Posa di argilla sul capping: 100%,
  - Posa del materassino drenante: 100%,
  - Posa del terreno vegetale: 100%,
  - Rivestimento con telo HPDE: 100%,
  - Installazione delle canalette perimetrali: 100%,
  - Terre rinforzate: 100%,
  - Stato di avanzamento complessivo: 98%.

1. Progetto approvato con Legge 20/2015. Variante approvata con D. M. del 19.10.2018

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (II/XII)



Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso (II/V)

Capping e diaframma plastico discarica ex Area Cementir (RDA 1655/19, 982/20, 1047/20, 851/21, 1861/21, 703/19_var.) (II/II)

La Riccoboni comunica di essere in ritardo rispetto al cronoprogramma e che conta di ultimare le attività entro il 31 marzo 2023 rispetto alla data dell'8 febbraio 2023 (come da decreto ministeriale). Il DL ha inviato relativa nota di contestazione intimando di rispettare il cronoprogramma. Ricevuta risposta da ADI sul canale di scarico delle acque meteoriche a seguito di numerosi solleciti da parte di ILVA e di una nota informativa al MASE. Eseguito sopralluogo per la consegna dell' area in data 3/03/2023. Il Dl ha presentato il lay-out dell'area picchettata al referente ADI per formale accesso. Si è in attesa di riscontro da parte di ADI. La posa della biostuoia e la piantumazione saranno effettuate nel periodo primaverile (aprile-maggio)

RDA 918/22 - nr. 3 indagini stratigrafiche diaframma plastico

- Data emissione: 25/05/2022
- Note: Da sopralluogo effettuato in data 24/05/2022, si è preso atto della formazione di una depressione di circa 60-70 cm dal piano campagna e della conseguente deformazione della correa ubicata sul versante ENI. Considerata la presenza della ditta Toma Abele presso il cantiere ex cava Cementir nelle nuove aree concesse da Cemitaly, è stata emessa una RDA come integrazione all'ordine per eseguire 3 sondaggi geologici nella zona interessata dal problema, con il fine di acquisire ulteriori informazioni sulla stratigrafia del sottosuolo, sia per verificare la tenuta del diaframma già realizzato che per valutare se porre in essere specifiche misure per i pannelli di prossima posa.

RDA 2128/21 - nr. 11 indagini stratigrafiche diaframma plastico

- Data emissione: 03/11/2021
- Attività completata in data 25/05/2022. Sono stati ricevuti i risultati delle indagini stratigrafiche dalla società Toma Abele.

RDA 537/22 e RDA 372/22 - Messa in sicurezza acqua falda ex Cementir

- Data emissione: 25/02/2022; Emesso ordine n.95/22 in data 29/03/2022
- Note: 1° intervento effettuato il 07/04/2022, 2° intervento effettuato il 13/04/2022, 3° intervento effettuato il 21/04/2022. 4° intervento effettuato per il 28/04/2022. Ricevuta relazione Engea sui risultati raggiunti e sulle attività da eseguire successivamente con indicazione delle misure della fase 2 della MISE.
- Preparata la specifica tecnica per la fase 2 della MISE in relazione alla falda freatica. Emessa relativa RDA 1147/22 in data 11/07.
- Previsione fine attività: Attività completata

1. Progetto approvato con Legge 20/2015. Variante approvata con D. M. del 19.10.2018

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (III/XII)




Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Planimetria di stato avanzamento del diaframma plastico come da progetto di Variante 2021

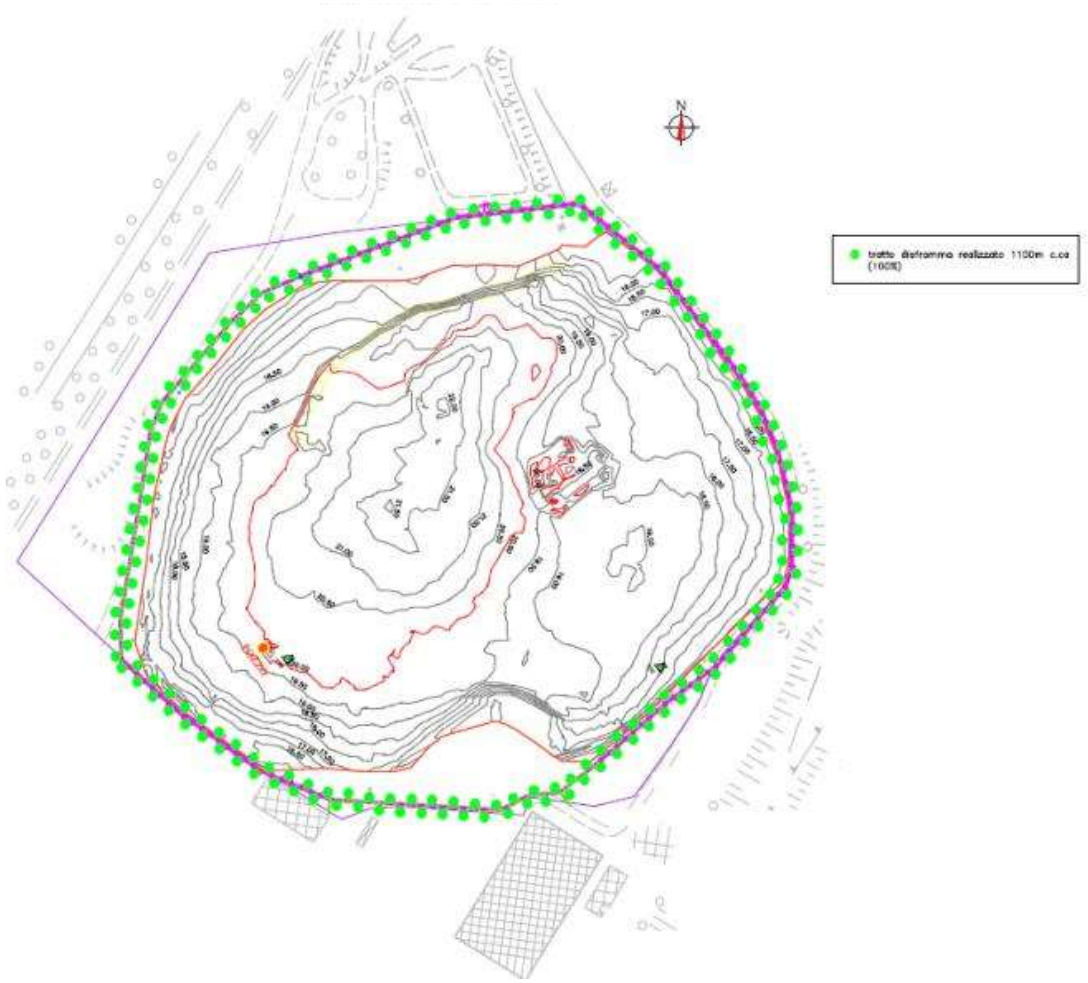

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (IV/XII)




Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018


Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Planimetria di progetto con indicazione pannelli diaframma plastico - variante 2021

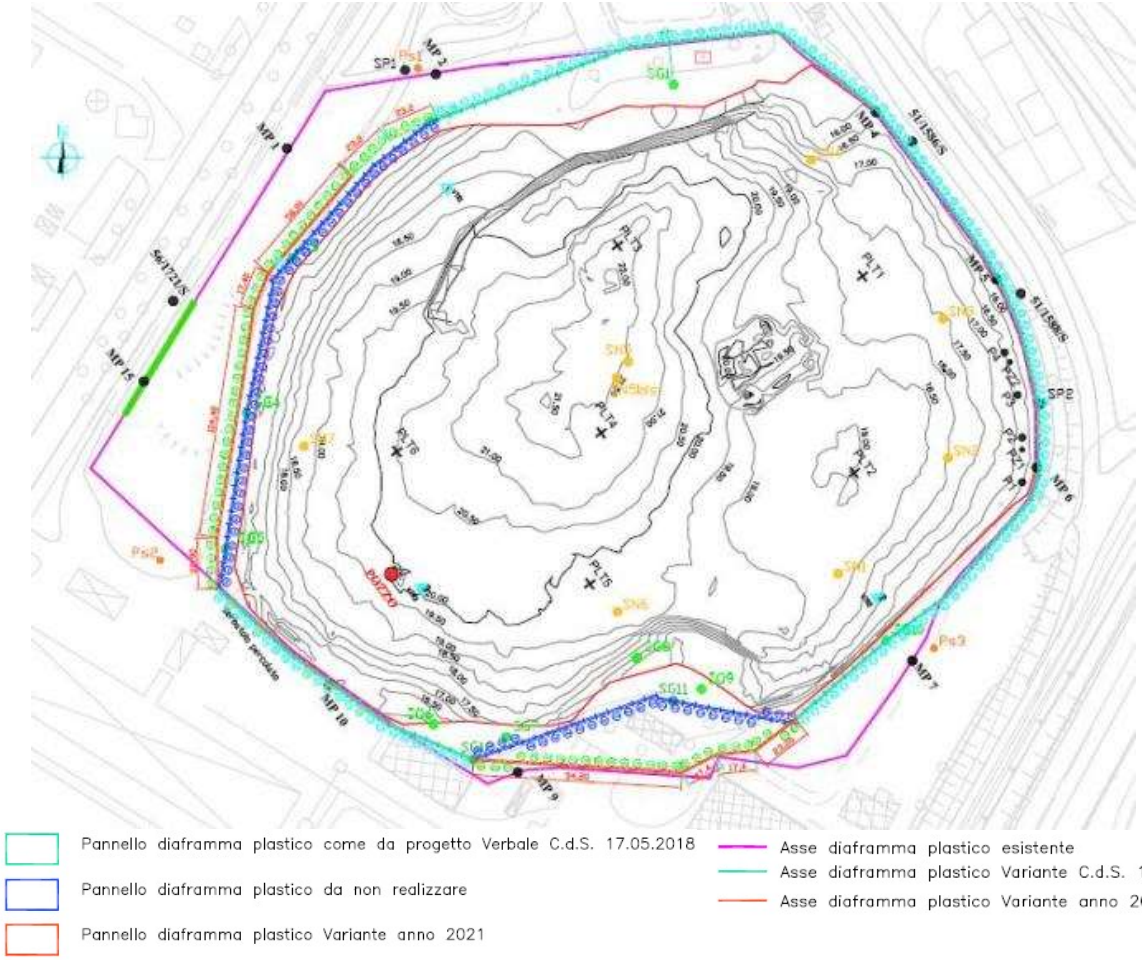

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (V/XII)

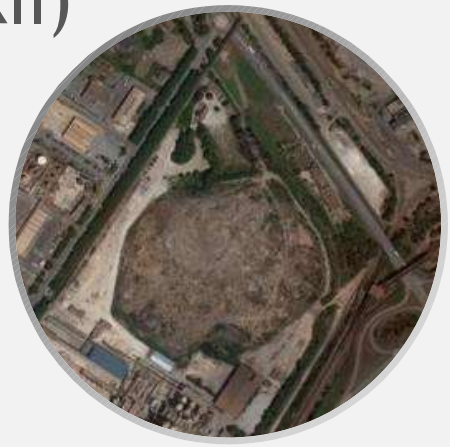

Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Rifacimento diaframma plastico perimetrale



Posa strato di regolarizzazione su tutta la superficie del corpo di discarica



Esempio posa pannello HDPE per diaframma plastico



Canalette perimetrali in calcestruzzo prefabbricato

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (VI/XII)




Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Planimetria di progetto Copertura Definitiva - variante 2021

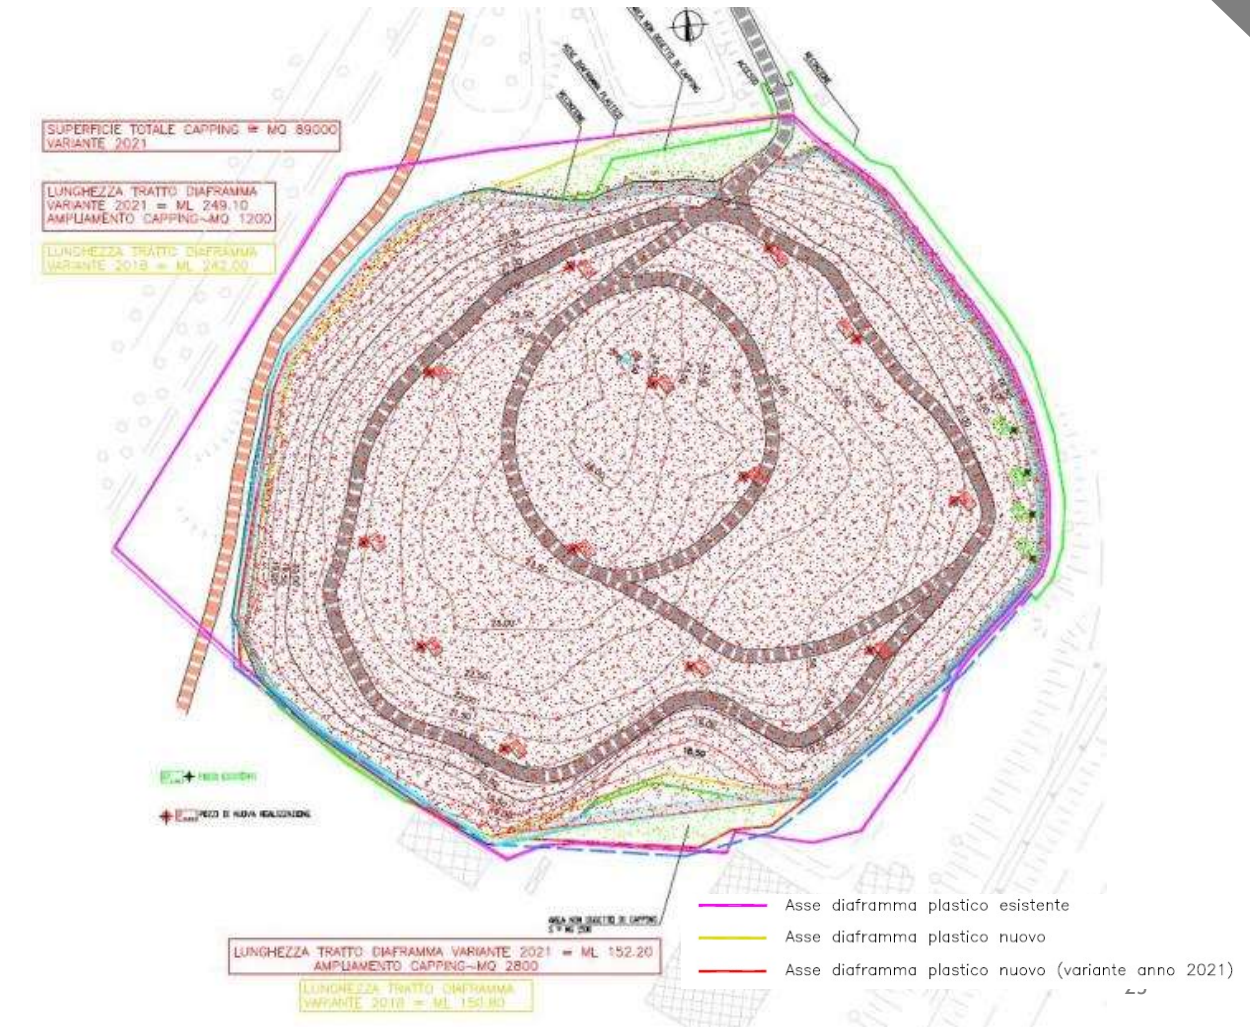

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (VII/XII)




Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Planimetria della rete idraulica impianto di estrazione del percolato - variante 2021

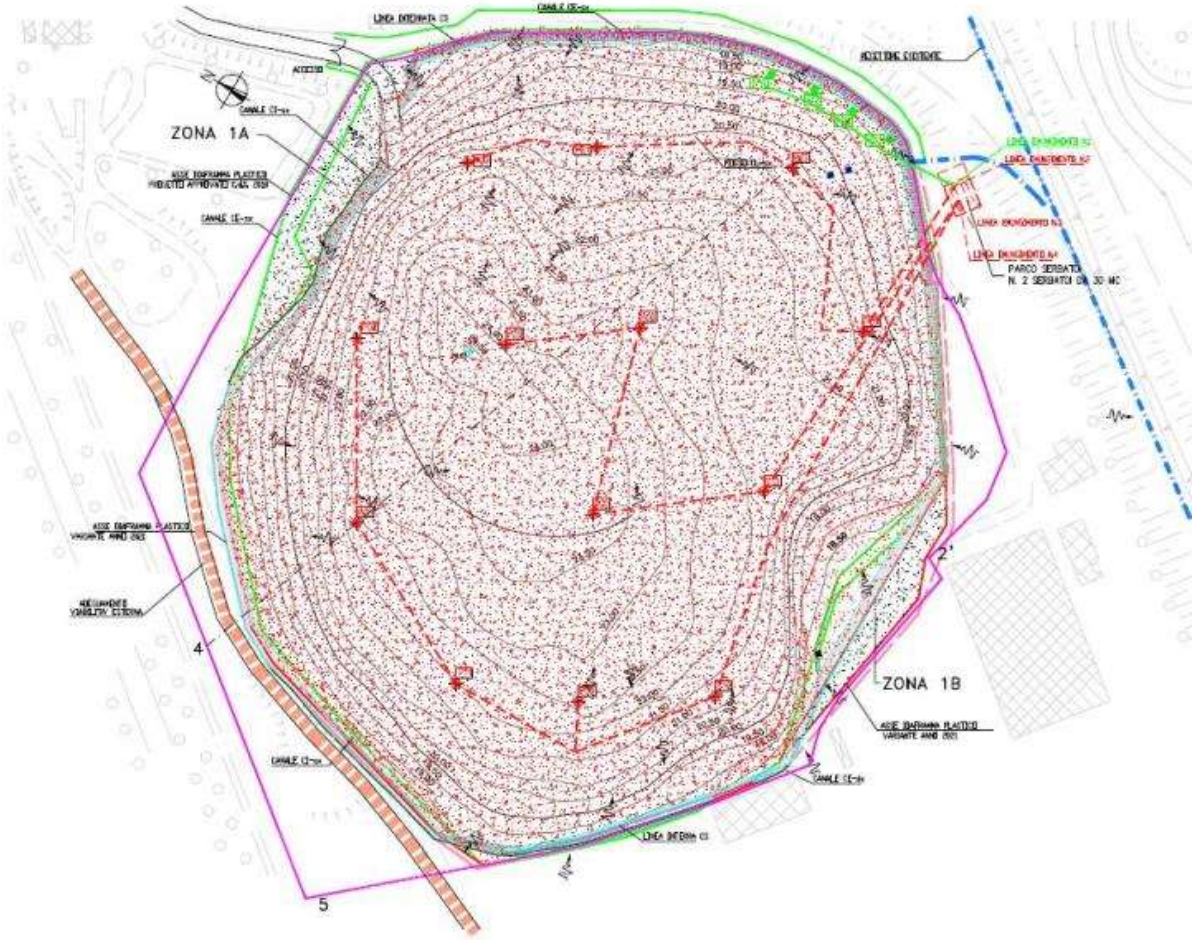

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (VIII/XII)



Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso (III/V)

RDA 2483/21, RDA 2487/21 - Monitoraggio falda, percolato 2022
- Data emissione: 17/12/2021; Emessi ordini n. 9 - 10 in data 20/01/2022
- Note: La frequenza dei monitoraggi è trimestrale.
- Previsione fine attività: 31/12/2022

RDA 267/22 - Noleggio pompa sommersa e gruppo elettrogeno
- Data emissione: 15/02/2022; Emesso ordine n.102/22 Rev 1 in data 23/02/2022

RDA 597/22 - Attività aggiuntive per variante capping
- Data emissione: 05/04/2022
- Note: Emesso ordine 703/19 variante 7 per attività aggiuntive in corso d'opera

RDA 614/22- Analisi agguntive percolato Cementir extra 1
- Data emissione: 07/04/2022; Assegnato ordine 106/22
- Note: Campionamento effettuato il giorno 11/04/2022. Richiesta analisi in contraddittorio a 2° laboratorio per conferma valore PH che determina pericolosità percolato

RDA 633/22 - Analisi agguntive percolato Cementir extra 2
- Data emissione: 07/04/2022; Assegnato ordine 107/22
- Note: Campionamento effettuato il 11/04/2022. Richiesta analisi in contraddittorio a 2° laboratorio per conferma valore pH che determina pericolosità percolato

RDA 667/21 - ORD 102/21 - Attività di prelievo, trasporto e smaltimento percolato presso la discarica Ex Cava Cementir
- Data emissione: 20/04/2021
- Note: Consuntivo anno 2021: 9252 t. Progressivo anno 2022: 3438 t, 2 viaggi da 30 t al giorno. Ricevuti risultati che confermano la pericolosità del percolato per valori del pH, immediatamente è stata emessa una nuova RDA per smaltimento del percolato come rifiuto pericoloso.

RDA 635/22 - Smaltimento percolato extra per 600 ton
- Data emissione: 07/04/2022; Assegnato ordine n. 110/22
- Note: Attività di prelievo e smaltimento percolato, come rifiuto pericoloso, iniziata il 13/04/2022 con quantitativo di prelievo giornaliero pari a circa 60 ton/giorno (4 viaggi da 15 ton). Attività conclusa il 28/04/2022

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (IX/XII)



Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso (IV/V)

RDA 831/22 - Smaltimento percolato extra per 900 ton, integrazione ordine 110/22
- Data emissione: 11/05/2022;
- Note: Inizio attività il 16/05/2022. Inizialmente sono stati programmati ed eseguiti smaltimenti di percolato per 60 ton/g, i quali sono stati successivamente riprogrammati a 30 ton/g per notevole riduzione di percolato in discarica.

RDA 720/22 - Smaltimento percolato fino a febbraio 2023
- Data emissione: 26/04/2022
- Note: Emessa ed approvata RDA per lo smaltimento percolato che coprirà il periodo maggio 2022 - febbraio 2023. Identificato ulteriore punto di emungimento in corrispondenza del pozzo P00. L'attività è iniziata in data 25/07/2022 ed attualmente sono state ritirate circa 8.792 t, livello di soggiacenza 8,21 m (+0,48 m vs livello pre attività). Continue valutazioni in corso da parte di ATO sull'andamento dell' attività in esame e dei risultati relativi ottenuti.
- Previsione fine attività: 31/03/2023

RDA 476/22 - Indagini aggiuntive analisi del percolato
- Data emissione: 25/02/2022; Emesso ordine n.90/22 in data 24/03/2022
- Note: Emessa RDA per indagini aggiuntive sulle analisi del percolato alla luce delle modifiche da apportare al progetto di variante del capping, per discarica di rifiuti pericolosi.
- Attività completata, ricevuti risultati di analisi che attestano pericolosità percolato per il pH.

RDA 1005/22 - Rinnovo noleggio gruppo elettrogeno Riccoboni
- Data emissione: 13/06/2022; Emesso ordine n. 703/19 variante 8 il 20/06/2022

Note: E' stato richiesto il rinnovo del noleggio del gruppo elettrogeno fino al 31/03/2023, in attesa che e-distribuzione fornisca energia rete elettrica.

RDA 1147/22, RDA 1530/22 - Messa in sicurezza acqua di falda ex Cementir, 2° fase (I/II)
- Data emissione: 11/07/2022
- Note: Ricevute le offerte tecniche, valutate da parte di ATO. ACQ ha ricevuto le offerte economiche e, in data 28/09/2022, ha richiesto integrazione della RdA per affidamento dell'Ordine. Emesso ordine in data 5 ottobre 2022. Tenutasi riunione di coordinamento per inizio attività in data 7 novembre 2022, le attività sono iniziate in data 25 novembre 2022, sia l'attività di spurgo sia quella di campionamento risultano in linea con il cronoprogramma condiviso con il fornitore. Attività di sondaggio effettuate per i nuovi piezometri SN1 e SN2. Sondaggi preliminari effettuati sui piezometri da rifare, PS2, PS3 e 56/1721/C/FS. Sono stati allestiti tutti i piezometri, ricevuto report fotografico e stratigrafico, successivamente trasmesso ad ARPA Puglia in ottemperanza a prescrizione riportata in verbale di campionamento, in data 8 marzo.
- Previsione fine attività: 31/03/2023

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (X/XII)



Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso (V/V)

RDA 1602/22 - Indagini integrative stratigrafiche

- Data emissione: 13/10/2022
- Note: L'attività è iniziata in data 28 novembre 2022, sono stati effettuati 20 sondaggi su 21. Durante le fasi di sondaggio nella zona lato ENI, (S9-S10-S12), non si riscontravano anomalie stratigrafiche ma si riscontravano anomalie olfattive riconducibili a idrocarburi. Nella zona lato Sud, nell'intercapedine tra nuovo diaframma e diaframma Cotecchia, per due sondaggi su tre è stato rinvenuto materiale antropico riconducibile presumibilmente a residui di carpenteria in particolare nella zona prossima al vecchio diaframma (in passato sede di infrastrutture della società Cementir). Sono in corso ulteriori indagini volte ad appurare l'estensione dell'area interessata dal materiale rinvenuto non correlabile al corpo della discarica, stante la discontinuità riscontrata in corrispondenza delle corree guida del diaframma e per la natura del materiale antropico rinvenuto, sono stati eseguiti ulteriori indagini per valutazioni sulle successive azioni da intraprendere. Completate le indagini e ricevuta la relazione finale in data 30/01/2023. La relazione è stata trasmessa con nota tecnica e nota di trasmissione agli enti competenti in data 10 febbraio 2023.

RDA 1667/22 - Fornitura strumentazione per misurazione soggiacenza

- Data emissione: 27/10/2022
- Note: La strumentazione è stata installata in data 3 marzo 2023.

RDA 1412/20 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA PER USO CANTIERE EX CAVA CEMENTIR

- Data emissione: 02/07/2022
- Note: In attesa di e-distribuzione per la fornitura di energia elettrica per uso cantiere, ORD. 504/20. Risposta inviata, da parte dell'ente, in data 24/11/2021 tramite PEC. Inoltrata da ILVA in as ulteriore PEC di sollecito in data 23/03/2022. Ricevuta risposta il 16/04/2022. Predisposta ed inviata ulteriore nota, questa volta di carattere legale, nei riguardi del fornitore. Preparata per Area Legale e Area Acquisti, cartella con documenti di decreti di approvazione MISP della discarica ex Cementir e della discarica ex Cava Due Mari. È stato richiesto dal MITE ad e-distribuzione il Piano di Caratterizzazione ai fini dell'installazione dell'elettrodotto Per quanto concerne la discarica ex Cementir la tubazione portacavi è stata realizzata fino al punto di allaccio, nei pressi del cancello d'ingresso. Il passaggio dei cavi è stato ultimato in data 24 novembre. Assegnato ordine per la fornitura di energia elettrica, in data 8 marzo 2023 alla Società IREN MERCATO SpA e sarà attiva a partire dal 1° aprile 2023.

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (XI/XII)



Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività in agenda

RDA 132/23 - Fornitura energia elettrica per 12 mesi sistema di emungimento e stoccaggio percolato

- Note: Emessa RDA. Assegnato ordine per la fornitura di energia elettrica in data 13 febbraio 2023 in attesa di allaccio.

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (XII/XII)




Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Cronoprogramma intervento

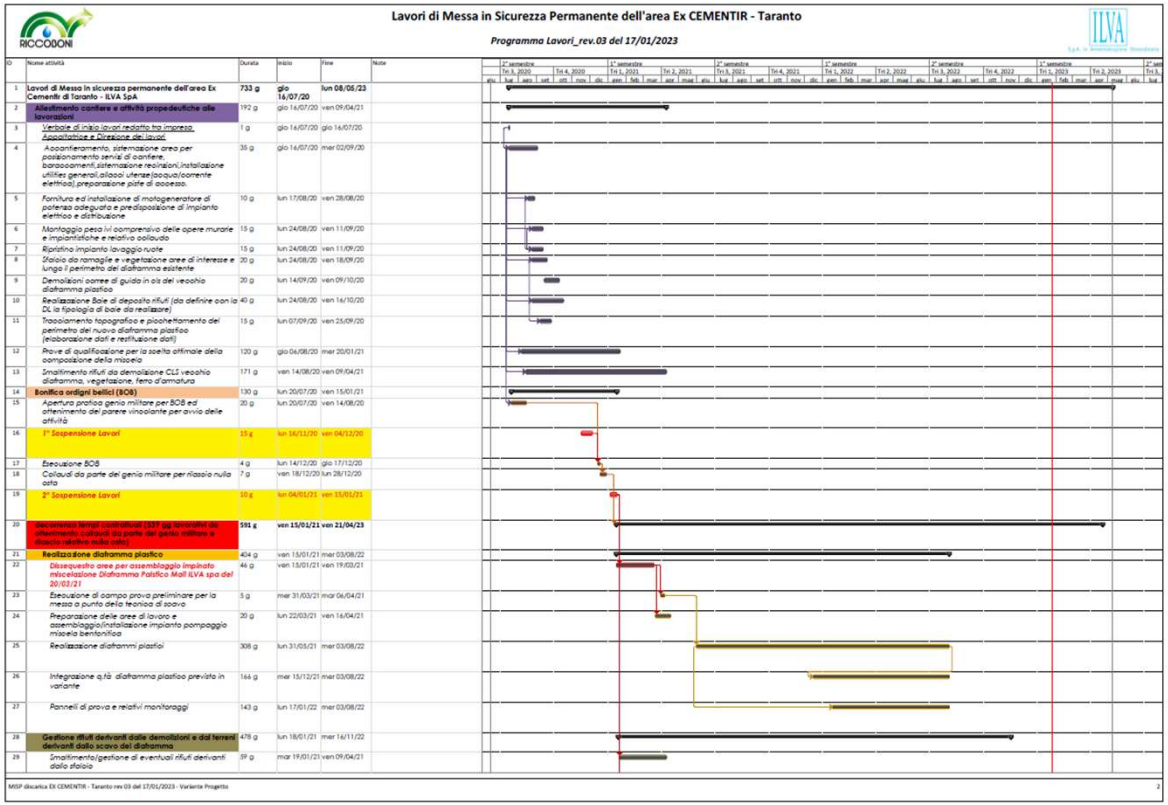

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Ex Cava Cementir (XII/XII)




Fondi Allocati	16,75 M€
Estensione	8,9 ha
SIN Taranto	Si

Area dissequestrata a fine 2018

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Cronoprogramma intervento

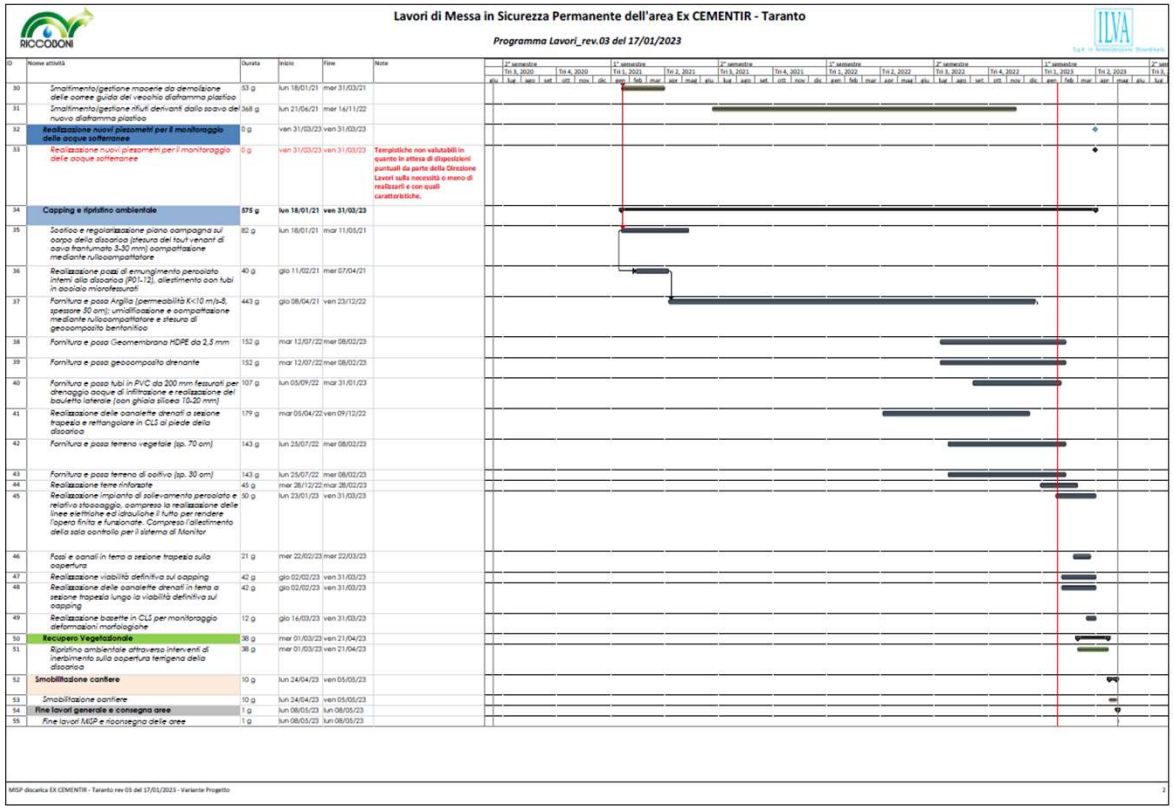

Aggiornamento al 22.03.2023

Stoccaggio fanghi AFO – Fanghi ACC (I/V)



Fondi Allocati	75,03 M€
Estensione	7,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Caratteristiche intervento

Prevista rimozione di 490.000 t di cumuli fanghi con trasporto transfrontaliero (via nave) o nazionale (via camion, intermodale o nave).

Caratterizzazione area a valle della rimozione e smaltimento fanghi, notificata chiusura del procedimento da parte del MITE

Attività eseguite o in corso

RDA 1839/19, 1838/19 - Attività di prelievo, trasporto e invio a recupero / smaltimento dei fanghi AFO e ACC stoccati presso la zona 1 - Codice EER 10.02.14

- Data emissione: 25/06/2019
- Note: Ordine da completare. Attualmente sono stati ritirati un quantitativo di fanghi pari a:
  - ordini n.564/20 Ecologica: 10.042 t e n. 111/21 Ecologica: 53.802 t ACC e 1014 AFO, compresi carichi nave da 6.876 t, 7.300 t, 7.338 t, 7.216 t
  - ordine n.114/21 PH Facility: 65.743 t ACC e 9.815 t AFO
  - ordine n.40/22 Geocycle: 53.050 t ACC e 808 t AFO
- Presentato piano di caratterizzazione (Ministero ha richiesto nuova presentazione piano a fine rimozione fanghi). Si è in attesa di inizio attività di trasporto da parte della società Eco Cis S.r.l (ordine n. 107/21 Eco Cis)

STIMA DELLE GIACENZE AL 17/03/2023

STIMA DELLE GIACENZE			
DATA	**ACC (ton)**	**AFO (ton)**	**TOTALE (ton)**
19-ott	155.608	162647	**318255**
17-mar	108.177	125.693	**233.870**

RDA 942/22 - Richiesta campionamento ed analisi annuale ACC e AFO

- Data emissione: 30/05/2022; Emesso ordine 142/22 in data 07/06/2022
- Note: Prelevati i campioni di Fanghi AFO e ACC in data 14/06. I risultati sono pervenuti in data 22/06/2022.

RDA 1670/22 - Incarico progettazione area impermeabilizzata (I/II)

- Data emissione: 31/10/2022
- ILVA ha presentato il progetto di messa in riserva R13.

Aggiornamento al 22.03.2023

Stoccaggio fanghi AFO – Fanghi ACC (II/V)



Fondi Allocati	75,03 M€
Estensione	7,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso

RDA 1501/22 – Indagini stratigrafiche area stoccaggio fanghi
- Data emissione: 22/09/2022
- Note: Emessa RDA. Fissata riunione con il DL (Ing. Basile) in data 12 ottobre 2022, per l'avvio delle attività. Attività svolta in data 19, 20 ottobre 2022. Ricevuta relativa relazione tecnica da parte di Ecologica.-

RDA 1670/22 – Incarico progettazione area impermeabilizzata (II/II)
- In data 25 novembre 2022 è stata trasmessa al MASE l'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un'area impermeabilizzata di messa in riserva R-13 per lo stoccaggio dei fanghi. Convocata la conferenza dei servizi in data 15 dicembre 2022, nella quale il progetto è stato approvato con prescrizioni. Emesso decreto di approvazione DM n. 50 in data 1/02/2023.

RDA 1683/22 – Verifica ed integrazione impianto illuminazione area di cantiere
- Data emissione: 07/11/2022
- Note: RDA approvata per la verifica ed integrazione impianto illuminazione area di cantiere e rilascio del certificato di conformità. Emesso ordine in data 14 novembre, inizio attività il 22 novembre 2022. SMEA ha eseguito l'attività e ha fornito i certificati di conformità. DL ha dato il benestare alla certificazione di conformità.

Aggiornamento al 22.03.2023

Stoccaggio fanghi AFO – Fanghi ACC (III/V)



Fondi Allocati	75,03 M€
Estensione	7,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività

- Considerato l'aumento significativo dei viaggi, la struttura operativa ha adottato le due seguenti misure per il superamento delle problematiche legate alla congestione del traffico dei mezzi: 1. adozione di stampante per bilicisti; 2. Incremento della forza lavoro con l'introduzione del 2° turno per il personale adibito al trasporto fanghi, a partire dal 1/06/22. Dopo incontro con CSE, si è deciso che le ditte forniranno entro il giovedì pomeriggio, i programmi di arrivo dei mezzi per la settimana successiva, indicando anche le destinazioni, in modo da programmare al meglio gli ingressi. È stato stabilito che, in presenza di nave adibita a trasporto transfrontaliero, i mezzi di Ecologica avranno l'esclusiva per l'ingresso in cantiere, in modo da completare il carico in tre giorni lavorativi. Il primo carico per trasporto transfrontaliero è stato completato nei giorni 11 e 12 luglio 2022.
- A seguito dell'incremento del numero dei viaggi, sono state adottate immediatamente misure di mitigazione ambientale (bagnature strade e piste più utilizzo fog cannon) e ottimizzazione degli ingressi in cantiere distribuite equamente nell'arco delle ore lavorative. Nel mese di agosto 2022 il secondo turno è stato eliminato e dal 01/09/2022 sono in forza solo normalisti, con orari di lavoro divisi a partire dalle 6:30 e dalle 7:00. Turni differenti vengono programmati sulla base dell'arrivo della nave per il trasporto transfrontaliero.

RDA 1987/22 – Realizzazione area di messa in riserva R13
- Data emissione: 21/12/2022
- Note: Predisposta specifica tecnica ATO 39_22, emessa RDA in data 21 dicembre 2022 ed approvata in data 17 gennaio 2023, assegnato ordine in data 13 febbraio. Iniziata attività in data 7 marzo.

RDA 81/23 – Campionamento ed analisi rifiuto deposito temporaneo
- Note: In data 16 gennaio 2023 è stata predisposta la specifica tecnica ed inviata la relativa RDA, emesso ordine in data 06/02/2023, effettuato campionamento in data 14 febbraio, analisi definitive ricevute in data 24 febbraio 2023, rda relativa allo smaltimento approvata. Emissione ordine in corso.

RDA 196/23 – Richiesta per attività di spostamento fanghi in area R13
- Note: Emessa ed approvata RDA, in attesa di emissione ordine.

RDA 187/23 – Incarico DL CSE CSP RL Attività realizzazione R13 e spostamento fanghi
- Note: Emessa ed approvata RDA.

Aggiornamento al 22.03.2023

Stoccaggio fanghi AFO – Fanghi ACC (V/V)



Fondi Allocati	75,03 M€
Estensione	7,0 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Rimozione di circa 490.000 t di fanghi AFO e ACC



ACC



ACC



AFO

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (I/VII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Caratteristiche intervento

Nell'ambito del Piano di Caratterizzazione dello stabilimento ILVA nel suo complesso (ERM, 2003) e sua attuazione, l'area in questione era stata suddivisa in tre aree distinte:

- cd. "discarica Nord-Ovest", identificata nel piano di caratterizzazione come area originariamente adibita a discarica;
- cd. "area ex Fintecna", non identificata nel PdC come area di discarica, ma laddove i sondaggi eseguiti in sede di caratterizzazione (2004-2006) evidenziarono la presenza di rifiuti;
- aree adiacenti alla "ex Fintecna", non identificata nel PdC come area di discarica e risultata come terreni conformi in base ai sondaggi eseguiti per la caratterizzazione (2004-2006).

L'interpretazione risultante dal Piano di Caratterizzazione e dall'esito delle indagini, debitamente validate dagli enti di controllo, è stata poi mantenuta negli atti e documenti successivi, dando luogo alle prescrizioni di cui al DPCM 14.03.2014 e DL 1/2015 (cd. Piano Rifiuti).

Il DL 1/2015 individuava due aree, oggetto di prescrizioni[1] distinte: «Discarica Nord Ovest» (ex prescrizione UP4); «Aree ex-Fintecna» (ex prescrizione UP7). Revisione del Progetto, inclusiva di entrambe le aree, comunicata al Ministero dell'Ambiente con DIR 429 del 18/07/2017.

A seguito dei maggiori approfondimenti documentali condotti nel 2017, venne compreso che le aree di cui trattasi facevano invece originariamente parte di un'unica area in passato adibita a discarica.

1. ILVA in AS non è più soggetta ad AIA e, pertanto, sono decaduti i termini prescrittivi. I codici AIA (DL 1/2015) sono qui riportati per mero riferimento ai pregressi procedimenti.

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (II/VII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Studio di fattibilità

Redatto ad agosto 2018 per definire, in estrema sintesi, l'estensione dell'intervento di messa in sicurezza permanente già previsto per la Discarica Nord – Ovest a tutte e tre le aree di cui sopra.
Tale studio proponeva tre approcci:

- accertare le caratteristiche di non pericolosità dei rifiuti presenti nell'area ex-Fintecna e, in tal caso, estendere a tutto il nuovo perimetro l'intervento autorizzato per il vecchio perimetro della discarica Nord-Ovest (ex prescrizione UP4), il quale consiste in un capping standard per discariche di rifiuti non pericolosi
- in assenza di analisi di caratterizzazione dei rifiuti, integrare cautelativamente il pacchetto di copertura con un telo impermeabile, realizzando sostanzialmente un capping per discariche di rifiuti pericolosi:
  - solo in corrispondenza dell'area ex-Fintecna;
  - oppure, tutta la discarica risultante dalla nuova perimetrazione.

Indagini integrative

Ilva in AS ha ritenuto preferibile effettuare le indagini integrative volte ad accertare le caratteristiche dei rifiuti presenti nell'area ex- Fintecna.
Di seguito le principali tappe:

- 26.11.2020 – Autorizzazione GIP per l'esecuzione di indagini integrative
- 20.02.2021 – ILVA in AS informa ARPA Puglia della programmazione delle attività, con avvio sondaggi previsto per il 01.03.2021
- 25.02.2021 – ARPA Puglia chiede che le attività siano sospese e che ILVA in AS trasmetta preventivamente alcuni documenti ed informazioni per espressione di parere
- 01.03.2021 – ILVA in AS trasmette i documenti richiesti 05.05.2021 – Il MiTE trasmette ad ILVA in AS il parere ARPA-ISPRA
- 25.05.2021 – ILVA in AS trasmette le proprie osservazioni, evidenziando che il parere è stato espresso in termini di piano di caratterizzazione, mentre le attività in esame non hanno né la tipologia né le finalità di un piano di caratterizzazione, il quale è stato peraltro presentato da ILVA in AS ad aprile 2021 per le relative valutazioni. ILVA in AS propone, pertanto, una modalità per accogliere le prescrizioni pertinenti alla caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna, rimandando quelle attinenti al piano di caratterizzazione al relativo procedimento.

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (III/VII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Indagini integrative

- 01.07.2021 – Il MiTE trasmette riscontro alla nota ILVA in AS, chiedendo di dare avvio alle attività e di fornire relativo cronoprogramma
- 07.07.2021 – ILVA in AS chiede di esprimersi circa la propria nota/proposta del 25.05.2021
- 20.07.2021 – Il MiTE precisa che eventuali chiarimenti devono essere richiesti agli Enti estensori dei pareri
- 23.07.2021 – ILVA in AS trasmette il Piano Operativo ad ARPA ed ISPRA con relativo cronoprogramma, ricordando le differenti finalità tra la caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna e le indagini di caratterizzazione delle matrici ambientali, demandate ad un altro procedimento amministrativo
- 29.07.2021 – ARPA Puglia esprime nulla osta e comunica la propria presenza per le verifiche in campo 29-30-31.07.2021 – Esecuzione dei sondaggi
- 28.10.2021 – Report di fine lavori della caratterizzazione dei rifiuti dell'area ex-Fintecna dal quale si evince che tutti i campioni sono classificabili come non pericolosi, in accordo con la classificazione storica della discarica.

Attività eseguite o in corso

RDA 1761/20 - Indagini di caratterizzazione su aree limitrofe rispetto all'area oggetto di MISP (I/II)

- Data emissione: 27/08/2020
- Ordine 640 del 02/10/2020

- 12.04.2021 - Trasmissione Piano di Caratterizzazione agli Enti competenti
- 05.05.2021 - Poiché parte dell'area ricade all'esterno del SIN, il MiTE propone alla Regione Puglia di avviare un'istruttoria condivisa
- 10.09.2021 - Il MiTE trasmette le osservazioni di ARPA Puglia, chiedendo ad ILVA in AS di integrare quanto indicato, e sollecita un riscontro da parte della Regione Puglia circa la condivisione dell'iter amministrativo
- 20/01/2022 - Trasmissione delle integrazioni/osservazioni, con Nota Pec Ilva, in riscontro alla richiesta del MiTE
- 28/02/2022 - Trasmissione Nota a Regione Puglia con richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi per le aree non ricadenti nel SIN Taranto, in applicazione del procedimento ex art 252.
- 08/03/2022 - Nulla Osta della Regione Puglia, in applicazione del procedimento ex art 252, per la convocazione di una Conferenza di Servizi.

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (IV/VII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

RDA 1761/20 - Indagini di caratterizzazione su aree limitrofe rispetto all'area oggetto di MISP (II/II)

- Inviata all'autorità competente, in data 07/07/2022, una revisione del piano di caratterizzazione ai fini della relativa approvazione nell'ambito della suddetta CdS.
- Ricevuto in data 14/07/2022 il pre-decreto autorizzativo con prescrizione. Trasmesse contro osservazioni al parere del MITE in data 23/07/22. Il MITE ha concesso a tutti gli enti preposti tempo fino al 5/09/22 per esprimere i propri pareri, di competenza, ai fini dell'approvazione del PDC. Inviate, in data 23 luglio 2022, le controdeduzioni al pre-decreto che riporta alcune prescrizioni improntate al parere ARPA. Parere ARPA ricevuto in data 5 settembre.
- Approvazione del PdC con D.M.225 del 06/10/2022, notificato in data 10/10/2022.
- Redatte Specifiche tecniche per esecuzione indagini di caratterizzazione e per incarichi di DL/CSE/CSP/RL. In data 31/01/2023 sono state emesse ed approvate le RDA 207/23 e 211/23.
- In fase di deposito alla Procura presso il Tribunale di Taranto dell'istanza di autorizzazione all'accesso all'area sottoposta a sequestro preventivo per effettuare i sopralluoghi.
- All'ottenimento dell'autorizzazione si procederà ad organizzare i sopralluoghi con le ditte.

Attività in agenda

RDA 472/22 - Aggiornamento progetto messa in sicurezza permanente (I/II)

- Data di emissione: 11/03/2022; assegnato ordine 151/22 in data 23/06/2022
- Note: Ordine da assegnare dopo i risultati relativi all'ordine 694/20 (indagini ambientali). Il report di fine lavori relativo all'ordine 694/20 è stato trasmesso a MITE, ARPA, ISPRA ed Autorità Giudiziaria, mentre l'Avv. Loreto ha depositato il report in Procura. Al fine di reperire ulteriori informazioni in merito alla documentazione delle indagini pregresse (2003-2005), è stato eseguito un accesso in stabilimento AdI, in data 08/04/2022, a seguito del quale sono state reperite le stratigrafie ed il relativo stralcio planimetrico delle caratterizzazioni aggiornate all'anno 2006.
- Elaborate specifica tecnica ed RDA per l'aggiornamento del progetto di MISP. Effettuati tutti i sopralluoghi previsti con i 6 fornitori contattati. Analizzate le offerte tecniche ricevute dai fornitori e dato benestare da parte di ATO in data 25/05/2022.
- In data 22/06/2022 è stato assegnato Ordine n. 151/22 emesso a favore della ditta AECOM URS Italia S.p.A.
- In data 13/10/2022, è stato sottoscritto un addendum con dettagli e precisazioni sulla modalità di restituzione del progetto.
- In data 24 novembre 2022 è stato eseguito il sopralluogo con AECOM per la valutazione dei vincoli ambientali.

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (V/VII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività in agenda

RDA 472/22 - Aggiornamento progetto messa in sicurezza permanente (II/II)

- E' stata effettuata una riunione con la ditta in data 20 dicembre 2022, nella quale è stato richiesto di effettuare un ulteriore sopralluogo con AECOM e la con la ditta subappaltatrice GEO SERVICE SRL (disponibilità da parte di ATO comunicata alla ditta a partire dal 3 gennaio 2023) Il sopralluogo è stato eseguito in data 12 gennaio 2023. Trasmesse agli enti preposti le istanze in data 3 febbraio 2023 ed inviato ad ARPA in data 10 febbraio 2023 il piano operativo. Ricevuto Nulla Osta da Parte della Provincia in data 10 Febbraio. Si è in attesa di ricevere parere VINCA da parte della Provincia di TA. Pianificate indagini preliminari alla progettazione con data di inizio prevista per il 02/05/2023 stimando l'ottenimento del parere al 30/04/2023. il progetto di MISP risultante dall'integrazione delle prescrizioni UP4-UP7 risulterà altamente migliorativo sul piano ambientale.
- Data consegna progetto: 07/07/2023

RDA 1022/21, 1193/22, 1655/22 - Realizzazione di piezometro in falda profonda e integrazione

- Note: L'intervento è parte del monitoraggio annuale dei piezometri. Assegnato Ordine 188/21 alla ditta Trivelsonda Srl. In data 14/10/2022 richiesto alla Provincia di Taranto il parere di validità relativo all'autorizzazione Vinca; ricevuto riscontro affermativo in data 03/02/2022. Nominato il DL/CSE (vedi RDA 656/22 – ordine 138/22 del 25/05/22). Predisposta una nuova specifica tecnica e relativa RDA per l'affidamento di un nuovo ordine. A seguito delle valutazioni tecniche ed economiche proposte dalle ditte e degli allineamenti tecnici delle proposte, l'ordine è stato assegnato in data 10 novembre 2022, il fornitore ha comunicato la lista dei subappaltatori. In data 23 dicembre 2023 è stato trasmesso il cronoprogramma ad ARPA. L'attività è iniziata il 9 gennaio 2023. In data 11 gennaio 2023 è stato eseguito il campionamento in contraddittorio con ARPA Puglia i cui risultati confluiranno nel piano di caratterizzazione dell'area. Terminata la realizzazione del piezometro ed installazione della pompa in data 06/03/2023.
- Data emissione integrazione: 25/10/2022

RDA 656/22 - Incarico DL CSE per ordini 188/21 e 79/22

- Data emissione RDA: 11/04/2022. Data emissione ordine 25/05/22.
- Note: Eseguiti sopralluoghi con i professionisti contattati, in data 13/05. Ricevute proposte tecniche ed economiche da parte dei fornitori, è stato emesso ordine n. 138/22 in data 25/05/2022.

Monitoraggio acque di falda (I/II)

La ex-prescrizione UP4 include il monitoraggio falda da avviare contestualmente all'intervento di MISP. Nelle more dell'avvio di tale intervento, ILVA in AS sta proseguendo il monitoraggio annuale, già in precedenza effettuato in attuazione del PMC 2016 dell'AIA, sebbene non sia più soggetto obbligato. Tale monitoraggio in autocontrollo è stato eseguito congiuntamente all'area delle Colline e vecchie vasche. Fino al 2019, il monitoraggio è stato effettuato adottando il set analitico definito nell'ambito del PMC.

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (VI/VII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Monitoraggio acque di falda (II/II)

- Dal monitoraggio 2020 è stato adottato il set di monitoraggio prescritto da ARPA Puglia nell'ambito delle osservazioni al cosiddetto "Piano Onofrio" Una sintesi dei risultati, comprensiva degli anni pregressi, è stata trasmessa agli Enti competenti ed alla Procura di Taranto a giugno 2021. Nel 2020, il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito dell'ordine affidato per l'esecuzione delle indagini del cd. "Piano Onofrio". Il monitoraggio riferito all'anno 2021 è stato eseguito nel periodo 20-30.12.2021 in contraddittorio con i tecnici di Arpa Puglia. Con nota prot. 74210 del 28/10/2021 Arpa Puglia ha validato i risultati analitici relativi alle acque sotterranee della campagna di monitoraggio relativa all'anno 2020. Nella stessa nota l'Agenzia ha richiesto di eseguire le future campagne di monitoraggio della falda in contraddittorio in un periodo di scarsa alimentazione dell'acquifero (agosto-settembre). In ottemperanza alla richiesta dell'Agenzia, il monitoraggio riferito all'anno 2022 è stato eseguito nel periodo 21-23.09.2022 in contraddittorio con i tecnici di Arpa Puglia.

Altre attività

Richiesta di documentazione storica

- Preparata e consegnata a GdF una nota e relativa documentazione inerente le cartografie richieste con verbale del 10/06/22 (lettera A). La nota contiene anche precisazioni relative a quanto richiesto nel corso del meeting avvenuto in data 22/06/22 presso la sede della stessa GDF.

I piezometri afferenti alla discarica Nord-Ovest sono attrezzati con pompe fisse. La presenza di tali attrezzature precludeva la possibilità di misurare la soggiacenza della falda. Per risolvere tale problematica, ILVA in AS a gennaio 2021, nell'ambito dell'ordine 597/20 affidato alla ditta EcoTrend S.r.l., ha fatto installare, su ciascun piezometro, un tubo guida in modo da permettere l'inserimento di un sondino piezometrico. Tale operazione ha richiesto l'estrazione delle pompe con gru ed il successivo riallestimento delle stesse.A seguito dell'estrazione delle pompe, due di esse mostravano segni di deterioramento. Dopo verifiche da parte di ditta specializzata, è emersa la necessità di sostituire una delle due pompe mentre l'altra è stata ripristinata tramite pulizia e manutenzione. In presenza di ARPA Puglia, sono state effettuate le videoispezioni dei pozzi relativi alle pompe che avevano mostrato i segni di deterioramento.Dalle videoispezioni il piezometro 6/90/I/FP è risultato parzialmente intasato nella parte terminale, apparentemente per attrezzature (cavi o altro) caduti nel pozzo durante attività precedenti, in merito alle quali non si hanno informazioni. Conseguentemente, ILVA in AS ha emesso una specifica tecnica ed affidato un ordine supplementare per la terebrazione di un nuovo pozzo in adiacenza e sostituzione di quello esistente, che non risulta avere più caratteristiche idonee al monitoraggio. Per l'esecuzione delle attività integrative (videoispezioni, manutenzione pompe e fornitura nuova pompa), è stata emessa in data 02.02.2021 una variante all'ordine 597/20 (EcoTrend S.r.l.).

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nord Ovest & Area Fintecna (VII/VII)



Fondi Allocati	12,00 M€
Estensione	12,9 ha
SIN Taranto	Si

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Indagini di classificazione di pericolosità dei rifiuti presenti nel corpo di discarica



Sondaggio



Indagini radiometriche



Cassetta catalogatrice sondaggio

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nuove Vasche (I/IV)



Fondi Allocati	3,00 M€
Estensione	3,6 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Caratteristiche intervento

Gestione post-operativa della discarica secondo il Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con Determinazione del Dirigente n. 39 del 06.03.2008 e integrato dalle prescrizioni ISPRA (verbale 18.06.2018)

Le attività comprendono:

- Manutenzione conservativa di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti elettrici di messa a terra, i presidi antincendio (estintori, idranti) che saranno soggetti alle verifiche periodiche di legge.al fine di garantirne l'efficienza.
- Mantenimento dell'integrità e delle funzionalità della recinzione e dei presidi di accesso alla discarica e mantenimento dell'integrità e pulizia della viabilità interna ed esterna.
- Ispezioni visive secondo le periodicità prescritte dal Piano di Sorveglianza e Controllo.
- Mantenimento dell'integrità, della pulizia e della funzionalità della rete di raccolta e collettamento e stoccaggio nella vasca di accumulo delle acque meteoriche.
- Mantenimento dell'integrità e della funzionalità: del sistema di estrazione della rete di raccolta, stoccaggio intermedio, collettamento e rilancio del percolato; dei pozzi a presidio delle acque sotterranee P6, P7 ed MF3; della rete di monitoraggio delle emissioni diffuse.
- Prosecuzione dell'attuazione delle procedure di monitoraggio con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
    1. Acque sotterranee: prelievo ed analisi, con frequenza semestrale, dai piezometri di controllo denominati P6, MF3, P7, ubicati rispettivamente il primo a monte e i restanti due a valle della discarica;
    2. Percolato: controllo dei volumi e della composizione con frequenza semestrale;
    3. Emissioni diffuse: campionamento ambientale delle polveri totali, con frequenza semestrale, in due punti di prelievo localizzati lungo la direttrice principale del vento a monte e a valle della discarica;
    4. Fibre di amianto: prelievo con campionatori ambientali, con frequenza semestrale, per verificarne l'eventuale presenza.
    5. Monitoraggio morfologico: rilievi plano-altimetrici eseguiti con frequenza annuale al fine di verificare la sussistenza di fenomeni di assestamento e/o cedimento della massa di rifiuti ed in particolare del sistema di ricopertura finale.
    6. Monitoraggio meteoclimatico: allo stato attuale Ilva riceve giornalmente le osservazioni meteorologiche dall'Osservatorio «Luigi Ferraiolo» di Talsano

    Durata pari a 30 anni dall'inizio della gestione post-operativa (2048).

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nuove Vasche (II/IV)



Fondi Allocati	3,00 M€
Estensione	3,6 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso

RDA 2490/21 - Monitoraggio falda, acque meteoriche e percolato
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi

RDA 2491/21 - Campionamento ambientale polveri
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordine n. 12/22 in data 20/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi; Attività eseguita il 27/04/2022

RDA 2492/21 - Campionamento fibre aerodisperse
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordine n. 13/22 in data 20/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi; Attività eseguita il 27/04/2022

RDA 2493/21 - Rilievo topografico
- Data emissione: 16/12/2021; Emesso ordine n. 22/22 in data 27/01/2022
- Note: Da eseguirsi ogni 6 mesi. Ultimo rilievo effettuato il 15/03/2022

RDA 1770/21 - Prog. Op. potenziamento rete raccolta acque meteoriche
- Note: Emessi RDA di integrazione ed ordine n. 65/22 in data 24/02/2022. Effettuato rilievo plano-altimetrico con drone il 20/04/2022. Il progettista ha fatto realizzare un sondaggio geotecnico propedeutico alla progettazione e sta predisponendo gli elaborati grafici. Consegnati dai subappaltatori all'Ing. Basile, in data 29/06/2022 i rilievi topografici, i rilievi effettuati con il drone e la relazione idrogeologica. Consegnato progetto in data 10 ottobre 2022; in data 7 novembre 2022 l'Ing. Basile ha comunicato che lo stesso progetto deve essere modificato rispetto al progetto di impermeabilizzazione area fanghi.

RDA 56/22 - Acquisizione dati meteoclimatici
- Data emissione: 11/01/2023
- Note: Emessa RDA

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nuove Vasche (III/IV)



Fondi Allocati	3,00 M€
Estensione	3,6 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Attività eseguite o in corso

RDA 83/23 - Campionamento ed analisi percolato

- Data emissione: 16/01/2023
- Note: In data 16 gennaio 2023 è stata predisposta la specifica tecnica ed inviata la relativa RDA. Effettuato il campionamento in data 14 febbraio 2023, analisi definitive ricevute in data 24 febbraio 2023, approvata RDA relativa allo smaltimento. Ordine in fase di emissione.

Criticità

- Nessuna criticità evidenziata

Aggiornamento al 22.03.2023

Discarica Nuove Vasche (IV/IV)



Fondi Allocati	3,00 M€
Estensione	3,6 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Gestione post-operativa e controlli



Sfalcio vegetazione




Prelievo campione percolato



Vasca prima pioggia

Aggiornamento al 22.03.2023

…e le restanti 13 Aree Escluse

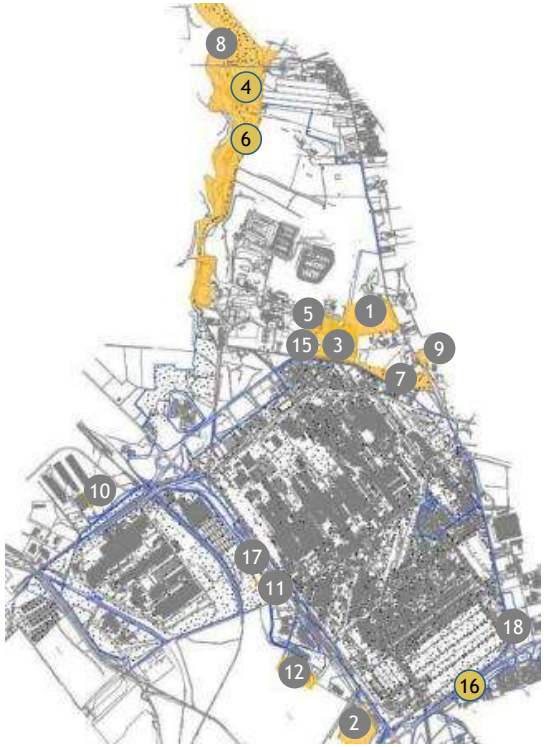

- 6 Gravina Leucaspide
- 7 Aree a verde lungo SP Statte lato ovest
- 8 Aree a verde NORD
- 9 Land A – Area a verde adiacente a stabilimento
- 10 Land C – Area a verde adiacente a stabilimento
- 11 Land D1 - Area a verde adiacente a stabilimento
- 12 Land E – Sito industriale non attivo ex Sidercomit
- 13 Land I – Area a verde adiacente ad Ospedale Nord
- 14 Land L - Cava L'Amastuola
- 15 Aree limitrofe stoccaggio fanghi
- 16 Collinette ecologiche Tamburi
- 17 Land D2 - Area a verde con chiesetta
- 18 Area Pozzo 25

Aree sottoposte a Sequestro con Interventi in corso

Aree con interventi in corso

Aree in manutenzione e con procedimento da definire

Aree cedibili e prive di pendenze

Area in Perimetro Sito Interesse Nazionale (SIN) di Taranto

Area parzialmente inclusa nel perimetro SIN di Taranto

Nota: Non rappresentate aree non adiacenti allo stabilimento produttivo (Voce 13 – Land I e Voce 14 - Land L) con superficie complessiva di 128.4 ettari

Fonte: ILVA

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (I/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente


Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Caratteristiche intervento

Rilevati costituiti da materiali di riporto (terreni di sbancamento e residui di produzione), con sovrastanti vasche in terrapieno, denominate «colline». Area sommitale adibita a n. 7 vasche per sedimentazione ed ispessimento di residui oleosi, prima del trasferimento degli stessi agli impianti di conferimento finale. Attività proseguita fino alla metà degli anni '80, quando fu interrotta, in relazione alle nuove regolamentazioni in materia di gestione rifiuti.
Area interessata dal rilevato (cd. «colline») e le relative vasche 1-7

Area sottoposta a caratterizzazione SIN nel 2006.

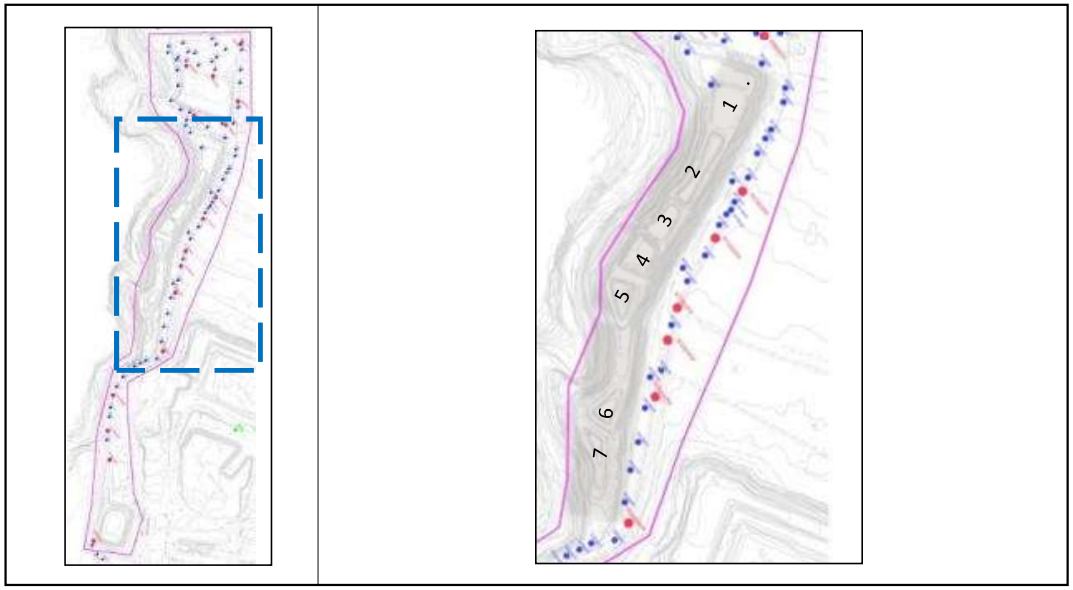

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (II/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Caratteristiche intervento


La cosiddetta discarica Sud-Ovest, e relativa vasca 8, è fisicamente separata dalle «collinette». La vasca per la decantazione fanghi è stata realizzata in depressione sulla sommità della discarica.
Stante la cessazione totale delle attività di decantazione fanghi più o meno contestuale al periodo in cui veniva realizzata la vasca, non è attualmente noto se la struttura sia mai stata messa in servizio oppure se il progetto sia stato di fatto abbandonato prima della sua realizzazione.

Area sottoposta a caratterizzazione SIN nel 2006.



Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (III/XIV)

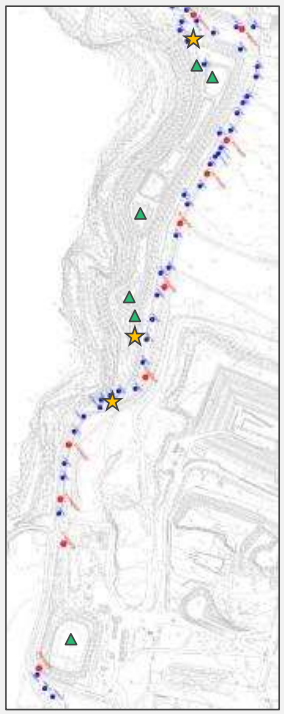

- Punti di indagine della caratterizzazione SIN (● sondaggi; ● piezometri)
- Indagini Piano Onofrio ▲
- Indagini integrative ARPA ★


Indagini ambientali – Zone accessibili o parzialmente accessibili

Caratterizzazione nell'ambito del procedimento SIN – Zone accessibili

- Eseguita nel 2004-2006 (Relazione finale 2007)
- Piano di caratterizzazione integrativa, trasmesso il 12/04/2021 ad Enti competenti per approvazione. Con nota n.47547 del 05/05/2021, il MITE trasmette alla Regione Puglia una richiesta di condivisione del procedimento amministrativo in quanto l'area ricade parzialmente fuori SIN.
- In data 09/09/2021 il MATTM ha richiesto l'integrazione del PdC a seguito di osservazioni di ARPA Puglia.
- Inviate integrazioni ed osservazioni richieste da MITE il 10/09/21 su osservazioni di ARPA. In attesa del riscontro del MiTE.
- Indetta CdS decisoria dal MiTE in merito al PdC in data 15/07/2022. In data 07/07/2022 è stata inviata all'autorità competente una versione revisionata del documento PdC, che annullava e sostituiva la precedente versione di gennaio 2022, recependo alcune correzioni rispetto alla versione sostituita.
- Ricevuto in data 14/07/2022 il pre-decreto autorizzativo con prescrizione. Trasmesse contro osservazioni al parere del MITE in data 23/07. Il MITE ha concesso a tutti gli enti preposti tempo fino al 5/09/22 per esprimere i propri pareri, di competenza, ai fini dell'approvazione del PDC. Inviate, in data 23 luglio 2022, le controdeduzioni al pre-decreto che riporta alcune prescrizioni improntate al parere ARPA.
- Approvazione del PdC con D.M.225 del 06/10/2022, notificato in data 10/10/2022. Richiesto al progettista di elaborare computo metrico e capitolato tecnico da allegare alle specifiche tecniche per l'esecuzione delle indagini. Il progettista le ha inviate ad ATO il 25 ottobre 2022, chieste revisioni in data 4 novembre 2022, integrate dal professionista. In fase di definizione specifica tecnica per emissione RDA per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione.

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (IV/XIV)

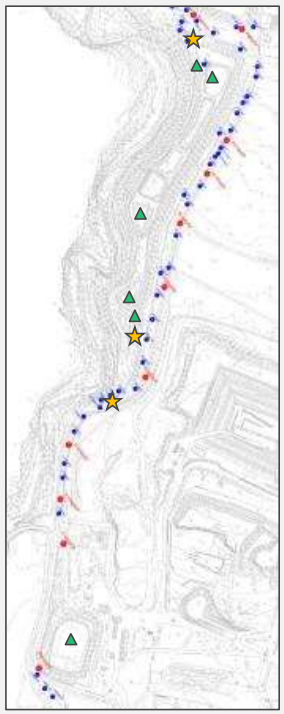

- Punti di indagine della caratterizzazione SIN (● sondaggi; ● piezometri)
- Indagini Piano Onofrio ▲
- Indagini integrative ARPA ★

Indagini ambientali – Zone accessibili o parzialmente accessibili


Indagini richieste dall'Autorità Giudiziaria per integrare le indagini con sondaggi sulla sommità dei rilevati ed all'interno delle vasche – Ordine 597/2020 (Eco Trend s.r.l.) concluso.

Stato di avanzamento

- Eseguito monitoraggio falda 2020;
- Presentate istanze presso Enti locali per autorizzazione attività (novembre 2020). Presentati solleciti con opportuno supporto legale. Ricevute autorizzazioni dagli enti competenti, ultima pervenuta in data 24/06/2021.
- Ripresa lavori programmata per il 06.09.2021, sospesa dal CSE in data 03.09.2021 per assenza di sufficienti condizioni di sicurezza dei luoghi e conseguente necessità di ulteriori approfondimenti in merito.
- Condivisione con Procura di Taranto delle questioni emerse in merito alla sicurezza.
- Eseguite indagini indirette prescritte dal CSE, attualmente in corso di elaborazione, che hanno evidenziato la stabilità del rilevato e la necessità di attivare un sistema di monitoraggio del rilevato (RDA 25/22).
- Eseguite indagini del piano «Onofrio», il report di fine lavori e delle analisi è stato depositato in Procura e trasmesso a MiTE, ARPA ed ISPRA.
- ARPA Puglia ha chiesto di effettuare un'indagine di mercato per verificare le migliori tecniche disponibili per accedere con le attrezzature di perforazione all'interno delle vasche, in zone attualmente non accessibili
- ILVA in AS ha deciso di integrare le attività di indagine ambientale con indagini di tipo geotecnico ai fini della progettazione delle opere di messa in sicurezza del rilevato. Il cronoprogramma esteso è stato trasmesso agli EE.PP..

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (V/XIV)

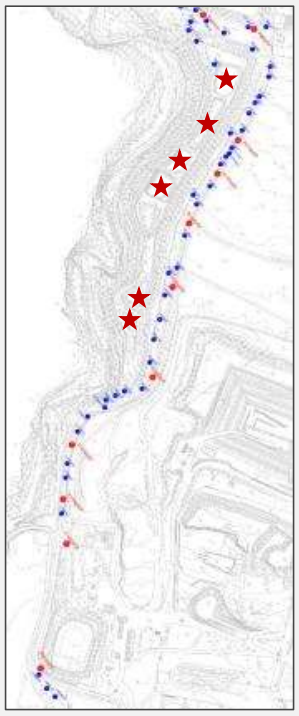

- Punti di indagine della caratterizzazione SIN (● sondaggi; ● piezometri)
- Indagini integrative ambientali chieste da ARPA in zone attualmente non accessibili ★

Indagini ambientali – Zone attualmente inaccessibili

Modalità d'azione

Ricerca fornitori ed individuazione delle modalità tecniche per gli accessi (completata):

- Emessa RDA 779/2020 (marzo 2020) per individuazione da parte delle potenziali ditte esecutrici delle modalità e/o opere necessarie a consentire l'accesso ed il posizionamento delle sonde all'interno delle vasche
- Dicembre 2020 – Estensione delle attività con introduzione di indagini geotecniche
- Valutate le proposte tecniche, individuati n. 3 potenziali fornitori: accessi con gru o elicottero.
- Emessa nuova RDA n. 105/22 in sostituzione della RDA 779/20
- Individuato il fornitore per i sondaggi ambientali, il quale ha proposto l'utilizzo di elicotteri come modalità di accesso alle vasche. In tal senso, considerando la difficoltà logistica e gli oneri dovuti per la fase esecutiva, è stato proposto ad ARPA Puglia un cronoprogramma dei lavori, per la condivisione del periodo di attività con l'Agenzia, al fine definire il periodo nell'Ordine con la ditta Appaltatrice.
- Assegnato incarico per DL/CSO/CSE/RL per le attività in programma
- La ditta AECOM ha redatto il cronoprogramma definitivo con avvio lavori stimato per Maggio 2023 (stima suscettibile di variazioni dovute alle tempistiche, non dipendenti da ILVA, per l'ottenimento delle autorizzazioni relative ai vincoli d'area). L'Avvocato Loreto ha preparato una nota di presentazione di cronoprogramma di AECOM che prevede l'avvio delle attività in assenza di autorizzazioni ai vincoli d'area, che è stata depositata in Procura in data 6 ottobre 2022.
- In data 7 novembre 2022 è stata trasmesso il cronoprogramma aggiornato da parte di AECOM deprivato degli oneri della vincolistica, a seguito dell'autorizzazione del PM ad eseguire le indagini richieste in assenza dell'ottenimento delle autorizzazioni degli EE.PP. Il cronoprogramma esteso è stato trasmesso agli enti in data 8 novembre, con nota a firma dei Commissari.

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (VI/XIV)



EROSIONE AL PIEDE DEL RILEVATO

Ipotesi preliminari di intervento: gabbioni tipo Maccaferri

Misure anti erosione

Effettuata analisi di stabilità del rilevato (2016 - Techgea) – Esiti:

- Corpo del rilevato stabile
- Erosione al piede
- Erosione ai fianchi con limitata rivegetazione

Previsti approfondimenti geotecnici tramite indagini dirette per confermare e/o integrare le opere da eseguire (slide precedente)

Progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza.

Assegnazione a valle degli esiti delle indagini geotecniche.

Area soggetta a plurimi vincoli: da acquisire le relative autorizzazioni.

EROSIONE SUI VERSANTI

Ipotesi preliminari di intervento: geostuoie con idrosemina di specie selezionate per climi aridi



Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (VII/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

RDA 1761/20 - Indagini di caratterizzazione

- Data emissione: 27/08/2020
- Piano di Caratterizzazione trasmesso in data 12/04/2021.
- Note: Inviate integrazioni ed osservazioni richieste da MITE il 10/09/21 su osservazioni di ARPA. Richiesta da MITE documentazione, non acquisita precedentemente, in formato DVD, successivamente trasmessa. Inviato sollecito a Regione Puglia per indire una Conferenza dei Servizi, nell'ambito del procedimento di approvazione del PdC, relativo alle aree non rientranti nella perimetrazione SIN. In riscontro a tale richiesta, la Provincia condivide l'iter procedurale.
- Indetta CdS decisoria dal MiTE in merito al PdC in data 15/07/2022
- In data 7/07/22 è stata inviata all'autorità competente una revisione del piano di caratterizzazione ai fini della relativa approvazione nell'ambito della suddetta CdS.
- Ricevuto in data 14/07/22 il pre-decreto autorizzativo con prescrizione. Trasmesse osservazioni al parere del MITE in data 23/07/22. Il MITE ha concesso a tutti gli enti preposti tempo fino al 5/09/22 per esprimere i propri pareri, di competenza, ai fini dell'approvazione del PDC. Inviate, in data 23 luglio 2022, le controdeduzioni al pre-decreto che riporta alcune prescrizioni improntate al parere ARPA. Parere ARPA ricevuto in data 5 settembre 2022. Approvazione del PdC con D.M.225 del 06/10/2022, notificato in data 10/10/2022. Richiesto al progettista di elaborare computo metrico e capitolato tecnico da allegare alle specifiche tecniche per l'esecuzione delle indagini. Il progettista le ha inviate ad ATO il 25 ottobre 2022, chieste revisioni in data 4 novembre 2022, integrate dal professionista. Preparata specifica tecnica ed emessa RDA 207/23 per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione della Gravina Leucaspide.

RDA 778/20 - Ordine 597/20 Ecotrend Piano «Onofrio» (Zone accessibili o parzialmente accessibili) (I/II)

- Data emissione: 14/04/2020
- Esecuzione delle Indagini ambientali in zone ad accessibilità limitata (cd. "Piano Onofrio") consistente in n. 9 sondaggi ambientali, di cui n. 4 all'interno delle «Vecchie Vasche».
- Iter autorizzativo per l'esecuzione delle attività (produzione istanze a EE.PP., integrazioni varie, solleciti ecc.) è stato avviato a settembre 2020 ed è terminato a giugno 2021 con l'ottenimento dell'ultima autorizzazione.
- Fase preparatoria di decespugliamento e di predisposizione delle aree di lavoro eseguita nel periodo compreso tra luglio ed agosto 2021.
- A seguito di valutazioni supplementari sulla sicurezza dei luoghi di lavoro il CSE ha sospeso l'avvio delle attività (previsto per il 06/09/2021) e disposto indagini supplettive, eseguite a novembre 2021, i cui esiti hanno confermato la fattibilità delle lavorazioni in sicurezza, tuttavia attenzionando una situazione da monitorare nella parte sommitale agli argini del corpo del rilevato.

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (VIII/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

RDA 778/20 - Ordine 597/20 Ecotrend Piano «Onofrio» (Zone accessibili o parzialmente accessibili) (II/II)

- I sondaggi sono stati eseguiti nel periodo compreso tra il 24/01/2022 ed il 21/02/2022
- Inviata documentazione mezzo corriere in data 24/05/2022 al MITE e consegnata al GIP in data 25/05/2022 da parte dell'Avv. Loreto.
- Nel complesso, nel corso di tutta l'attività, sono stati carotati circa 237 m del corpo rilevato, dai quali sono stati prelevati n. 51 campioni di matrice terreno, di cui n. 41 anche per il Test di Cessione, in conformità con l'attuale normativa. Sono, inoltre, stati prelevati n. 3 campioni di "Materiale Inatteso", il cui Set Analitico è stato richiesto e definito con i tecnici di ARPA Puglia
- Gli esiti analitici dei campioni di materiale di riporto, confrontati con le "Concentrazioni Soglia di Contaminazione" (CSC) previste per i siti a destinazione d'uso commerciale e industriale (Tabella 1B, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006) hanno evidenziato la non conformità per:
- Idrocarburi C>12 in n. 3 campioni ed IPA in n. 2 campioni, prelevati in corrispondenza del sondaggio S7;
- Idrocarburi C>12 in n. 2 campioni prelevati in corrispondenza del sondaggio obliquo S1';
- Vanadio in n. 3 campioni prelevati nel sondaggio S2', in n. 4 campioni prelevati nel sondaggio S5, in n. 1 campione prelevato nei sondaggi S8 e S9;
- IPA in n.1 campione prelevato in corrispondenza del sondaggio S2'.
- Tutti i campioni prelevati in corrispondenza del terreno naturale di substrato, ossia il suolo naturale su cui poggia il rilevato, hanno evidenziato la conformità alle CSC di riferimento normativo.
- Relativamente ai campioni sottoposti al Test di Cessione, gli esiti analitici, confrontati con le CSC previste per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006) hanno riscontrato alcuni superamenti per metalli e altri parametri inorganici.

RDA 692/22 - Analisi contradditorio ARPA

- Data emissione: 19/04/2022; assegnato ordine 115/22 in data 2/05/2022
- Note: Emessa richiesta di pagamento in favore di Arpa Puglia, relativamente ai campionamenti effettuati in contradditorio durante le indagini ambientali previste dal piano «Onofrio».

RDA 596/22 - Integrazione ordine 597/20 Ecotrend Piano «Onofrio» per attività aggiuntive

- Data emissione: 05/04/2022
- Nel corso dell'esecuzione delle attività ambientali è emersa la necessità di eseguire attività integrative quali: indagini Georadar per escludere l'interferenza di tubazioni afferenti alla condotta «Sinni» e analisi integrative, richieste da ARPA Puglia, relativamente a materiale definito «inatteso» rinvenuto in fase di perforazione ed integrazioni del computo metrico per quantitativi aggiuntivi ai valori stimati.

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (IX/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Indagini ambientali, in zone con moderate difficoltà di accesso, previste nel piano redatto dall'Ing. Maurizio Onofrio e relative integrazioni ARPA PUGLIA



Cantierizzazione



Discesa trivella elettrica



Posa trivella sondaggio inclinato

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (X/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Indagini ambientali, in zone con moderate difficoltà di accesso, previste nel piano redatto dall'Ing. Maurizio Onofrio e relative integrazioni ARPA PUGLIA



Discesa rocciatori



Indagini geoelettriche



Strumentazione per indagini

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (XI/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

RDA 25/22 - Sistema monitoraggio stabilità del rilevato

Per l'esecuzione delle indagini ambientali del «Piano Onofrio», al fine di verificare la sicurezza dei luoghi di lavoro per l'aggiornamento del PSC, sono state eseguite delle indagini indirette condotte sul corpo del rilevato; dagli esiti delle indagini si è appreso che la struttura dell'intero rilevato risulta essere fortemente disomogenea, sia per la natura dei materiali che lo compongono sia per grado di addensamento e compattazione dei materiali stessi. Infatti, gli esiti dello studio hanno evidenziato che le scarpate risulterebbero piuttosto stabili mentre la parte sommitale, per uno spessore medio di circa cinque metri e giacitura concordante con il versante, sarebbe costituita da una coltre sabbioso-ghiaioso, per lo più degradata e mobilizzata, su cui si rinvengono fessure beanti e crepe sul ciglio. Tali evidenze hanno suggerito l'installazione del sistema di monitoraggio.

- Emesso ordine n. 79/22 il 11/03/2022.
- Note: Ricevute offerte economiche da 5 società. E' stato nominato il DL/CSE (vedi RDA 656/22 – ordine 138/22 del 25/05/22). In data 05/07/22 l'attività è stata avviata ed è terminata in data 08/07/22, in conformità al cronoprogramma trasmesso alla PG. L'impianto è stato montato ed è stato effettuato il rilievo topografico in data 03/08/2022. Ricevuti i report del monitoraggio di luglio ed agosto 2022. Registrati alcuni messaggi di allerta per i quali è stata necessaria valutazione tecnica da parte del fornitore al fine di verificare se dovuti ad eventuali errori strumentali oppure legati alla modalità d'installazione: nel primo e nel secondo report ricevuti viene specificato che non sussistono condizioni di criticità, si conferma la stabilità del rilevato. A seguito della ricezione di allarmi anomali la ditta ha effettuato un intervento, in data 7 ottobre 2022, risolvendo la problematica. In data 21 dicembre 2022 abbiamo ricevuto il report mensile riferito al periodo 22 novembre-21 dicembre, dal quale non si evincono criticità.

Messa in sicurezza del rilevato (I/II)

ILVA in AS aveva commissionato un'analisi di stabilità del rilevato alla società Techgea s.r.l. La relazione tecnica stilata nel 2016 riportava le seguenti valutazioni:

- Stabilità del corpo del rilevato
- Erosione al piede
- Erosione ai fianchi con limitata ri-vegetazione

ILVA in AS ha pertanto deciso di mandare in affidamento la progettazione definitiva delle opere di messa in sicurezza del rilevato, come individuate nell'ambito dello studio effettuato da Techgea. A seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente con le ditte invitate alla gara, è emersa la necessità di disporre di adeguati dati geotecnici del corpo del rilevato, ai fini di poter effettuare verifiche più analitiche circa la stabilità complessiva e l'estensione e modalità di applicazione degli interventi di messa in sicurezza. Tali indagini riguarderebbero anche zone non direttamente accessibili.

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (XII/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

Messa in sicurezza del rilevato (II/II)

Essendo già in corso una gara per la ricerca di soluzioni per poter effettuare le indagini ambientali in zone attualmente non accessibili, ILVA in AS ha ritenuto opportuno integrare in questo ambito anche le indagini geotecniche, emettendo una specifica tecnica integrativa. L'incarico di progettazione sarà affidato a seguito dei risultati delle indagini geotecniche perviste dall'RDA 105/22.

RDA 105/22 - Sondaggi ambientali Leucaspide

- Note: Valutate offerte tecniche ricevute da 3 società ed individuato il fornitore. Ufficio Acquisti in fase di contrattazione sulle riserve presentate. La ditta individuata ha proposto l'utilizzo di elicotteri come modalità di accesso alle vasche. In tal senso, considerando la difficoltà logistica e gli oneri dovuti per la fase esecutiva, è stato proposto ad ARPA Puglia un cronoprogramma dei lavori, per la condivisione del periodo di attività, al fine definire il periodo nell'ordine con la ditta Appaltatrice. Prima della sottoscrizione dell'ordine, infatti, è stata richiesta la conferma del cronoprogramma dei lavori e la data di avvio, considerata la necessità di acquisire autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti preposti. L'ufficio acquisti ha ricevuto le proposte economiche rispetto alla RDA 843/22. L'8/07 si è svolta riunione ad hoc, preliminare all'affidamento delle attività, che ha coinvolto la ditta, CSP/DL, RSPP prescelti. In data 30/08/2022 si è svolta una riunione tra ATO e ACQ, con cui è stato deciso sia di assegnare l'ordine alla ditta AECOM, sia di richiedere al fornitore il relativo cronoprogramma definitivo da trasferire, tramite l'Avv. Loreto, alla Procura della Repubblica. L'ordine con AECOM è stato sottoscritto in data 31/08/22. La ditta AECOM ha redatto il cronoprogramma definitivo con avvio lavori stimato per Maggio 2023 (stima suscettibile di variazioni dovute alle tempistiche, non dipendenti da ILVA, per l'ottenimento delle autorizzazioni relative ai vincoli d'area). L'Avvocato Loreto ha preparato una nota di presentazione di cronoprogramma di AECOM che prevede l'avvio delle attività in assenza di autorizzazioni ai vincoli d'area, che è stata depositata in Procura in data 6 ottobre. Si è proceduto seguendo l'iter relativo al cronoprogramma già presentato. In data 7 novembre 2022 è stata trasmesso il cronoprogramma aggiornato da parte di AECOM deprivato degli oneri della vincolistica, a seguito dell'autorizzazione del PM ad eseguire le indagini richieste in assenza dell'ottenimento delle autorizzazioni degli EE.PP. Il cronoprogramma esteso è stato trasmesso agli enti in data 8 novembre 2022, con nota a firma dei Commissari. Effettuato un sopralluogo da parte di AECOM, subappaltatori e direzione lavori in data 3 novembre. Le attività geofisiche sono iniziate il 5 dicembre e completate il 7 dicembre 2022. In data 13 dicembre 2022 è iniziata l'attività di sondaggio. Sono stati realizzati 10 sondaggi geotecnici dei 13 previsti: SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG7, SG8, SG9, SG11, SG12 e attualmente SG10 è in corso di esecuzione. E' stato realizzato 1 sondaggio

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (XIII/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività eseguite o in corso

- ambientale (SG6), dei 2 previsti in corrispondenza degli argini delle vasche, nel quale è stato eseguito il campionamento in contraddittorio con ARPA il 31 gennaio 2023. E' stato realizzato 1 sondaggio ambientale dei 7 previsti all'interno delle vasche: SA1 (vasca 1) ed è in fase di esecuzione il sondaggio SA2 in vasca 2. Effettuato in contradditorio con ARPA il sondaggio SA2. Emesso ordine di servizio per esecuzione sondaggi gemelli.

RDA 582/22 - Monitoraggio acque di falda

- Viene eseguito congiuntamente alla discarica Nord-Ovest. Fino al 2019 il monitoraggio è stato effettuato adottando il set analitico definito nell'ambito del PMC. Dal monitoraggio 2020, è stato adottato il set di monitoraggio prescritto da ARPA Puglia nell'ambito delle osservazioni al "Piano Onofrio". Nel 2020 il monitoraggio è stato effettuato nell'ambito dell'ordine affidato per l'esecuzione delle indagini del cd. "Piano Onofrio". Una sintesi dei risultati, comprensiva degli anni pregressi, è stata trasmessa agli Enti competenti ed alla Procura di Taranto a giugno 2021. Per una migliore comparabilità dei dati, il monitoraggio viene effettuato circa nello stesso periodo dell'anno, ossia nell'ultimo trimestre. Il monitoraggio per l'anno 2022 (RdA 582/22) è stato pianificato per fine agosto/inizio settembre, su richiesta di ARPA Puglia.
- Note: Trasmessa in data 10 agosto 2022 la nota con gli esiti analitici della falda relativi all'anno 2021. Attività di monitoraggio eseguita in data 20-21-22 settembre 2022 in contraddittorio con i tecnici di ARPA Puglia. Ricevuti i rapporti di prova in data 7 ottobre. Eseguito ulteriore campionamento per verifica non conformità su un campione prelevato nel mese di novembre 2022. A seguito di conferma del superamento per il parametro Nichel è stato pianificato per gennaio un nuovo campionamento. Gli esiti analitici del nuovo campionamento hanno confermato la non conformità alle CSC per il parametro Nichel, sebbene la concentrazione si sia notevolmente attenuata rispetto alla concentrazione iniziale. Pertanto, si procederà monitorando, con maggior frequenza, il piezometro interessato dall'anomalia.

Aggiornamento al 22.03.2023

Colline Leucaspide & Vecchie vasche (XIV/XIV)



Fondi Allocati	226,60 M€
Estensione	46,5 ha
SIN Taranto	Parzialmente

Tutte le attività devono essere coordinate con la Procura della Repubblica di Taranto, MiTE, ARPA e ISPRA

Area sottoposta a Sequestro Penale nel 2018
(Sequestro Leucaspide)

Attività in agenda

RDA 207/23 - Indagini di caratterizzazione
- Data emissione: 31/01/2023
- Note: Emessa ed approvata RDA. In fase di deposito istanza in tribunale per accesso all'area sequestrata. All'ottenimento dell'autorizzazione si procederà ad organizzare i sopralluoghi con le ditte.

RDA 211/23 - Incarico DL RL CSP CSE indagini di caratterizzazione
- Data emissione: 31/01/2023
- Note: Emessa ed approvata RDA. In fase di deposito istanza in tribunale per accesso all'area sequestrata. All'ottenimento dell'autorizzazione si procederà ad organizzare i sopralluoghi con le ditte.

RDA 387/23 - Campionamento acqua di falda campione extra
- Data emissione: 02/03/2023
- Note: Emessa RDA, in fase di approvazione.

Altre attività

Richiesta di documentazione storica
- Preparata e consegnata documentazione relativa alle cartografie in risposta a quanto richiesto dalla GDF con verbale del 10/06/2022 alla lettera A. Sono presenti anche precisazioni in merito a quanto richiesto nel corso del meeting avvenuto in data 22/06/2022 presso la sede della stessa GDF.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area ad ovest SP Statte ID07 (I/III)



Fondi Allocati	4,88 M€
Estensione	6,9 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive. Sottoposta a caratterizzazione nel 2006. Aggiornamento della caratterizzazione ai fini dello svincolo

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività eseguite o in corso

RDA 2353/21 - Analisi di rischio

- Data emissione: attività assegnata a società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19/01/2022
- Note: Da PUG l'area ricade per la parte ovest in colonna A e per la parte est in colonna B. Engea ha predisposto l'ADR con tale scenario, utilizzando come layout il format indicato nelle linee guide ISPRA. È stata ricevuta la prima bozza da parte di Engea il 14/06/2022 e la versione definitiva in data 08/08/2022. In seguito al parere del MITE, in data 17/08/2022 sono stati inviati RDP e file excel per la validazione di ARPA. In data 4 novembre 2022 è stato ricevuto il certificato di validazione analitica da parte di ARPA Puglia; l'Agenzia ha considerato tutta l'area confrontabile a tabella 1 colonna A del DLGS 152/2006. In corso le valutazioni da parte di ATO per il riscontro ad ARPA. In data 6 dicembre 2022 è stata inviata una nota di riscontro ad ARPA in cui viene confermato che il comune di Statte non ha espresso parere sulla destinazione d'uso ed è stato chiesto di restituire un certificato di validazione anche per la colonna B, che è stato riscontrato da ARPA in data 14 dicembre 2022. L'ADR è stata trasmessa a tutti gli enti in data 1° marzo 2023

Attività in agenda

RDA 2105/20 e 1198/22 – Recinzione perimetrale e noleggio a caldo mini escavatore (I/II)

- Data emissione: 14/10/2020; Assegnato ordine 672 a professionista esterno
- Note: la Provincia, a seguito di stipula di polizza fideiussoria per attività di recinzione dell'area da effettuarsi con dipendenti ILVA in AS, ha autorizzato l'inizio delle attività. Inizialmente, ordine assegnato alla ditta Sinnica che è stata sollecitata a fornire il POS al DL nei giorni 06/06/2022, 15/06/2022 e 24/06/2022. In data 1/07/2022 la ditta Sinnica ha avanzato la necessità di rinegoziare il contratto in precedenza sottoscritto, in quanto ormai scaduto, anche alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime registrato nell'ultimo periodo. È stata emessa una nuova RDA integrativa che tiene conto degli attuali prezzi di mercato ed è stato assegnato l'ordine alla ditta BEN ECO. L'inizio delle attività è previsto a valle della verifica di possibili interferenze con l'area espropriata da SNAM. In data 29/09/2022 è stato incaricato il geom. Zito al fine di indire un sopralluogo definitivo con Snam con l'obiettivo di stabilire le aree interessate con conseguente picchettamento delle stesse.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area ad ovest SP Statte ID07 (II/III)



Fondi Allocati	4,88 M€
Estensione	6,9 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Attività in agenda

RDA 2105/20 e 1198/22 - Recinzione perimetrale e noleggio a caldo mini escavatore (II/II)

- Note: Il DL ha inviato PEC alla SNAM con richiesta incontro per stabilire le modalità ed i tempi relativi alle attività da svolgere. Attività che il Geom. Zito non porterà a termine poichè sarà rimosso dall'incarico. Il Geom. Zito ha consegnato tutti i documenti relativi alle attività svolte, compreso il nulla osta da parte di SNAM. E' stato sostituito il DL/RL/CSE/CSP. E' stata presentata la CILA al comune di Statte con esito positivo. Si devono definire le condizioni operative dividendo le attività da svolgere considerando due fasi di lavoro, una da effettuare con il personale Ilva e l'altra con la società incaricata, senza interferenze. In corso verifica delle prescrizioni SNAM da parte del DL per presenza metanodotto. Una volta definite le condizioni operative ATO redigerà specifica tecnica per modifica/assegnazione ordine alla ditta.
- Data previsione fine attività: 30/10/2022

RDA 1682/22 - Incarico DL RL CSP CSE per lavori di installazione recinzione

- Data emissione: 04/11/2022
- Note: Assegnato ordine in data 15 dicembre 2022. In data 19 dicembre 2022 consegnata al professionista tutta la documentazione e tutte le autorizzazioni, compreso nulla osta della SNAM, al fine di poter prendere atto dello stato di avanzamento dell'attività.

RDA 1914/22 - Attività di rimozione dei rifiuti abbandonati

- Data emissione: 13/12/2022
- Note: Elaborata specifica tecnica, ai fini dell'attività di rimozione dei rifiuti, è risultato necessario coinvolgere nell'attività il confinante della nostra proprietà, poiché i rifiuti presenti nella nostra area sono estesi anche nella particella del confinante. E' stato dato mandato al DL di reperire i dati societari/anagrafici per poter contattare il confinante che risulta essere il Comune di Statte. E' stata predisposta una nota da inviare al comune di Statte per segnalare la presenza dei rifiuti presenti, con richiesta di rimozione degli stessi ad opera del responsabile. Abbiamo ricevuto riscontro da parte del Comune di Statte che ha dichiarato di aver informato il proprietario della particella in questione. In corso di ultimazione specifica tecnica per rimozione rifiuti nell'area di nostra pertinenza.

RDA 290/23 - Richiesta di ripristino o fornitura pozzetto

- Data emissione: 14/02/2023
- Note: Emessa RDA in data 14/02/2023, emesso ordine in data 24/02/2023.

Criticità

- Esproprio porzione di area per metanodotto SNAM

Aggiornamento al 22.03.2023

Area ad ovest SP Statte ID07 (III/III)



Fondi Allocati	4,88 M€
Estensione	6,9 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Indagini di caratterizzazione per suolo, sottosuolo e falda



Piezometro



Sondaggio



Sondaggio

Aggiornamento al 22.03.2023

Area a Verde NORD ID08 (I/II)



Fondi Allocati	18,40 M€
Estensione	26,7 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive. Sottoposta a caratterizzazione nel 2006 Aggiornamento della caratterizzazione ai fini dello svincolo.

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività eseguite o in corso

RDA 512/21 - Indagini di caratterizzazione integrativa

- Data emissione: 05/03/2021; Ordine 90/21 del 14/04/2021
- Note: Attività di caratterizzazione matrice terreno completata; Realizzati n. 2 nuovi piezometri profondi. Eseguiti i campionamenti della falda in data 20-21-22-23 settembre 2022, in contraddittorio con i tecnici di ARPA. Eseguita attività di cementazione dei piezometri risultati non idonei a seguito di prescrizione di ARPA Puglia. Ricevuti certificati analitici della falda. Aggiornato il file di validazione degli esiti analitici, trasmesso ad ARPA in data 14 ottobre 2022.
- Previsione fine attività: 14/11/2022

RDA 2353/21 - Analisi di rischio

- Data emissione: Attività assegnata a società di consulenza esterna (Engea) con ordine n. 7/22 del 19/01/2022
- Note: Da CDU, l'area ricade in zona con numerosi vincoli ambientali. ARPA Puglia ha definito la colonna A della tabella riferimento inquinanti, pertanto l'analisi di rischio è stata elaborata utilizzando questo scenario. Il campionamento della falda è stato eseguito in data 20-21-22-23 settembre 2022. Ricevuta validazione risultati analitici in data 10/02/2023, elaborata bozza finale di ADR, in fase di valutazione da parte di ATO per trasmissione entro il 24 marzo.

Attività in agenda

RDA 305/23 - Richiesta di ripristino pozzetto

- Data emissione: 14/02/2023
- Note: Emessa RDA in data 14/02/2023, emesso ordine in data 24/02/2023.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area a Verde
NORD ID08 (II/II)



Fondi Allocati	18,40 M€
Estensione	26,7 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Rimozione cumuli rifiuti abbandonati



Cumulo rifiuti



Rimozione rifiuti



Rifiuti rimossi

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land A ID09 (I/II)



Fondi Allocati	2,16 M€
Estensione	3,0 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Area interessata dalla estesa presenza di rifiuti abbandonati; le indagini di caratterizzazione potranno iniziare solo a valle della rimozione degli stessi

Attività eseguite o in corso

RDA 455/22, 80/21, 1840/21 - Rimozione rifiuti
- Data emissione: 14/03/2022; 15/01/2021; 15/09/2021. Ordine 249/21.
- Note: L'attività di rimozione dei rifiuti in cumuli fuori terra è stata completata.

RDA 492/21 - Indagini di caratterizzazione
- Data emissione: 24/02/2021; Ordine 92/21 del 13/04/2021
- Note: Ricevuta in data 07/06/2022, da parte di Engea, la proposta di integrazione al piano di caratterizzazione (che include la gestione dei rifiuti compattati). ATO ha elaborato nota di trasmissione dei Commissari Straordinari agli enti competenti, a corredo del documento integrativo del PdC. La suddetta documentazione è stata inviata in data 07/07/2022. Il MiTE ha comunicato che occorre dare avvio immediato alle indagini di caratterizzazione. In data 26/07/2022 ARPA ha dato riscontro al PIP (piano di indagini preliminari) ed è stata predisposta specifica tecnica per l'esecuzione delle indagini preliminari. Si procederà ad emettere nuova RDA per l'esecuzione del piano di indagini integrativo. Elaborata specifica tecnica; sarà predisposta RDA per attuazione piano integrativo preliminare d'indagine.

RDA 1753/22 – Caratterizzazione del materiale antropico (PIP)
- Data emissione: 17/11/2022
- Note: Emessa RDA, approvata in data 30 novembre 2022. Sopralluoghi effettuati in data 5-6-7 dicembre 2022, ricevute ed allineate offerte tecniche, dato benestare ad ACQ, in data 22 dicembre 2022, per invio offerte economiche. Assegnato ordine in data 19 gennaio 2023. Inviato piano operativo in data 10 febbraio 2023, eseguita riunione di coordinamento in data 15 febbraio 2023, pianificata attività per il 28 febbraio 2023, supervisionata da ARPA Puglia senza prelievo di campioni in contraddittorio, attività operativa conclusa in data 9 marzo 2023, in attesa di esito analitico.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land A ID09 (II/II)



Fondi Allocati	2,16 M€
Estensione	3,0 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Attività in agenda

RDA 2107/20, 1202/22 e 956/21 - Recinzione perimetrale e noleggio a caldo mini escavatore

- Data emissione: 14/10/2020 e 13/07/2022
- Note: la Provincia, a seguito di stipula di polizza fideiussoria per attività di recinzione dell'area da effettuarsi con dipendenti ILVA in AS, ha autorizzato l'inizio delle attività. Inizialmente, ordine assegnato alla ditta Sinnica che è stata sollecitata a fornire il POS al DL nei giorni 06/06/2022, 15/06/2022 e 24/06/2022. In data 1/07/2022 la ditta Sinnica ha avanzato la necessità di rinegoziare il contratto in precedenza sottoscritto, in quanto ormai scaduto, anche alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime registrato nell'ultimo periodo. È stata emessa una nuova RDA integrativa che tiene conto degli attuali prezzi di mercato ed è stato assegnato l'ordine alla ditta BEN ECO. E' stata presentata la SCIA al Comune di Taranto con relativa approvazione.

RDA 1719/22 - Incarico DL RL CSP CSE per lavori di installazione recinzione

- Data emissione: 10/11/2022
- Note: Assegnato ordine, le attività inizieranno dopo aver terminato l'installazione della recinzione presso l'area a verde Statte Ovest

Criticità

- Rinvenimento rifiuti compattati in una porzione di area

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land C ID10 (I/II)



Fondi Allocati	1,29 M€
Estensione	1,8 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive. Sottoposta a caratterizzazione nel 2006. Aggiornamento della caratterizzazione ai fini dello svincolo.

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività eseguite o in corso

RDA 2353/21 - Analisi di rischio

- Data emissione: Attività assegnata a società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19/01/2022
- Note: Da CDU l'area ricade in parte in colonna A e in parte in colonna B per cui la ditta Engea redigerà l'ADR con tale scenario. Ad aprile 2022 l'intera area è stata interessata da un incendio, a seguito del quale sono andate distrutte 8 cassette su 12 dei sondaggi effettuati. La querela è stata presentata all'Autorità giudiziaria il 16/06/2022. In data 06/08/2022 è stata elaborata ADR da parte di Engea, con i dati del laboratorio di parte. In seguito al parere del MITE, in data 17/08/2022 sono stati inviati RDP e file excel per la validazione di ARPA. In data 4 novembre 2022 ricevuto certificato di validazione analitica da ARPA Puglia. Engea ha trasmesso la bozza del documento in data il 18 novembre e la versione definitiva dell'AdR in data 25/11/2022. Si è proceduto alla trasmissione del documento agli enti preposti. Indetta CDS per l'approvazione dell'ADR i cui pareri dovranno pervenire entro il 21 gennaio 2023. Comunicazione MASE del 27/02/23 dei motivi ostativi alla conclusione del procedimento, attesa la necessaria implementazione della rete piezometrica volta alla verifica della qualità della falda. Con nota ILVA del 09/03/23 ILVA ha comunicato che intende presentare il documento di AdR a seguito della campagna di monitoraggio che sarà effettuata nell'ambito del Piano di indagine integrativo per la matrice falda proposto sulla scorta delle prescrizioni formulate dagli Enti. A seguito della validazione di ARPA dei certificati analitici, ILVA presenterà istanza di conclusione del procedimento di bonifica per la matrice terreno secondo il format previsto dal Decreto Direttoriale DG RIA 19 maggio 2021, n. 73 (Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di Siti di Interesse Nazionale).

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land C ID10 (I/II)



Fondi Allocati	1,29 M€
Estensione	1,8 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Attività in agenda

Nessuna attività evidenziata

Criticità

L'intera area è stata interessata da un incendio, a seguito del quale sono andate distrutte 8 cassette su 12 dei sondaggi effettuati.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land C ID10 (II/II)



Fondi Allocati	1,29 M€
Estensione	1,8 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Indagini di caratterizzazione per suolo, sottosuolo e falda



Spurgo piezometro



Deposito temporaneo



Cassetta sondaggio

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land D1 ID11 (I/III)



Fondi Allocati	2,30 M€
Estensione	3,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive. Sottoposta a caratterizzazione nel 2006. Aggiornamento della caratterizzazione ai fini dello svincolo

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività eseguite o in corso

RDA 514/21 - Indagini di caratterizzazione integrativa

- Data emissione: 25/02/2021; Ordine 94/21 del 13/04/2021
- Note: Ricevuto Computo Metrico dal CSE in data 19/10/2021 con stima costi attività integrative. In attesa di variante d'Ordine. Ricevute sezioni storiche del 1° Canale di Scarico ILVA con profondità di posa a circa 10 m da p.c da Direttore ASI, in data 15/10/2021. L'offerta economico di Eco-Trend per le attività integrative risulta eccedente l'RdA. Attività riprese il 18/11/2021 dopo sospensione per rischio interferenze di sottoservizi e strutture interrate non note. Definite posizioni degli ultimi 2 punti di sondaggio. Engea ha trasmesso relazione tecnica sulle modalità di esecuzione del sondaggio S12 e sulla gestione dei rifiuti compattati. La relazione accompagnata da nota esplicativa sullo slittamento delle attività è stata trasmessa agli enti dopo avere ricevuto specifico riscontro dal Consorzio ASI sulla possibile interferenza del collettore del canale di scarico principale dello stabilimento. La suddetta comunicazione è stata trasmessa al MITE, ISPRA ed ARPA in data 06/06/2022. E' stato ricevuto il riscontro da parte di ARPA contenente alcune prescrizioni. In base a quest'ultime verranno pianificati con i fornitori gli interventi richiesti. Le attività integrative da eseguire sono in corso di valutazione da parte di ATO; l'esito dovrà essere traferito ad ACQ al fine di integrare l'ordine in essere. Effettuato sopralluogo con Ecotrend in data 24 novembre, a valle del quale la ditta stessa ha inviato ad ACQ l'offerta economica per il completamento delle attività legate al piano di caratterizzazione. ACQ ha valutato negativamente l'offerta economica. In fase di ultimazione specifica tecnica per emissione RDA per assegnazione ordine ad altra ditta.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land D1 ID11 (II/III)



Fondi Allocati	2,30 M€
Estensione	3,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Attività in agenda

RDA 2353/21 - Analisi rischio

- Data emissione: Attività assegnata a società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19/01/2022
- Note: Al termine delle attività di caratterizzazione e della restituzione degli esiti analitici dei 2 sondaggi in agenda, la società Engea predisporrà l'AdR secondo lo scenario previsto dal certificato di destinazione d'uso. Saranno inviati RDP e file excel per la validazione di ARPA, preliminarmente alla trasmissione della ADR.
- Previsione fine attività: 15/11/2022

RDA 307/23 - Verifica stabilità strada

- Data emissione: 14/02/23
- Note: Emessa RDA in data 14/02/2023, effettuati sopralluoghi con le ditte in data 8 marzo 2023.

Criticità

- RDA 514/21 – Definizione punti di sondaggio in area su cui insiste una struttura interrata (canale di scarico stabilimento siderurgico) con conseguente ritardo nella definizione cronoprogramma; Rinvenimento rifiuti compattati in una porzione di area.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land D1 ID11 (III/III)



Fondi Allocati	2,30 M€
Estensione	3,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Indagini di caratterizzazione per suolo, sottosuolo e falda



Videoispezioni piezometro



Cumulo rifiuti



Rimozione rifiuti

Aggiornamento al 22.03.2023

Land E – Ex area Sidercomit (I/III)



Fondi Allocati	3,65 M€
Estensione	4,3 ha
SIN Taranto	Si

Caratteristiche intervento

Attività produttiva dismessa. Area industriale da avviare a cessione e/o provvisorio utilizzo da parte del personale ILVA in AS impiegato nella gestione delle aree escluse.

Esecuzione di caratterizzazione ambientale (procedimento SIN).

Attività eseguite o in corso

RDA 2392/21 – Indagini di caratterizzazione

- Data emissione: 09/12/2021; Ordine 80/22 del 10/03/20
- Note: Ordine n.80/22 assegnato a società ENGEA CONSULTING S.R.L. in data 10/03/2022. Eseguiti predisposizione verbale di coordinamento per inizio attività, emissione PSC/POS, verifica ottenimento istanze autorizzative necessarie per inizio attività. Emessa RDA 674/22 ed assegnato ordine per smaltimento amianto rinvenuto in una porzione perimetrale dell'area; la relativa attività è stata eseguita. Trasmesso Piano operativo ad Arpa in data 18/05/22. Ricevuta risposta ufficiale da parte di Arpa per inizio attività in data 09/06/22. L'attività è iniziata il 9/06/22, come da cronoprogramma, ed ha previsto lo svolgimento delle indagini in contraddittorio con Arpa che, in data 23/06, ha indicato il 13/07/22 come data per il campionamento della falda. I sondaggi e i piezometri sono stati terminati in data 28/06. Inviata nota di richiesta di proroga di 60 giorni al MiTE, proroga concessa in data 9/08/2022 con nuovo termine fissato al 25/09/2022. Eseguito in data 13/07/2022 e 14/07/2022 il campionamento della falda. Terminata l'attività in campo. Sono stati sollecitati ad Engea i risultati dei campioni di terreno ed il relativo report di fine attività, che sono stati ricevuti in data 25/08/2022. Trasmesso ad ARPA Puglia il file di validazione degli esiti analitici e si è in attesa di riscontro da quest'ultima per la loro validazione. In data 26 settembre 2022 è stata trasmessa al MiTE la nota, a firma dei Commissari di Ilva in AS, nella quale si specifica che non è possibile rispettare la data di scadenza prevista dalla proroga a causa della mancata ricezione da parte di ARPA dei certificati di validazione dei dati analitici della caratterizzazione. Ricevuta proroga di 6 mesi fino a marzo 2023. Ricevuta da parte di ARPA Puglia richiesta di RDP mancante per la validazione. Il riscontro sarà trasmesso entro il 31 marzo 2023.
- Previsione di fine attività: n.d.

RDA 647/22 – Rimozione e smaltimento vecchio serbatoio

- Data emissione: 11/04/2022; Emesso ordine 146/22 in data 13/06/2022
- Note: In data 29/06/2022 il CSE ha comunicato di aver ricevuto tutta la documentazione dalla Serveco. Le attività di rimozione e smaltimento del serbatoio hanno avuto inizio in data 04/07/2022 e sono terminate il 05/07/2022.
- Previsione fine attività: attività completata

Aggiornamento al 22.03.2023

Land E – Ex area Sidercomit (II/III)



Fondi Allocati	3,65 M€
Estensione	4,3 ha
SIN Taranto	Si

Attività eseguite o in corso

RDA 2353/21 – Analisi di rischio

- Note: In data 9 agosto 2022 il MITE ha richiesto che la documentazione recante gli esiti del piano di caratterizzazione e l'analisi di rischio, fossero corredati dai certificati di validazione emessi da ARPA. Sono stati trasmessi i file contenenti i dati analitici e RDP ad ARPA in data 1° settembre 2022 per la validazione degli stessi. In attesa di riscontro da parte dell'Agenzia. ILVA si è impegnata, al ricevimento dei dati di validazione, di trasmettere entro tre settimane il documento di AdR completo al MITE. A tal proposito, al fine di velocizzare il processo di preparazione del documento, si è chiesto alla società Engea l'elaborazione di una bozza. La società ha inviato il risultato preliminare dell'elaborato in data 27 Settembre 2022. In data 21 febbraio 2023 ARPA Puglia ha richiesto RdP mancante per poter completare la validazione dei risultati analitici della caratterizzazione. Il documento è in fase di trasmissione.
- Previsione di fine attività: n.d.

Aggiornamento al 22.03.2023

Land E – Ex area Sidercomit (III/III)



Fondi Allocati	3,65 M€
Estensione	4,3 ha
SIN Taranto	Si

Messa In Sicurezza di Emergenza della viabilità



Area pre intervento



Area post intervento



Area post intervento

Aggiornamento al 22.03.2023

Land I - Area a verde
vicino a Ospedale Nord (I/I)



Fondi Allocati	0,01 M€
Estensione	0,2 ha
SIN Taranto	No

Caratteristiche intervento

Area a verde non utilizzata per usi produttivi, lontana dalla zona industriale.

Ipotesi di cessione dell'area nell'attuale stato di fatto.

Attività eseguite o in corso

- Nessuna attività evidenziata

Attività in agenda

- Nessuna attività evidenziata

Criticità

- Nessuna criticità evidenziata

Aggiornamento al 22.03.2023

Land L – Cava L'Amastuola (I/II)



Fondi Allocati	3,35 M€
Estensione	128,2 ha
SIN Taranto	No
Destinazione	Cava di Calcare attiva

Sito sottoposto a specifica normativa di settore

Caratteristiche intervento

Sarà effettuato un piano di indagini ambientali preliminari ed a valle della definizione della destinazione d'uso e del progetto di recupero finale.

Il sito è interessato dalla presenza di una discarica di 2° categoria degli anni '80

Riconversione: Valutazione strumenti urbanistici e destinazioni d'uso; Valutazione utilizzo per selvicoltura

Attività in agenda

Indagine di caratterizzazione

- Note: Considerata la documentazione pregressa attestante la presenza di una porzione di area che risulterebbe essere stata oggetto di stoccaggio dei rifiuti dal 1985 al 1995, si è provveduto ad assegnare alla ditta Engea l'incarico di redigere il Piano di Caratterizzazione in data 02/09/2022. Bozza del piano di caratterizzazione ricevuta in data 4 ottobre 2022, sono state trasmesse le revisioni al piano di caratterizzazione. Il piano di caratterizzazione è stato trasmesso in data 27 gennaio 2023. In attesa di convocazione CDS.

Aggiornamento al 22.03.2023

Land L – Cava L'Amastuola (II/II)



Fondi Allocati	3,35 M€
Estensione	128,2 ha
SIN Taranto	No
Destinazione	Cava di Calcare attiva

Sito sottoposto a specifica normativa di settore

Attività in agenda

RDA 1644/22 – Sostituzione cancello ed installazione recinzione ciglio di cava
Data emissione: 25/10/2022
Note: Approvata RDA in data 3 novembre 2022, effettuati i sopralluoghi in data 18 novembre 2022. Eseguita riunione con DL in data 10 marzo 2023. Eseguito rilievo per la progettazione della recinzione in data 20 e 21 marzo 2023. Le proposte tecniche delle ditte saranno valutate a seguito del progetto che il professionista incaricato è in procinto di presentare.

RDA 1766/22 – Incarico DL/CSP/CSE/RL Sostituzione cancello e recinzione
- Data emissione: 22/11/2022
- Note: Emessa RDA, effettuati sopralluoghi in data 5 dicembre 2022. Ricevute offerte tecniche, dato benestare per le offerte economiche ad ACQ, in attesa di emissione ordine. Nominato DL/RL/CSE/CSP ing. De Gregorio. Eseguita riunione con DL in data 10 marzo 2023.

RDA 1837/22 – Richiesta incarico direttore di cava anno 2023
- Data emissione: 30/11/2022
- Note: Nominato Direttore di Cava ing. De Gregorio. Eseguita riunione con DL in data 10 marzo 2023. Eseguito rilievo per la verifica del fronte di cava in data 20 e 21 marzo 2023.

Aggiornamento al 22.03.2023

Aree limitrofe a stoccaggio fanghi (I/I)



Fondi Allocati	12,90 M€
Estensione	4,1 ha
SIN Taranto	No

Intervento ex DPCM 29.09.2017 art. 12 comma 4

Caratteristiche intervento

Aree limitrofe all'area di stoccaggio fanghi AFO-ACC, dove attualmente insistono n. 4 vasche di raccolta acque meteoriche ed un'area pavimentata precedentemente attrezzata come deposito temporaneo.

L'area è attualmente utilizzata come base logistica per intervento rimozione fanghi.

Attività eseguite o in corso

- Nessuna attività evidenziata

Attività in agenda


- Nessuna attività evidenziata

Criticità

- Nessuna criticità evidenziata

Aggiornamento al 22.03.2023

Collinette ecologiche Tamburi (I/V)

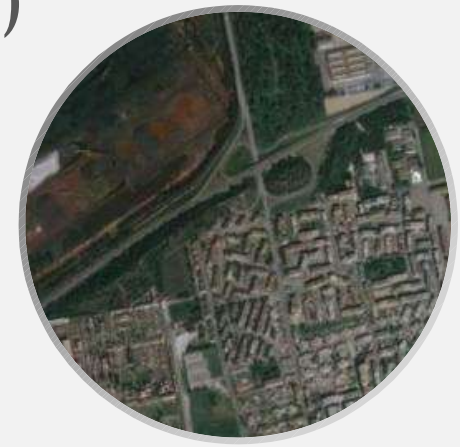

Fondi Allocati	37,50 M€
Estensione	9,6 ha
SIN Taranto	No

Area dissequestrata a fine ottobre 2022

Caratteristiche intervento

Intervento misure di precauzione per evitare spolverio alla collinetta n.3 (agosto 2019)
Indagini ambientali secondo il piano elaborato da ARPA (maggio 2019). Manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde delle tre collinette. Ripristino dell'impianto di irrigazione delle 3 collinette (cfr. Area Pozzo 25)

Attività eseguite o in corso

RDA 1588/21 - Rimozione e potatura alberi


- Data emissione: 23/07/21; Ordine 193/21 del 06/08/2021
- Note: L'agronomo incaricato da Levangarden ha eseguito, in data 27/09/2022, un sopralluogo finalizzato alla stesura di un documento tecnico relativo alla messa in sicurezza della vegetazione delle aree perimetrali delle tre collinette. Il documento tecnico è stato consegnato, da parte dell'agronomo, in data 3 ottobre 2022. Incontro avvenuto in data 5 ottobre 2022 con dirigente sezione ambiente del comune di Taranto, finalizzato a definire le modalità con le quali procedere alla messa in sicurezza delle zone perimetrali delle collinette. In data 11 ottobre 2022 è stata presentata relativa istanza agli enti competenti (Comune di TA e ANAS). L'ANAS ha emesso l'ordinanza di chiusura delle strade interessate e il 3 novembre 2022 sono iniziate le attività che si sono concluse il 14 novembre 2022. Per effetto del forte vento, Levangarden è intervenuta per la rimozione di altri alberi caduti.

RDA 2353/21 - Piano di caratterizzazione

- Data emissione: 01/12/2021. Ordine 7/22 emesso in data 19/01/2022
- Note: Elaborazione del documento in corso. Engea predisporrà una nuova bozza. Engea ha consegnato il documento definitivo in data 21 settembre 2022 in cui sono stati inseriti gli esiti analitici dei campionamenti delle acque di falda eseguite a giugno 2022. In data 10 ottobre ENGEA ha revisionato il PDC integrando i risultati analitici della falda di settembre 2022 ed i relativi commenti. Il piano di caratterizzazione è stato trasmesso agli enti competenti in data 4 novembre, inviati i risultati dei campionamenti di settembre 2022. Indetta dalla Regione Puglia CDS asincrona in data 27 febbraio 2023, in cui viene riportato il termine per la presentazione dei pareri degli EE.PP (7 aprile 2023).

Aggiornamento al 22.03.2023

Collinette ecologiche Tamburi (II/V)

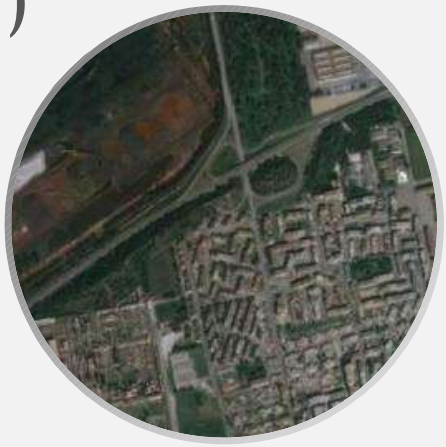

Fondi Allocati	37,50 M€
Estensione	9,6 ha
SIN Taranto	No

Area dissequestrata a fine ottobre 2022

Attività eseguite o in corso

RDA 2448/21 - Ripristino tubo piezometrico collinetta 1
- Data emissione: 15/12/21; Ordine 96/22 del 31/03/2022
- Note: Ottenuta autorizzazione dal G.I.P. il 16/03/2022. Emesso ordine n.96/22.
- Attività eseguita il 22/04/2022

RDA 445/22 - Intervento miglioramento stato vegetativo collinette, sfalcio, concimazione, piantumazione nuovi alberi
- Emesso ordine 137 in data 23/05/22
- Note: Effettuati sopralluoghi in data 28/04/2022. Sulle collinette 2 e 3 le attività sono state eseguite: la fascia antincendio è stata completata; pulizia, potatura degli arbusti ed eradicazione delle erbe infestanti. Sulla collina 1 si è proceduto alla realizzazione della fascia antincendio e contestualmente si è proceduto a mettere in sicurezza gli alberi pericolosi. E' stata predisposta una nuova specifica tecnica per un incarico ad agronomo che ha redatto una nuova relazione finalizzata all'identificazione del miglior assetto vegetativo delle collinette, nel frattempo la società Levangarden ha eseguito le attività iniziali relative all'ordine ricevuto.

RDA 1477/22 - Richiesta consulenza agronomo
- Emesso ordine in data 22/09/22
- Note: L'agronomo incaricato ha effettuato il sopralluogo preliminare in data 30 settembre 2022. ATO, in data 11 ottobre 2022, ha ricevuto preventivo di attività da eseguire. Assegnato ordine in data 17 ottobre 2022. L'agronomo ha effettuato i sopralluoghi finalizzati alla redazione della relazione tecnica, che è stata consegnata bozza, in data 12 dicembre 2022. L'agronomo ha redatto la relazione tecnica che è stata recepita da ATO per le attività successive. In corso di preparazione nuova specifica tecnica.

Aggiornamento al 22.03.2023

Collinette ecologiche Tamburi (III/V)



Fondi Allocati	37,50 M€
Estensione	9,6 ha
SIN Taranto	No

Area dissequestrata a fine ottobre 2022

Attività eseguite o in corso

RDA 1515/21 e 1619/22 - Campionamento ed analisi acqua di falda n.7 piezometri

- Data emissione: 14/07/21; Ordine 190/21 del 03/08/2021
- Note: Ricevuta autorizzazione da parte del PM, ricevuta notifica da parte della PG.
- L'attività di campionamento per Collinetta 1, per motivi di sicurezza, è stata posticipata al termine dell'attività di manutenzione su struttura rete frangivento eseguita da ADI relativa al ripristino del pannello crollato e la verifica dell'intera struttura metallica. Tali lavori di messa in sicurezza sono iniziati in data 21/06/22 e conclusi nel mese di luglio. In particolare, ADI ha comunicato al Custode Giudiziario, alla Procura e al NOE di aver terminato le attività in data 24/07/22. In data 12/08/2022 è stata fatta richiesta formale ad ADI della documentazione di fine lavori, che al momento non è ancora stata ricevuta.
- Le attività di campionamento dei piezometri, per motivi di sicurezza, sono state effettuate nei giorni 21/06/22 e 22/06/22 in contraddittorio con ARPA, unicamente per quanto riguarda le Collinette 2 e 3. Nel corso della sua ispezione, ARPA ha eseguito una valutazione dello stato della vegetazione arborea ed erbacea delle Collinette 2 e 3, nonché una verifica dell'integrità della rete in fibre di cocco realizzata presso la Collinetta 3. Sono stati ricevuti i risultati delle analisi ed, in data 29/08/2022, sono stati trasmessi ad ARPA i rapporti di prova relativi ai campionamenti di giugno.
- È stato richiesto all'Ufficio Acquisti una variante d'ordine per eseguire un nuovo campionamento per tutta la rete piezometrica (Collinette 1, 2 e 3). L'attività è stata pianificata dal 13/09/2022 al 15/09/2022 a seguito della conclusione dei lavori effettuati da ADI sulla rete frangivento, termine attività di ADI comunicato al Custode Giudiziario, Procura e NOE in data 24 luglio 2022. In data 12 agosto 2022 è stata fatta richiesta formale ad ADI di documentazione fine lavori (non ancora ricevuta). Eseguito campionamento nei giorni 13 14 e 15 settembre 2022. ARPA ha assistito alle attività solo in data 15 settembre 2022. Il campionamento in contradditorio del piezometro PZ5 (Collinetta 1) non è stato eseguito a causa di esiguo quantitativo di acqua di falda, pertanto ILVA nel verbale di campionamento ha evidenziato ad ARPA la possibilità di eseguire nuovamente il campionamento tra novembre e dicembre 2022. Ricevuti gli esiti analitici che evidenziano alcune non conformità. La ditta Engea valutati i dati ricevuti, non ritiene sussistano le condizioni per l'attuazione di una MISE, informazione riportata sul piano di caratterizzazione che è stato trasmesso agli enti competenti in data 4 novembre 2022; inviati i risultati dei campionamenti di settembre 2022. Concordati i campionamenti con il fornitore ed ARPA in data 5-6-7 dicembre, ricevuti i risultati che confermano quanto in precedenza acquisito.

Aggiornamento al 22.03.2023

Collinette ecologiche Tamburi (IV/V)



Fondi Allocati	37,50 M€
Estensione	9,6 ha
SIN Taranto	No

Area dissequestrata a fine ottobre 2022

Indagini ambientali e interventi per miglioramento stato vegetativo



Carotatrice per indagini ambientali



Cassetta sondaggio



Rifacimento impianto di irrigazione

Aggiornamento al 22.03.2023

Collinette ecologiche Tamburi (V/V)



LEGENDA:
cc-sondaggi a carotaggio continuo; PZ-piezometri; TS-Top Soil;
Prefisso (s-) = spostato

Caratteristiche intervento

- Aprile 2019 - Indagini del top soil effettuate da ARPA (in attesa risultati completi ARPA)
- Luglio 2019 – Completate indagini del top soil da parte di ILVA (su piano ARPA)
- Agosto 2019 – Completato intervento per attuazione misure di precauzione - Collinetta 3
- Febbraio 2020 - Completata manutenzione straordinaria del verde
- Maggio 2020 – Formalizzata retrocessione «Collinette ecologiche» e «Area pozzo 25»
- Luglio 2020 - Completate indagini ambientali ed esiti trasmessi a Procura ed ARPA
- Aprile 2021 – ARPA chiede integrazioni documentali, trasmesse a giugno 2021
- Giugno 2021 – Deposito Analisi di Rischio sanitario-ambientale presso la Procura di Taranto
- Settembre 2021 Marzo 2022 - Esecuzione manutenzione straordinaria del verde (Eseguita parzialmente non avendo ricevuto autorizzazione da Anas per chiusura carreggiata della SS7)
- Giugno – Settembre 2022 Eseguito campionamento della falda nel mese di Giugno (parziale) e Settembre. Pianificata ulteriore sessione a dicembre 2022 con campionamento in contraddittorio con ARPA Puglia
- Ottobre 2022 - Affidato incarico ad un agronomo per predisporre uno studio approfondito per il miglioramento dello stato vegetativo dell'area.
- Novembre 2022 - Esecuzione manutenzione straordinaria del verde con rimozione e potatura alberi (completata attività a seguito della ricezione dell'autorizzazione di ANAS). Novembre 2022 – Il Tribunale di Taranto ha disposto il dissequestro dell'area

Sintesi risultati indagini 2020:

- Generale conformità di top soil e terreni alle CSC per aree ad uso industriale.
- Diffuse non conformità ai valori di riferimento al test di cessione per i riporti.
- Alcuni superamenti delle CSC in falda, con sostanziale assenza di correlazione ai parametri non conformi al test di cessione.

Sintesi risultati analisi di rischio 2021:

- Assenza di rischio sanitario ed ambientale correlato ai materiali che costituiscono i rilevati;
- Assenza di rischio sanitario sia per i soggetti esposti all'interno delle aree (lavoratori) sia per la popolazione residente all'esterno delle aree stesse (adulti e bambini)

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land D2 ID17 (I/III)



Fondi Allocati	0,10 M€
Estensione	0,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Caratteristiche intervento

Manutenzione area a verde esterna al perimetro dello stabilimento non interessata da attività produttive

Presenza di una chiesetta – Ipotesi di cessione ad Enti culturali o religiosi.

Attività eseguite o in corso

RDA 2353/21 - Analisi di rischio

- Attività assegnata a società di consulenza esterna Engea con ordine n. 7/22 del 19/01/2022.
- Da CDU per vincoli culturali l'area ricade in colonna A per l'analisi di rischio. Consegnata da parte di Engea in data 8/06/2022 per successiva trasmissione da parte dei Commissari agli enti preposti insieme al cronoprogramma di restituzione degli elaborati delle altre AdR, in riscontro alla richiesta del MITE del 30/12/2021. Inviati in data 1/08/2022 ad ARPA gli esiti della caratterizzazione e la ADR. Trasmessa analisi di rischio al MITE il 20/09/2022. Attività completata. Ricevuto parere da parte di ARPA Puglia, che approva il modello concettuale definitivo e prescrive quattro monitoraggi della falda per verificare l'esistenza della stessa. Il MASE in data 7 dicembre 2022 comunica i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento. ILVA in AS in data 16 dicembre 2022 conferma il modello concettuale precedentemente presentato confermando che, a valle della campagna di monitoraggio della falda, provvederà alla trasmissione dell'ADR. Ogni trimestre ILVA in AS effettuerà il campionamento della falda, attività avviata a febbraio 2023.

Attività in agenda

Recupero architettonico chiesetta

- Valutazione in corso sulla possibilità di un restauro della chiesetta presente sull'area. Avvenuto incontro con la Sovrintendenza ai Beni Culturali il 22/04/2022. Consegnata presso gli uffici della Sovrintendenza la documentazione "Strumenti urbanistici Land D2". Avvenuto incontro di sopralluogo con architetto della Sovrintendenza il 11/05/2022.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land D2 ID17 (II/III)



Fondi Allocati	0,10 M€
Estensione	0,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Attività in agenda

RDA 855/22 - Recupero strutturale Chiesetta

- Data emissione: 17/05/2022
- Note: Emessa ed approvata RDA di incarico a professionista per la realizzazione di un progetto architettonico mirato al recupero strutturale. ATO ha preparato e trasmesso la nota tecnica sulla "tipologia dell'intervento da eseguire" all'area Finance per la verifica dell'utilizzo dei fondi del PD. È inoltre stato posto il medesimo quesito al FUG, il quale ha dichiarato di non essere l'organo competente per esprimersi nel merito.

RDA 104/23 - Rilievo fratimetrico ed eventuale campionamento acque

- Data emissione: 19/01/2023
- Note: Ordine assegnato in data 09/02/2023. Attività eseguita in data 28 febbraio 2023.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Land D2 ID17 (III/III)



Fondi Allocati	0,10 M€
Estensione	0,1 ha
SIN Taranto	Si

Aree a Verde

Indagini di caratterizzazione per suolo, sottosuolo e falda



Carotatrice per indagini ambientali



Cassetta sondaggio

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Pozzo 25 (I/IV)



Fondi Allocati	0,39 M€
Estensione	0,5 ha
SIN Taranto	Si

Caratteristiche intervento

Area a verde nella quale è ubicato il Pozzo 25, con il relativo impianto di sollevamento di acqua di falda, destinato ad uso irriguo ed antincendio per le "Collinette ecologiche Tamburi". Area NON sottoposta a sequestro, ma funzionalmente collegata a area sequestrata "Collinette ecologiche Tamburi". Le due aree sono disgiunte e distanti circa 300 m. Attività richieste:

- Ripristino funzionalità Pozzo 25 e connessi impianti di sollevamento ed adduzione, compresa sezione di distribuzione presso le collinette (completato in Giugno 2021)
- Caratterizzazione ambientale (procedimento SIN)

Attività eseguite o in corso (I/II)

RDA 543/22, 1194/22 - Indagini di caratterizzazione e Richiesta incarico DL/CSE/CSP/RL per indagini di caratterizzazione

- Data emissione: 24/03/2022 e 12/07/2022; Ordine assegnato in data 20/06/2022 e 24/08/2022
- Note: In data 13/05/2022 è stata richiesta ad AdI documentazione integrativa. Ricevuto riscontro in data 30/05/2022 con cui AdI ha comunicato di non aver rinvenuto alcun documento. Il 28/07/2022 è stato richiesto al Comune di Taranto il nulla osta sui vincoli paesaggistici. Il 10/08/2022 il Comune si è espresso sui vincoli ed in data 14/09/2022 ha indicato che l'area è inquadrata come destinazione d'uso Industriale e Commerciale. Engea ha aggiornato il piano operativo, trasmesso ad ARPA, il cui cronoprogramma ha fissato l'avvio per il 19/09/2022. E' stata presentata richiesta di proroga per la conclusione delle attività. In data 23 settembre 2022 sono state completate le attività di caratterizzazione della matrice terreno ed effettuato, in data 29 settembre 2022, il campionamento in contraddittorio con ARPA della falda profonda dal Pozzo 25; riscontrata assenza dalla falda superficiale. Contemporaneamente alla trasmissione alla Provincia della nota di cui al punto precedente, trasmesse in data 25 novembre 2022 gli esiti ed RDP dell'attività di caratterizzazione per la validazione da parte di ARPA. A valle della validazione di ARPA, ILVA presenterà istanza di conclusione del procedimento di bonifica per la matrice terreno secondo il format previsto dal Decreto Direttoriale DG RIA 19 maggio 2021, n. 73 (Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di Siti di Interesse Nazionale).

RDA 114/22 - Richiesta di campionamento ed analisi acque

- Data emissione: 19/01/2023
- Note: Emesso ordine in data 09/02/2023, effettuato prelievo in data 14 febbraio 2023, ricevuto rapporto di prova in data 8 marzo 2023.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Pozzo 25 (II/IV)



Fondi Allocati	0,39 M€
Estensione	0,5 ha
SIN Taranto	Si

Attività eseguite o in corso (II/II)

Rinnovo concessione emungimento acque sotterranee Pozzo 25

- Note: Procedura avviata, Pagamento arretrati effettuata. *E*messa specifica tecnica per impianto ad osmosi inversa per produzione di acqua di alta qualità a scopo irriguo. Emessa richiesta di pagamento (RDP) n. 2353/21 riguardo canoni arretrati relativi ad anni 2018-2021 per concessione 396/2017, relativa ad utilizzo acque sotterranee. Emessa RDP n. 2356-2357-2358 per il rinnovo concessione 396/2017, relativa a utilizzo acque sotterranee attraverso Pozzo 25 per gli anni 2022-2026. Versamenti effettuati. Istanza inviata telematicamente il 6/6/2022 al SIT Puglia a alla Provincia di Taranto. Ricevuto rinnovo della concessione da parte della Provincia in data 09/09/2022.

RDA 581/22 - Campionamento acqua di falda

- Data ultima emissione: 29/03/2022
- Nota: Emesso ordine n.103/22. Attività prevista il 12/04/2022, non eseguita causa mancanza elettricità al quadro della pompa del Pozzo 25. L'attività è stata eseguita in data 14/06/2022; in data 1/07/22 sono stati ricevuti gli esiti analitici ed, in data 08/07/22 è stata inviata la comunicazione alla Provincia relativa agli esiti e ai volumi emunti. Eseguito il secondo campionamento in data 13 settembre 2022 ed inviati agli enti competenti i risultati, secondo il set analitico indicato nella concessione di autorizzazione della Provincia di TA.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Pozzo 25 (III/IV)



Fondi Allocati	0,39 M€
Estensione	0,5 ha
SIN Taranto	Si

Attività in agenda

RDA 444/22, 493/22 - Installazione impianto ad osmosi inversa ed Incarico per Progettazione, DL, CSE Impianto osmosi

- Data emissione: 08/03/2022 e 16/07/2022. Emesso ordine 118/22 in data 04/05/2022 e 168/22 in data 02/08/2022
- Note: In corso interlocuzioni con Provincia e Consorzio ASI per autorizzazione scarico acque reflue impianto. L'incontro con Provincia e ASI si è tenuto il 25/07/2022 ed è stato identificato il punto di allaccio in rete ASI dello scarico del refluo dell'impianto di osmosi ad una distanza di circa 150 metri dall'impianto. ASI ha richiesto che ILVA in AS presenti una richiesta di allacciamento alla rete di acque bianche con relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto comprensiva di indicazione del recapito in rete ASI, recapito finale ed indicazione di portata e percentuale di cloruri presenti nel refluo. Il fornitore incaricato da ILVA presenterà la pratica al SUAP ed il consorzio ASI chiederà autorizzazione alla Provincia. Effettuato in data 31 agosto sopralluogo con ditta esecutrice e DL. In data 03/10/2022 è stata pianificata una riunione, presso gli uffici ILVA in AS, con la ditta Levangarden ed il progettista per stabilire i rispettivi stati di avanzamento. Svoltasi riunione con DL in data 3 ottobre. Tenuto conto dei superamenti dei CSC per i solfati, il progettista ha richiesto l'esecuzione delle verifiche dell'abbattimento delle percentuali del relativo inquinante da parte dell'impianto di osmosi. E' stata trasmessa in data 25 novembre 2022 alla Provincia di Taranto la nota sulle performance riguardanti l'impianto di osmosi riguardo l'abbattimento dei solfati del 99,5%, dalla quale si attende relativo riscontro. In tale nota viene precisato che è stato immediatamente interrotto l'emungimento di acqua dal Pozzo 25 per i fini previsti dalla concessione ricevuta. Progetto in fase di ultimazione. Sarà presentata domanda di AUA al SUAP per ottenere autorizzazione allo scarico delle acque reflue nel canale ASI. Per le modifiche sulla concessione ILVA in AS ha provveduto a comunicare, tramite PEC alla Provincia di TA, la variazione delle coordinate dell'ubicazione del pozzo e la variazione dell'intestazione del funzionario di ILVA in AS; per gli accessi on-line alla concessione è necessario modificare l'account collegato. ATO sta provvedendo a registrare nuovo account. La fase tecnico-progettuale è prossima alla conclusione, i professionisti incaricati devono trasmettere il progetto e presentare richiesta di SCIA al Comune di Taranto. I progettisti devono presentare al SUAP autorizzazione unica ambientale allo scarico parziale nel canale ASI. I legali devono affrontare la questione legata al passaggio del canale di scarico in area in gestione ADI. Inoltre, I progettisti devono richiedere parere alla ASL in merito all'installazione dell'impianto di osmosi inversa.

Aggiornamento al 22.03.2023

Area Pozzo 25 (IV/IV)



Fondi Allocati	0,39 M€
Estensione	0,5 ha
SIN Taranto	Si

Ripristino impianto di emungimento dell'acqua utilizzata per irrigazione delle Collinette Ecologiche



Ripristino pompa di emungimento


ILVA in A.S.
